

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

2024|2026



JUSTIÇA FEDERAL
Conselho da Justiça Federal

PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal
Conselho da Justiça Federal

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
PLANO DIRETOR
DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
2024|2026

Brasília-DF, 21 de agosto de 2024

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

Ministra **MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA**
Presidente

Ministro **GERALDO OG NICÉAS MARQUES FERNANDES**
Vice-Presidente e Corregedor-Geral da Justiça Federal

Juiz Federal **DANIEL MARCHIONATTI**
Secretário-Geral

CHARLES FERNANDO ALVES
Secretário de Tecnologia da Informação

COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – CGOVTI

(Portaria CJF N. 537/2020)

Juiz Federal **DANIEL MARCHIONATTI**
Secretário-Geral

Juíza Federal **DANIELA PEREIRA MADEIRA**
Representante da Corregedoria-Geral

LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA CORDEIRO
Diretor Executivo de Administração e de Gestão de Pessoas

GUSTAVO BICALHO FERREIRA DA SILVA
Diretor Executivo de Planejamento e de Orçamento

MEIRIELLE VIANA PIRES
Secretária de Estratégia e Governança

CHARLES FERNANDO ALVES

Secretário de Tecnologia da Informação

MARCO ANTÔNIO MENDES DE MORAES

Subsecretário de Governança de Tecnologia da Informação

COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – CGTI

(Portaria CJF N. 294/2024)

CHARLES FERNANDO ALVES

Secretário de Tecnologia da Informação

MARCO ANTONIO MENDES DE MORAES

Subsecretário de Governança de Tecnologia da Informação

CAIO VINICIUS SANT'ANNA DE CARVALHO

Subsecretário de Engenharia de Software

JEFFERSON COLOMBO BARBOSA XAVIER

Subsecretário de Infraestrutura e Suporte Técnico

RICARDO RODRIGUES LOIOLA

Subsecretário de Segurança de Tecnologia da Informação

FREDERICO AUGUSTO COSTA DE OLIVEIRA

Subsecretário de Planejamento e Gestão de Sistemas Nacionais

PAULO MARTINS INOCÊNCIO

Diretor da Divisão de Relacionamento e da Autoridade Certificadora da Justiça

MATHEUS SOUZA FONSECA

Diretor da Divisão de Tratamento de Dados, Inovação e Inteligência Artificial

GRUPO DE TRABALHO RESPONSÁVEL PARA ELABORAÇÃO DO PDTI 2024-2026

Charles Fernando Alves
Diego Kovags Moreira
Jair Dias de Oliveira Junior
Márcia Coutinho Martins
Alice Álvares de Oliveira

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	11
1 METODOLOGIA	13
1.1 INTRODUÇÃO	13
1.2 PREPARAÇÃO	15
1.3 DIAGNÓSTICO	15
1.3.1 ATIVIDADE: ANÁLISE DO AMBIENTE	15
1.3.2 ATIVIDADE: AVALIAÇÃO DO PDTI 2021-2023	15
1.3.3 ATIVIDADE: LEVANTAMENTO DA ESTRUTURA E RECURSOS DE TI	16
1.3.4 ATIVIDADE: LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE TI	16
1.3.5 ATIVIDADE: PRIORIZAÇÃO DE NECESSIDADES DE TI	16
1.4 PLANEJAMENTO	17
1.4.1 ATIVIDADE: PRIORIZAÇÃO DE NECESSIDADES DE TI	17
1.4.2 ATIVIDADE: GESTÃO DE RISCOS DO PDTI	18
1.4.3 ATIVIDADE: CONSOLIDAÇÃO DE MINUTA DO PDTI	19
1.4.4 ATIVIDADE: APROVAÇÃO DA MINUTA DO PDTI	19
1.4.5 ATIVIDADE: PUBLICAÇÃO DA MINUTA DO PDTI	19
2 PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2024-2026	20
3 ANÁLISE DO PDTI 2021-2023	21
3.1 DEMANDA POR CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES – 2021-2023	22
3.2 DEMANDA POR NOVAS CONTRATAÇÕES 2021-2023	23
3.3 DEMANDA POR CONTRATAÇÕES CONTINUADAS 2021-2023	25
3.4 EFETIVAÇÃO DO PLANEJAMENTO 2021 - 2023	29
4 ESTRUTURA E RECURSOS DE TI DO CJF EM 2024	30
4.1 ESTRUTURA INTERNA DE GOVERNANÇA E DE GESTÃO DE TI	30
4.2 O SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL – SIJUS	31
4.3 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	32
4.4 A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CJF	33
4.5 A FORÇA DE TRABALHO DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	34
4.5.1 QUANTITATIVO E DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DE TI	34
4.5.2 ALOCAÇÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA DA FORÇA DE TRABALHO DA STI/CJF	37

5	ANÁLISE DE AMBIENTE (FORÇAS, FRAQUEZAS, OPORTUNIDADES E AMEAÇAS)	39
6	DIRECIONADORES	44
6.1	PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL – PETI-JF 2021-2026	44
6.1.1	MISSÃO	44
6.1.2	VISÃO	44
6.1.3	ATRIBUTOS DE VALOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A JUSTIÇA FEDERAL	44
6.1.4	OBJETIVOS, INDICADORES ESTRATÉGICOS E METAS DO PETI-JF 2021-2026	45
6.2	PLANO ESTRATÉGICO DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL – PE/CJF – 2021-2026	46
6.2.1	MACRODESAFIO: FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA NACIONAL DE TIC E DE PROTEÇÃO DE DADOS	46
6.2.2	MACRODESAFIO: APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA	49
7	INVENTÁRIO DE NECESSIDADES PRIORIZADAS – 2024-2026	50
8	PLANOS	51
8.1	PLANO DE INICIATIVAS	51
8.2	PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE TI – 2024-2026	51
8.3	PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2024-2026	51
8.4	DEMANDA DE PESSOAL DA STI/CJF PARA 2024-2026	52
9	ACOMPANHAMENTO DO PDTI	53
9.1	INDICADORES E METAS PARA MONITORAMENTO DO PDTI	53
10	FATORES CRÍTICOS	55
11	GESTÃO DE RISCOS	56
11.1	RELAÇÃO DE RISCOS DO PDTI	57
11.1.1	RISCOS ORGANIZACIONAIS	58
11.1.2	RISCOS GERENCIAIS	59
11.1.3	RISCOS TÉCNICOS	61
12	CONCLUSÃO	72
13	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	73
14	HISTÓRICO DE VERSÕES DO PDTI	75

ANEXOS	76
ANEXO 1 REVISÃO PDTI 2021-2023 - CAPACITAÇÃO	76
ANEXO 2 REVISÃO PDTI 2021-2023 - CONTRATAÇÕES EFETIVADAS	79
ANEXO 3 QUADRO-RESUMO DA Evolução DAS METAS MONITORADAS PELA STI DESDE 2021	89
ANEXO 4 INVENTÁRIO DE NECESSIDADES PRIORIZADAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CJF 2024-2026	90
ANEXO 5 PLANO DE INICIATIVAS - PDTI 2024-2026	103
ANEXO 6 PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TI (NOVAS E CONTINUADAS) - PDTI 2024-2026	112
ANEXO 7 PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PDTI 2024-2026	118
ANEXO 8 DEMANDA DE PESSOAL STI/CJF - PDTI 2024-2026	121
ANEXO 9 NECESSIDADES NÃO EFETIVADAS 2021-2023	122

LISTA DE TABELAS

TABELA 1	MATRIZ GUT
TABELA 2	MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DAS NECESSIDADES DO CJF
TABELA 3	ESCALONAMENTO DE VALORES PARA APURAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO
TABELA 4	QUADRO COMPARATIVO ENTRE TREINAMENTOS PREVISTOS E TREINAMENTOS REALIZADOS
TABELA 5	QUADRO COMPARATIVO DE NOVAS CONTRATAÇÕES PREVISTAS E NOVAS CONTRATAÇÕES EFETIVADAS 2021-2023
TABELA 6	QUADRO COMPARATIVO ENTRE CONTRATAÇÕES CONTINUADAS PREVISTAS E CONTRATAÇÕES CONTINUADAS EFETIVADAS 2021-2023
TABELA 7	NOVOS CONTRATOS 2021-2023
TABELA 8	MONTANTE DE RECURSOS APLICADOS EM TI
TABELA 9	ORÇAMENTO DE TI ESTIMADO PARA 2024
TABELA 10	RELAÇÃO ENTRE A FORÇA DE TRABALHO DE TI/CJF, DO CSJT E CNJ
TABELA 11	FORÇA DE TRABALHO DE TI/CJF
TABELA 12	ALOCAÇÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA DE TI DO CJF
TABELA 13	MODELO DE ANÁLISE SWOT
TABELA 14	ANÁLISE DE AMBIENTE (SWOT) DO CJF
TABELA 15	INDICADORES E METAS DO OBJETIVO ESTRATÉGICO “APERFEIÇOAR E ASSEGURAR A EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS DE TI PARA A JUSTIÇA FEDERAL”
TABELA 16	INDICADORES E METAS DO OBJETIVO ESTRATÉGICO “APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TI NA JUSTIÇA FEDERAL”
TABELA 17	INDICADORES E METAS DO OBJETIVO ESTRATÉGICO “ASSEGURAR A ATUAÇÃO SISTÊMICA DA TI NA JUSTIÇA FEDERAL”
TABELA 18	INDICADORES E METAS DO OBJETIVO ESTRATÉGICO “PROMOVER E FORTALECER A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DIGITAL NA JF”
TABELA 19	INDICADORES E METAS DO OBJETIVO ESTRATÉGICO “FORTALECER A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO”
TABELA 20	INDICADORES E METAS DO OBJETIVO ESTRATÉGICO “PROMOVER A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL PARA APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CJF”
TABELA 21	INDICADOR E META DO OBJETIVO ESTRATÉGICO “PROMOVER A MELHORIA DA GOVERNANÇA NO CJF”
TABELA 22	PONTOS DE CONTROLE DO PDTI
TABELA 23	INDICADORES DE MONITORAMENTO DO PDTI
TABELA 24	RISCO PDTI N.1
TABELA 25	RISCO PDTI N. 2
TABELA 26	RISCO PDTI N. 3
TABELA 27	RISCO PDTI N. 4
TABELA 28	RISCO PDTI N. 5
TABELA 29	RISCO PDTI N. 6
TABELA 30	RISCO PDTI N. 7
TABELA 31	RISCO PDTI N. 8
TABELA 32	RISCO PDTI N. 9
TABELA 33	RISCO PDTI N. 10
TABELA 34	RISCO PDTI N. 11

TABELA 35 RISCO PDTI N. 12

TABELA 36 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

TABELA 37 HISTÓRICO DE VERSÕES DO PDTI 2024-2026

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 DIAGRAMA DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PDTI

FIGURA 2 RELAÇÃO ENTRE OS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIO DO PMI E DE ELABORAÇÃO DO PDTI DO CJF

FIGURA 3 SITUAÇÃO DAS NECESSIDADES DO PDTI 2021-2023

FIGURA 4 COMPARATIVO ENTRE AS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO PREVISTAS E AS REALIZADAS DURANTE A VIGÊNCIA DO PDTI 2021-2023

FIGURA 5 COMPARATIVO ENTRE AS NOVAS CONTRATAÇÕES PREVISTAS E AS CONCRETIZADAS DURANTE A VIGÊNCIA DO PDTI 2021-2023

FIGURA 6 COMPARATIVO ENTRE AS CONTRATAÇÕES CONTINUADAS PREVISTAS E AS CONCRETIZADAS DURANTE A VIGÊNCIA DO PDTI 2021-2023

FIGURA 7 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE GESTÃO DE TI DO CJF

FIGURA 8 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE GESTÃO DE TI DO CJF E DA JUSTIÇA FEDERAL

FIGURA 9 ESTRUTURA DO SIJUS

FIGURA 10 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE TI DO CJF

FIGURA 11 COMPARATIVO DE SERVIDORES DO CJF E REQUISITADOS

APRESENTAÇÃO

À Secretaria de Tecnologia da Informação – STI/CJF compete, segundo o Manual de Organização do Conselho da Justiça Federal, Portaria CJF n. 330, de 4 de junho de 2024, a coordenação do Sistema de Tecnologia da Informação da Justiça Federal, o desenvolvimento, a implantação e a manutenção de soluções de Tecnologia da Informação para o Conselho, a coordenação de soluções para a Justiça Federal em todo o território nacional e, também, a orientação normativa e a supervisão técnica.

O aperfeiçoamento contínuo de processos de gestão é fundamental para a consecução das atribuições da STI/CJF. Para tanto, são desenvolvidos, periodicamente, planejamento de Tecnologia da Informação para a estipulação de objetivos da área e das estratégias para alcançá-los.

Assim, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI é um dos principais instrumentos para a definição dessas estratégias, sendo elaborado para a previsão de implantação de ações em alinhamento com o planejamento organizacional e o da Justiça Federal. O PDTI é ainda uma ferramenta para análise da atuação da STI/CJF e da implementação de tecnologia para aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no âmbito do CJF.

Portanto, o PDTI é um mecanismo de diagnóstico sobre o uso e a expectativa de aplicação de soluções de Tecnologia da Informação e o planejamento de sua implantação, colaborando para o aperfeiçoamento do emprego de recursos, ao se realizar a priorização de necessidades, busca-se garantir a eficiência e a efetividade na prestação de serviços ao público do Poder Judiciário federal.

Este documento foi projetado conforme o ciclo de vida, de três anos, do PDTI evidenciado pelo SISP [DR01] que engloba os processos de elaboração, monitoramento e avaliação. Além disso, teve como fonte parcial para elaboração o PDTI/CJF 2021-2023 [DR02], com a avaliação de sua implantação, analisada por meio do monitoramento contínuo da implementação das ações previamente planejadas.

São também fontes para o PDTI/CJF 2024-2026 os normativos dirigentes dos trabalhos de Tecnologia da Informação na Justiça Federal: a Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026 [DR03], a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário-ENTIC-JUD [DR04] e o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI da Justiça Federal para os anos de 2021 a 2026 [DR05].

Contribuíram, também, para a elaboração deste plano os servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação do CJF, os comitês de governança e de gestão da Tecnologia da Informação da Justiça Federal e as diversas unidades do CJF que demandam serviços e equipamentos de Tecnologia da Informação.

São apresentados, neste documento, a abrangência do PDTI 2024-2026, suas referências normativas, a avaliação das ações previstas no plano anterior, o diagnóstico do ambiente atual, os novos riscos identificados, as necessidades, as iniciativas e as ações de Tecnologia da Informação até o ano de 2026.

A análise aqui apresentada tem o objetivo de colocar a Tecnologia da Informação como suporte diferencial maximizador da eficiência para a prestação dos serviços da Justiça Federal em todo o País, por meio da definição de estratégias e ações de implementação e da otimização da gestão de recursos.

Este documento está estruturado como descrito a seguir:

1. Metodologia: em que é descrita a metodologia utilizada para a elaboração deste PDTI. A metodologia envolve o particionamento do trabalho nas fases de preparação, diagnóstico e planejamento.

2. Documentos de referência: apresentação dos documentos e normas utilizados como subsídio para a elaboração deste plano.

3. Análise do PDTI 2021-2023: são apresentados dos resultados das ações desenvolvidas no âmbito do Plano Diretor de TI 2021-2023.

4. Estrutura e recursos de TI/CJF: são descritos a atual estrutura e os recursos de Tecnologia da Informação do CJF aptos à consecução das ações de TI a serem desenvolvidas ao longo do período de abrangência deste plano.

5. Análise de ambiente: detalhamento de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças apontadas como integrantes dos ambientes interno e externos à área de Tecnologia da Informação deste CJF.

6. Direcionadores: apresentação do Plano Estratégico de TI da Justiça Federal e dos indicadores que direcionam este plano diretor e a priorização de suas ações.

7. Inventário de necessidades prioritizadas: exposição do mapeamento de necessidades apontadas pelas unidades do CJF, da área de TI e de negócio, com sua correlata priorização.

8. Planos: programa de ações definido para efetivação durante a execução deste PDTI 2024-2026.

9. Acompanhamento do PDTI: detalhamento das ações de monitoramento, avaliação e revisão do PDTI.

10. Fatores críticos: aspectos fundamentais de influência no atingimento das metas traçadas neste plano diretor.


11. Gestão de riscos: apresentação dos prováveis perigos e ameaças levantados na fase de diagnóstico e ações para eliminar, mitigar, transferir ou aceitar tais riscos.

1 METODOLOGIA

1.1 INTRODUÇÃO

A elaboração PDTI/CJF foi realizada por meio de trabalho conjunto entre a Secretaria de Tecnologia da Informação, que o coordena, a Secretaria de Estratégia e Governança e todas as unidades deste Conselho que apresentem demandas caras à área de Tecnologia da Informação. Nesse processo, foram percorridas as fases de preparação, diagnóstico e planejamento, segundo o diagrama a seguir:

Figura 1 Diagrama de elaboração do PDTI

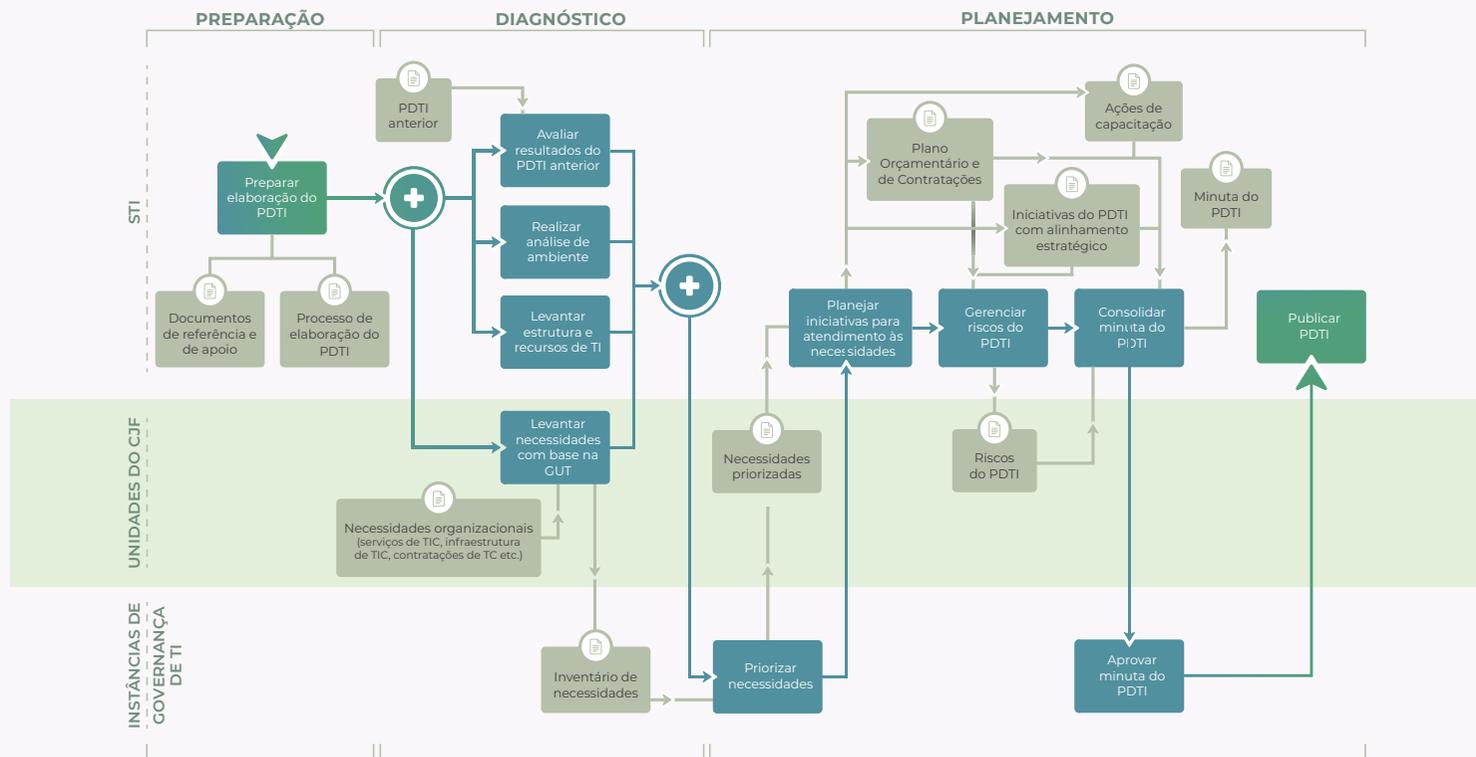


Na fase de preparação, são realizadas atividades de pesquisa de documentação de referência para apoiar a elaboração do plano, além de analisadas normas, planejamentos e estratégias institucionais. Aqui são definidos o prazo de vigência e o âmbito de execução de ações do PDTI.

Para elaboração do diagnóstico, foi analisado o resultado de ações executadas no âmbito do PDTI 2021-2023, foram examinados os ambientes interno e externo, a estrutura interna da STI/CJF, subsecretarias e seções, bem como a estrutura de pessoal nelas alocada. A sondagem de necessidades em Tecnologia da Informação, descrição e priorização. Todas essas ações feitas com o objetivo de verificar a atual situação de atividades que envolvem a Tecnologia da Informação.

Na etapa de planejamento, ocorre o detalhamento de ações para consecução, ao longo da duração do PDTI 2024-2026, de iniciativas prioritizadas, as quais estão descritas em planos incorporados a este PDTI: de capacitação, de riscos, de iniciativas, entre outros.

As fases internas da etapa de diagnóstico aqui desenvolvidas estão alinhadas aos processos de gerenciamento de projetos do **Project Management Institute - PMI**, conforme a seguir:

Figura 2 Relação entre os processos de gerenciamento de portfólio do PMI e de elaboração do PDTI do CJF

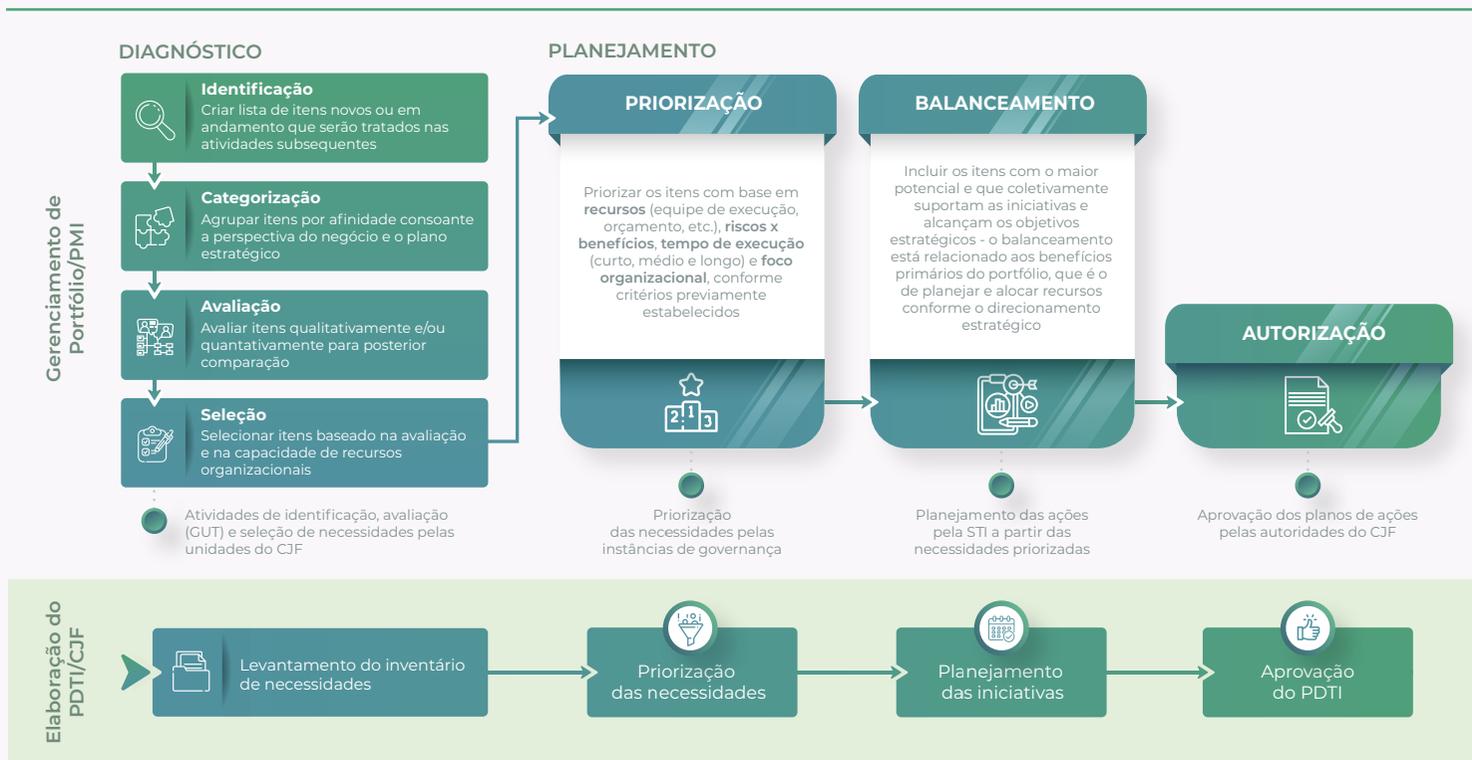

Após a aprovação e a publicação do PDTI, o trabalho de planejamento não está encerrado, é importante que haja revisões periódicas, para que o alinhamento entre as iniciativas e as expectativas das áreas de negócio e da própria área de TI, com o dinamismo inerente a suas atividades, permaneça. Assim, pretende-se que as alterações de estratégia sejam minimizadas.

Desta forma, o PDTI cumpre o papel de ferramenta de gestão e de acompanhamento das atividades planejadas. Por meio do monitoramento contínuo, são tomadas ações preventivas e corretivas, aperfeiçoando-se a atuação organizacional, com garantia de eficiência e efetividade.

1.2 PREPARAÇÃO

Nesta fase, o grupo de trabalho responsável pela elaboração do PDTI 2024-2026, constituído por servidores da Subsecretaria de Governança de TI – SUGOV/STI, cuja atribuição é, dentre outras, coordenar a ação das demais subsecretarias da STI para “elaboração e acompanhamento” do PDTI/CJF, foi definido. Trabalhando em conjunto com o secretário de TI, o grupo de trabalho zelou para que PDTI estivesse alinhado ao Plano Estratégico de Tecnologia da Informação da Justiça Federal – PETI-JF.

Os documentos de referência foram identificados e serviram para nortear toda a elaboração deste plano, além do PETI-JF, um documento fundamental para elaboração deste plano foi o guia do PDTIC do SISP, versão 2.1. O PDTI/CJF 2021-2023 também foi uma das fontes principais de análise e aprendizado.

Ficou estabelecido, durante essa fase, o âmbito temporal de validade para o PDTI, limitado ao período de 2024 a 2026. Ressaltando-se a importância da realização de revisões durante sua vigência, principalmente quando necessária a adequação a novas diretrizes institucionais.

1.3 DIAGNÓSTICO

Os trabalhos desta etapa foram conduzidos pelo grupo responsável pela elaboração do plano, em trabalho conjunto com as demais áreas do CJF, principalmente às da STI, e se desenvolveu conforme a seguir:

1.3.1 ATIVIDADE: ANÁLISE DO AMBIENTE

Ação desenvolvida em conjunto com as demais áreas da STI/CJF, por meio de diálogo construtivo para determinação das forças, oportunidades, fraquezas e ameaças relativas ao campo da Tecnologia da Informação e de atuação do CJF. Esta análise está descrita na seção 7. Análise de ambiente.

1.3.2 ATIVIDADE: AVALIAÇÃO DO PDTI 2021-2023

Essa atividade foi realizada pelo grupo responsável pela elaboração do PDTI e consistiu na coleta de dados sobre a execução das ações do plano diretor entre 2021-2023 e análise de quais iniciativas e necessidades foram efetivadas, informações consolidadas na seção 5. Análise do PDTI 2021-2023.

1.3.3 ATIVIDADE: LEVANTAMENTO DA ESTRUTURA E RECURSOS DE TI

Na verificação da estrutura e dos recursos da área de TI deste Conselho, as unidades da STI colaboraram consolidando informações sobre quadros de pessoal. Para a apresentação de dados foi considerada a reestruturação da STI. Esse levantamento está descrito na seção 6. Estrutura e recursos de TI do CJF.

1.3.4 ATIVIDADE: LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE TI

As unidades de negócio do CJF apresentaram demandas organizadas em um quadro descritivo de necessidades que integra este PDTI.

1.3.5 ATIVIDADE: PRIORIZAÇÃO DE NECESSIDADES DE TI

Para cada necessidade foi descrita relevância, pelo solicitante, por meio da técnica de matriz GUT – gravidade, urgência e tendência, conforme a seguir:

- A) Gravidade: avaliação do impacto que a necessidade produz quando não atendida ou em função de seu atendimento.
- B) Urgência: análise do prazo ou do tempo disponível para se atender à necessidade.
- C) Tendência: análise da tendência de agravamento que o problema pode tomar ou de perda da oportunidade decorrente do não atendimento da necessidade.

A unidade que apresentou a necessidade informou valor para cada atributo, de forma que o valor final é expresso por meio da multiplicação do valor de cada atributo.

Tabela 1 Matriz GUT

Pontuação	Gravidade	Urgência	Tendência
5	Extremamente grave	É necessária ação imediata	Se nada for feito, a situação vai piorar rapidamente
4	Muito grave	Com alguma urgência	A situação vai piorar em pouco tempo
3	Grave	O mais cedo possível	A situação vai piorar a médio prazo
2	Pouco grave	Pode esperar um pouco	A situação vai piorar a longo prazo
1	Sem gravidade	Não há urgência	A situação não vai piorar

As ações prioritárias do PDTI são derivadas das necessidades relacionadas no Anexo IV - Inventário de necessidades prioritizadas de Tecnologia da Informação do CJF 2024-2026 e a análise do levantamento é apresentada na seção 9. Inventário de necessidades prioritizadas 2024-2026.

1.4 PLANEJAMENTO

Nesta fase de encerramento da elaboração do PDTI, são desenvolvidos planos e ações a serem realizados para se alcançarem objetivos estabelecidos para o plano diretor. No planejamento, estão detalhadas as necessidades, ações e iniciativas planejadas. Várias instâncias de governança de TI trabalharam nesta fase, sendo elas as principais responsáveis pelo estabelecimento de planos e direcionamento de ações, para que se garanta a efetividade do plano e os constantes monitoramentos e avaliações de resultado.

1.4.1 ATIVIDADE: PRIORIZAÇÃO DE NECESSIDADES DE TI

Representa a primeira ação da fase de planejamento do PDTI, é artefato essencial para identificação de ações e estabelecimento de planos da área de Tecnologia da Informação.

É realizada uma análise de dados e informações que fundamentam a deliberação da priorização de necessidades, por meio do uso da metodologia da matriz GUT. Essa atividade é desenvolvida com participação do Comitê de Governança de TI - CGovTI/CJF. São verificados os resultados do PDTI anterior, a análise do ambiente da TI do CJF, a estrutura da STI/CJF, entre outros critérios descritos na matriz de priorização apresentada a seguir.

Tabela 2 Matriz de priorização das necessidades do CJF

Critério	Descrição	Peso	PONTUAÇÃO		
			1	5	10
1. Determinação Legal/regulamentar	Avaliar se há normativo que embasa a necessidade.	3	Não possui determinação legal	Norma do CJF/CNJ/TCU	Constituição Federal e legislação infraconstitucional
2. Alinhamento estratégico	Analisar se a necessidade está alinhada aos objetivos estratégicos do CJF e à estratégia da JF.	2	Até 1 objetivo	Até 2 objetivos	3 ou mais objetivos
3. Prazo estimado	Tempo estimado para executar o projeto que atende à necessidade.	1	Acima de 18 meses	De 6 até 18 meses.	Até 6 meses.
4. Custo estimado	Avaliar o custo estimado necessário para as aquisições ou as contratações de serviços.	2	Acima de R\$ 500.000,00	De R\$ 100.000,00 até R\$ 500.000,00	Abaixo de R\$ 100.000,00 ou utiliza infraestrutura interna
5. Beneficiados	Verifica o público-alvo a ser beneficiado com o atendimento à necessidade.	2	Beneficia apenas uma unidade do CJF	Beneficia um conjunto de unidades do CJF	Beneficia atores externos: Justiça Federal ou jurisdicionados ou entes públicos ou a sociedade e o próprio CJF

As necessidades prioritizadas estão descritas na seção 9. Inventário de necessidades prioritizadas 2024-2026.

Aqui são apresentadas propostas de planos, de ações e de iniciativas para provimento de soluções de Tecnologia da Informação que tenham por objetivo atender estratégias prioritárias apresentadas identificadas no plano por meio de necessidades do negócio.

Dessa atividade derivam os planos de capacitação, de necessidades, de iniciativas, todos vinculados a objetivos estratégicos descritos também em alinhamento com a estratégia nacional do Poder Judiciário. Esses planos para o período de 2024-2026 estão descritos na seção 10. Planos.

1.4.2 ATIVIDADE: GESTÃO DE RISCOS DO PDTI

Primeiro os riscos associados às iniciativas são identificados e seu grau é analisado, então, respostas são planejadas para que as metas venham a ser alcançadas e o PDTI tenha sucesso em sua efetivação.

Para cada risco é definido o responsável por seu tratamento. Porém, há a possibilidade de que o custo envolvido na ação de tratamento seja muito oneroso, o que pode ter como resultado torne a execução da iniciativa planejada inviável.

Outro fenômeno que pode ocorrer é o levantamento de uma quantidade excessiva de riscos. Nessa situação, cabe às instâncias de governança de Tecnologia da Informação decidirem quais são os riscos considerados prioritários para enfrentamento. O plano de riscos é apresentado na seção 12. Gestão de riscos.

É importante informar que os riscos da área de Tecnologia da Informação serão tratados conforme determinado na Resolução CJF n. 798, de 24 de outubro de 2022, considerando os níveis de risco descritos a seguir:

Tabela 3 Escalonamento de valores para apuração do nível de risco

Escala de **probabilidade** (1 a 5):

1 = Muito baixa - IMPROVÁVEL: o evento ocorre apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou indícios que sinalizem sua ocorrência.

2 = Baixa - RARA: o evento tem baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.

3 = Média - POSSÍVEL: o evento repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios de que possa ocorrer nesse horizonte.

4 = Alta - PROVÁVEL: o evento repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios de que ocorrerá nesse horizonte.

5 = Muito alta - PRATICAMENTE CERTA: o evento tem ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.

Escala de **impacto** (1 a 5):

1 = Muito baixo - MÍNIMO: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.

2 = Baixo - PEQUENO: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.

3 = Médio - MODERADO: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.

4 = Alto - SIGNIFICATIVO: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.

5 = Muito alto - CATASTRÓFICO: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

Escala de **nível de risco** (probabilidade X impacto):

MUITO BAIXO: nível de risco ≤ 3 ;

BAIXO: $4 \leq$ nível de risco ≤ 6 ;

MÉDIO: $8 \leq$ nível de risco ≤ 10 ;

ALTO: $12 \leq$ nível de risco ≤ 16 ;

MUITO ALTO: nível de risco ≥ 20 ;

1.4.3 ATIVIDADE: CONSOLIDAÇÃO DE MINUTA DO PDTI

Dá-se por meio da apresentação do documento formal do PDTI, composto pelas informações, planos, iniciativas e necessidades, ou seja, é o produto da fase de elaboração.

Essa minuta será analisada por equipe especializada que realizará a revisão gramatical de seu texto.

O alinhamento com as diretrizes institucionais, a qualidade das metas e dos indicadores, entre outros componentes deste PDTI são aspectos analisados pela Secretaria de Estratégia e Governança.

1.4.4 ATIVIDADE: APROVAÇÃO DA MINUTA DO PDTI

A minuta do PDTI também será submetida à aprovação do CGovTI, que fará análise de seu conteúdo e deliberará sobre a qualidade técnica da proposta delineada por meios de seus vários planos. Depois a minuta do PDTI também será analisada e aprovada pela presidência deste Conselho, a partir daí, passa a ser determinante no trabalho da STI/CJF.

1.4.5 ATIVIDADE: PUBLICAÇÃO DA MINUTA DO PDTI

A publicação do PDTI tem como objetivo a promoção da transparência das ações e dos custos de investimento em TI, por meio da veiculação de informações de prestação de contas e de alcance de metas, ou seja, da eficiência e da efetividade de suas ações. E será realizada após sua aprovação formal e se dará nos portais CJF da intranet e na internet, como determinado pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução CNJ n. 370/2021.

2 PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2024-2026

Serão aqui descritas iniciativas, necessidades, riscos e oportunidades a serem desenvolvidas, mitigadas e impulsionadas ao longo dos próximos três anos, 2024-2026. Para tanto, a STI/CJF, em ação conjunta com os TRFs, planeja contratações, inclusive conjuntas, além do desenvolvimento e da sustentação de sistemas informatizados e provimento de infraestrutura em nuvem, a NUJUFE, já implantada, mas em que haverá ações de melhoria. Dessa forma, este planejamento tem, como fator de delimitação geográfica, a larga dimensão territorial brasileira e, conseqüentemente, da Justiça Federal, dividida em seus seis territórios, o que corresponde a atuar para o desenvolvimento tecnológico e a prestação de serviço em um ambiente de grandes dimensões, complexo e diverso.

A preparação para desenvolvimento deste PDTI envolveu o levantamento de realizações e de pendências advindas do PDTI 2021-2023. E, também, o diagnóstico das áreas negociais e das unidades internas da STI/CJF, quanto a contratações, capacitação dos colaboradores, demanda de pessoal para composição do quadro próprio de servidores e, ainda, as demandas por desenvolvimento de sistemas e projetos.

Durante o processo de elaboração foram analisados os ambientes interno e externo ao CJF e à Justiça Federal de primeiro e segundo graus, por meio de ferramentas de análise e diagnóstico organizacional. Dessa análise derivaram-se riscos, que para serem tratados foram definidas iniciativas e necessidades de contratação, de melhoria de processos, de desenvolvimento de sistemas, entre outras mais detalhadas adiante.

A análise e o planejamento aqui apresentados estão alinhados ao Plano Estratégico da Justiça Federal 2021-2026, em que a Tecnologia da Informação é apontada como um fator de oportunidade, por seu uso para a “racionalização de recursos” e para “facilitar o acesso da população”, e como um ponto forte, no cenário interno, por permitir a “inovação e virtualização do acervo”. Está, também, relacionado ao Plano Estratégico de Tecnologia da Informação da Justiça Federal 2021 – 2026. Compondo, portanto, o presente PDTI o último ciclo de plano diretor para o CJF ligado a esses dois artefatos de planejamento da Justiça Federal.

3 ANÁLISE DO PDTI 2021-2023

As ferramentas de Tecnologia da Informação são um suporte essencial para a consecução de ações da Justiça Federal, mas não é possível alcançar resultados por meio de seu mero emprego. Para a efetividade das ações as áreas negociais precisam trabalhar de forma conjunta com a área de Tecnologia da Informação e, assim, construir em conjunto soluções eficientes.

Em 2015, o CJF iniciou um importante processo de amadurecimento na forma de implementar a estratégia, finalizando, em 2020, com a institucionalização do arcabouço normativo para a gestão da estratégia da Justiça Federal. Com isso, implementou-se novas práticas de governança corporativa e de TI com a publicação da Resolução n. 632/2020, posteriormente alterada pela Resolução CJF n. 781/2022 [DR06], da Resolução n. 668/2020 [DR07], bem como da Portaria n. 576/2020 [DR08].

Para a gestão de Tecnologia da Informação, a instituição do Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação – CGTI, Portaria CJF n. 294/2024 [DR09], e a do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação – CGovTI, Portaria CJF n. 537/2020 [DR10], corresponderam a um marco importante para a melhoria das atividades de governança de TI e do monitoramento de iniciativas e objetivos do PDTI.

Como informado, o planejamento das ações do PDTI foi desenvolvido em decorrência das necessidades apresentadas pelas diversas áreas do CJF. Para estabelecer o plano foram também considerados a estrutura de pessoal próprio e os serviços terceirizados.

O quadro de servidores de TI foi aumentado em 2019, contudo sofreu um decréscimo considerável durante o período da pandemia de covid-19, entre 2020 e 2023. No início de 2020, a STI contava com um total de 34 servidores, ao passo que, ao final de 2023, havia apenas 28 servidores. Grande parte dessa perda de pessoal se deu devido a um êxodo dos profissionais de TI para a iniciativa privada, a qual tem ofertado, de maneira geral, melhores perspectivas de remuneração, de progressão na carreira e de condições de trabalho.

Como consequência dessa defasagem do quadro de pessoal, a STI enfrenta, atualmente, uma grande limitação da sua força de trabalho, o que ocasiona uma diminuição considerável do número de necessidades atendidas no contexto do CJF e da Justiça Federal de 1º e de 2º níveis.

O PDTI 2021-2023 foi desenvolvido tendo como fundamentos o PETI 2021-2026 e as normas relativas à área de Tecnologia da Informação, a análise de seus resultados será apresentada a seguir.

Algumas necessidades apresentadas no PDTI/CJF 2021-2023 não foram efetivadas por sua relevância ter perdido significado em decorrência de vários fatores como a limitação da quantidade de pessoal, a implementação de alternativas ou o advento de nova tecnologia. As necessidades não efetivadas estão demonstradas no Anexo IX – necessidades não efetivadas 2021-2023.

Assim, em decorrência do monitoramento e da avaliação contínua do plano diretor, verifica-se a necessidade de inclusão de novas demandas e a interrupção de outras, mantendo, sempre, os deveres de eficácia, eficiência e efetividade no emprego de recursos públicos.

Na sequência são apresentados os dados sobre o atendimento das necessidades descritas no PDTI 2021-2023. No gráfico está descrito que das 284 necessidades previstas, 173, ou seja, 61% foram efetivadas.

Figura 3 Situação das necessidades do PDTI 2021-2023



3.1 DEMANDA POR CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES – 2021-2023

A seguir é apresentada a análise do PDTI 2021-2023 quanto aos seguintes planos: de capacitação de servidores, realização de novas contratações e contratações continuadas.

No plano de capacitações para 2021, foi prevista a realização de 32 treinamentos. Desses, 14 foram concluídos. Para 2022, foram demandados nove treinamentos, sendo cinco realizados, e persiste a necessidade de realização de cinco desses treinamentos. Já a capacitação prevista para 2023 totalizou a demanda por 10 treinamentos. Desses, quatro foram concluídos, e permanece a necessidade de realização de nove cursos.

Tabela 4 Quadro comparativo entre treinamentos previstos e treinamentos realizados 2021-2023

ANO	TREINAMENTOS PREVISTOS	TREINAMENTOS REALIZADOS
2021	32	14
2022	9	5
2023	10	4
TOTAL	51	23

Figura 4 Comparativo entre ações de capacitação previstas e realizadas durante a vigência do PDTI 2021-2023



Conclui-se que, ao longo dos três anos, foram demandados 51 treinamentos para as diversas unidades da STI. Dessa previsão inicial, 23 treinamentos foram concluídos, ou seja, 45% do previsto. E persiste a necessidade de realização de 34 treinamentos que fazem, em sua maioria, parte de um núcleo básico de conhecimentos necessários à realização de atividades na área de TI, representando, portanto, uma demanda contínua, descritos no Anexo I - Revisão PDTI 2021-2023.

3.2 DEMANDA POR NOVAS CONTRATAÇÕES 2021-2023


No PDTI 2021-2023, a demanda por contratações foi dividida em: novas demandas e demandas de contratação continuada.

Quanto a novas demandas, para o ano de 2021, foram planejadas 23 contratações, das quais 21 foram concluídas no prazo. Já em 2022, foram demandadas 21 contratações. Dessas, 13 foram concluídas no ano previsto. Para 2023, 27 novas contratações foram planejadas e 13 foram concluídas.

Tabela 5 Quadro comparativo de novas contratações previstas e novas contratações efetivadas 2021-2023

ANO	NOVAS CONTRATAÇÕES PREVISTAS	NOVAS CONTRATAÇÕES EFETIVADAS
2021	23	21
2022	21	13
2023	27	13
TOTAL	71	47

Figura 5 Comparativo entre as novas contratações previstas e as concretizadas durante a vigência do PDTI 2021-2023

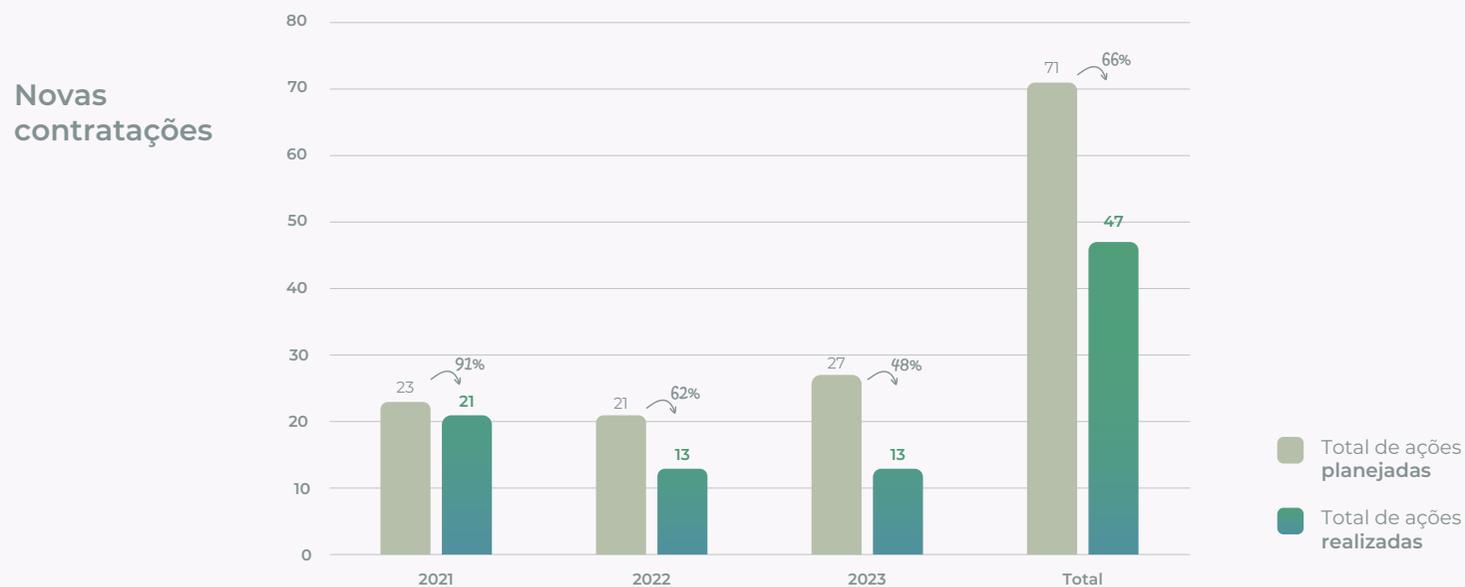

No período de 2021 a 2023, foram previstas 71 novas contratações. Dessas, 47 concluídas no prazo inicialmente previsto, representando um total de 66% de execução do planejado para novas contratações.

3.3 DEMANDA POR CONTRATAÇÕES CONTINUADAS 2021-2023

A previsão de realização de contratações continuadas foi de 51, em 2021. Desse planejamento, 28 foram efetivadas. Para 2022, foram planejadas 65 contratações e 42 foram concluídas no prazo. Em 2023, foram previstas 46 contratações e concluídas 33 dessas ações.

Tabela 6 Quadro comparativo entre contratações continuadas previstas e contratações continuadas efetivadas 2021-2023

ANO	CONTRATAÇÕES CONTINUADAS PREVISTAS	CONTRATAÇÕES CONTINUADAS EFETIVADAS
2021	51	28
2022	65	42
2023	46	33
TOTAL	162	103

Figura 6 Comparativo entre as contratações continuadas previstas e as concretizadas durante a vigência do PDTI 2021-2023



Verifica-se, portanto, que, no período de 2021 a 2023, foram previstas 162 contratações de caráter continuado. Dessas, 103 foram concluídas no prazo inicialmente previsto, representando um total de 63% de efetivação do planejado, descritos no Anexo II - Revisão PDTI 2021-2023 - contratações efetivadas.

Em suma, na vigência do PDTI anterior, foram assinados 38 novos contratos, relacionados a seguir:

Tabela 7 Novos contratos 2021-2023

ID	N. PROCESSO	N. CONTRATO	DESCRIÇÃO DO OBJETO
1	0000843-22.2020.4.90.8000	011/2021	Solução de segurança da informação do Conselho da Justiça Federal – CJF para proteção da Nuvem Privada da Justiça Federal – NUJUFE (Solução de Gerenciamento Unificado de Ameaças – UTM), contemplando fornecimento de equipamentos (appliances), licenciamento de software, serviços de instalação e configuração, suporte técnico e garantia para 36 (trinta e seis) meses.
2	0000843-22.2020.4.90.8000	012/2021	Solução de segurança da informação do Conselho da Justiça Federal – CJF para proteção da Nuvem Privada da Justiça Federal – NUJUFE (solução de Firewall para Aplicações WEB – WAF), contemplando fornecimento de equipamentos (appliances), licenciamento de software, serviços de instalação e configuração, suporte técnico e garantia para 36 meses.
3	0000843-22.2020.4.90.8000	013/2021	Solução de segurança da informação do CJF para proteção da nuvem privada da Justiça Federal – NUJUFE (solução de proteção para ambiente de data center virtual), contemplando fornecimento de equipamentos (appliances), licenciamento de software, serviços de instalação e configuração, suporte técnico e garantia para 36 meses.
4	0002509-40.2020.4.90.8000	016/2021	Fornecimento de licenças de software de virtualização de estações de trabalho (Horizon 7 Enterprise – CCU)
5	0000341-64.2021.4.90.8000	019/2021	Aquisição de licenças (como serviço) da solução dicionário Houaiss Corporativo.
6	0000378-56.2021.4.90.8000	020/2021	Subscrições da solução de videoconferência ZOOM meeting, para até 100 participantes.
7	0003178-74.2020.4.90.8000	022/2021	Fornecimento de certificados digitais A1.
8	0003178-74.2020.4.90.8000	021/2021	Fornecimento de certificados digitais A3.
9	0003171-06.2020.4.90.8000	ARP 024/2021	Registro de preços para eventual periféricos e bens de TI.
10	0004108-15.2020.4.90.8000	025/2021	Prestação de serviços de assistência técnica para equipamentos pertencentes à solução do ambiente físico seguro e seus subsistemas, do tipo Sala-Cofre Modular.

11	0004442-13.2020.4.90.8000 / 0002183-03.2021.4.90.8000	026/2021	Prestação de serviços de impressão distribuída (outsourcing de impressão).
12	0000547-85.2021.4.90.8000	033/2021	Software ZOOM Vídeo Webinar para até 1.000 participantes.
13	0000685-73.2021.4.90.8000 / 0003037-51.2021.4.90.8000	035/2021	Atualização da versão vitalícia do VW Ponto para Velti Ponto com migração de dados e serviços de suporte especializado ao produto pelo período de 30 meses.
14	0004099-90.2020.4.90.8000	040/2021	Serviço de suporte aos usuários com solução de gerenciamento de serviços de TI.
15	0000261-45.2021.4.90.8000 / 0003854-63.2021.4.90.8000	045/2021	Serviços de manutenção corretiva e preventiva do equipamento Storage Netapp FAS-9000 como extensão da garantia.
16	0004481-11.2020.4.90.8000	050/2021	Solução para gerenciamento de acesso privilegiado (Privileged Access Management - PAM) para proteção dos ambientes computacionais do CJF.
17	0000483-86.2021.4.90.8000	2021	Serviço de atualização (upgrade) dos softwares CYPECAD e PROHIDRÁULICA, com suporte técnico.
18	0002070-18.2021.4.90.8000 / 0000930-13.2022.4.90.8000	003/2022	VWPonto - manutenção equipamentos (cenário II).
19	0003522-71.2020.4.90.8000	004/2022	Contratação de um gerenciador de repositório de software (Gitlab Enterprise).
20	0003672-01.2020.4.90.8000	012/2022	Manutenção Sistema ASI.
21	0002285-20.2021.4.90.8000	019/2022	Prestação de serviços de comunicação de dados para conexão da rede do CJF à internet com saída pelo STJ.
22	0003517-11.2020.4.90.8000	021/2022 ARP 015/2022	RedHat - contratação de empresa especializada para o fornecimento de subscrições de software corporativo de código aberto do tipo plataforma de contêineres, sistemas operacionais e servidores de aplicação da RedHat. Conjunta TRF5.
23	0001159-11.2021.4.90.8000 / 0002615-95.2022.4.90.8000	022/2022	Subscrição de SUSE LINUX enterprise server.
24	0003775-25.2021.4.90.8000	028/2022	PERGAMUM - Suporte técnico mensal, com atualização e manutenção preventiva, corretiva, evolutiva e adaptativa, de migração e integração e de treinamento para o software Pergamum.
25	0001191-79.2022.4.90.8000	029/2022	Licenças (como serviço) da solução Dicionário Houaiss Corporativo, com garantia de 36 (trinta e seis) meses, incluindo suporte técnico remoto.

26	0003812-12.2021.4.90.8000	030/2022	Serviço técnico de sustentação do ambiente de infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) e monitoramento.
27	0000387-64.2022.4.90.8000	2022	Aquisição de câmeras de videoconferência acompanhadas de microfones de expansão, com o intuito de atender às necessidades das sessões do Conselho da Justiça Federal.
28	0001634-87.2021.4.90.8000	2022	Subscrições do software PHPStorm para atender às necessidades do Grupo de Trabalho de desenvolvimento e implantação do Sistema Eletrônico de Recursos Humanos - SERH Nacional (Ferramenta IDE).
29	0000348-58.2022.4.90.8000 / 0000035-62.2023.4.90.8000	009/2023	Extensão de garantia do fabricante, serviços de atualização e suporte técnico de dois equipamentos appliance Dell DD6800.
30	0000615-88.2022.4.90.8000 / 0000036-43.2023.4.90.8000	010/2023	Serviço de extensão de garantia do fabricante, serviços de atualização e suporte técnico, manutenção corretiva e preventiva das soluções de segurança de perímetro.
31	0001085-68.2022.4.90.8000	013/2023	Plugin de renderização em tempo real Enscape, compatível com o software Autodesk Revit.
32	0003441-13.2022.4.90.8000 / 0001717-83.2023.4.90.8000	019/2023	Subscrições Microsoft.
33	0001410-19.2023.4.90.8000 / 0002569-32.2023.4.90.8000	022/2023	Serviço de suporte técnico dos servidores de rede em lâmina (tipo blade).
34	0002028-41.2023.4.90.8000	024/2023	RedHat - Contratação de empresa especializada para o fornecimento de subscrições de software corporativo de código aberto do tipo plataforma de contêineres, sistemas operacionais e servidores de aplicação da RedHat. Conjunta TRF5.
35	0001275-39.2023.4.90.8000 / 0003117-12.2023.4.90.8000	029/2023	Subscrição Adobe Creative Cloud.
36	0002477-80.2023.4.90.8000	031/2023	Aquisição de licenças do software de design gráfico Autodesk AEC para desenvolvimento de projetos de Arquitetura e Engenharia.
37	0003989-73.2022.4.90.8000	032/2023	Desenvolvimento do novo Portal do CJF, incluindo implantação, migração, manutenção e transferência de conhecimento.
38	0000179-46.2023.4.90.8000	033/2023	Aquisição de computadores do tipo workstation de alto desempenho.

3.4 EFETIVAÇÃO DO PLANEJAMENTO 2021 - 2023

Ao se analisar os dados de demandas por capacitação, por novas contratações e por contratações continuadas, verifica-se que houve um nível médio de efetivação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2021-2023, alcançado um índice de 57% de realização do planejado.

Quanto aos recursos financeiros empenhados em contratações da área de Tecnologia da Informação deste Conselho, foram aplicados, em 2021, R\$ 13.767.739,59 (treze milhões, setecentos e sessenta e sete mil, setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos). Em 2022, foram usados, em contratações, R\$ 12.961.664,15 (doze milhões, novecentos e sessenta e um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos). Em 2023, os custos envolveram um montante de R\$ 13.455.147,69 (treze milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, cento e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

Verifica-se, portanto, que, ao longo de três anos, de 2021 a 2023, foram empenhados um total de R\$ 40.184.551,43 (quarenta milhões, cento e oitenta e quatro mil e cinquenta um reais e quarenta e três centavos).

Tabela 8 Tabela 8 – Montante de recursos aplicados em TI

MONTANTE DE RECURSOS APLICADOS EM TI NO CJF ENTRE 2021 E 2023	
Ano	Montante de recursos
2021	R\$ 13.767.739,59
2022	R\$ 12.961.664,15
2023	R\$ 13.455.147,69
TOTAL	R\$ 40.184.551,43


4 ESTRUTURA E RECURSOS DE TI DO CJF EM 2024

Abaixo estão descritas a estrutura organizacional da área de Tecnologia da Informação do CJF, a estrutura de governança de TI do Conselho, diretamente envolvida na elaboração deste plano, bem como será apresentada a estrutura de pessoal e orçamentária da TI deste Conselho.

4.1 ESTRUTURA INTERNA DE GOVERNANÇA E DE GESTÃO DE TI

Compõem a estrutura interna de governança e de gestão de TI/CJF, a estrutura administrativa, com plenário, ministro presidente, Secretaria-Geral e Secretaria de Tecnologia da Informação [DR11], e os dois comitês de governança e gestão de TI: Comitê de Governança de TI - CGovTI [DR10] e o Comitê de Gestão de TI - CGTI [DR09]. Essa estrutura está descrita a seguir:

Figura 7 Estrutura de governança e de gestão de TI do CJF

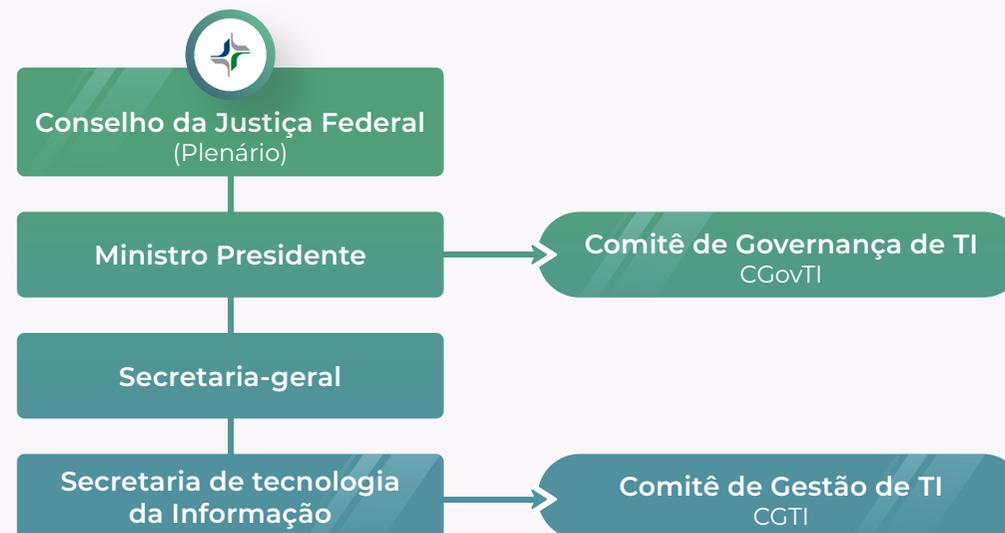

A estrutura de governança do CJF está descrita a seguir com instâncias correlacionadas.


Figura 8 Estrutura de governança e de gestão de TI do CJF e da Justiça Federal



4.2 O SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL – SIJUS

O Sistema de Tecnologia da Informação da Justiça Federal – SIJUS, Resolução CFJ n. 743/2021, é composto pelas unidades de Tecnologia da Informação deste Conselho, dos Tribunais Regionais Federais e das Seções Judiciárias. Tem como objetivo realizar o apoio a governança e gestão de TI, exercendo o direcionamento do planejamento das iniciativas do PDTI. A seguir está descrita a estrutura do SIJUS:

Figura 9 Estrutura do SIJUS



4.3 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

O orçamento de TI previsto para 2024 é apresentado na tabela a seguir:

Tabela 9 Orçamento de TI estimado para 2024


TIPO DA DESPESA	CJF (R\$)	NACIONAL (R\$)	TOTAL (R\$)
Custeio	25.000.000,00	17.000.000,00	42.000.000,00
Investimento	10.000.000,00	8.000.000,00	18.000.000,00
TOTAL	35.000.000,00	25.000.000,00	60.000.000,00

4.4 A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CJF

A Secretaria de Tecnologia da Informação – STI é integrada por cinco Subsecretarias, duas divisões e uma assessoria, conforme estrutura orgânica do Conselho da Justiça Federal [DR11].

Com a função de, entre outras, coordenar o Sistema de Tecnologia da Informação da Justiça Federal, a STI/CJF elabora e implementa o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação do CJF e da Justiça Federal. Apresenta-se a seguir a estrutura organizacional da STI/CJF:

Figura 10 Estrutura organizacional de TI do CJF

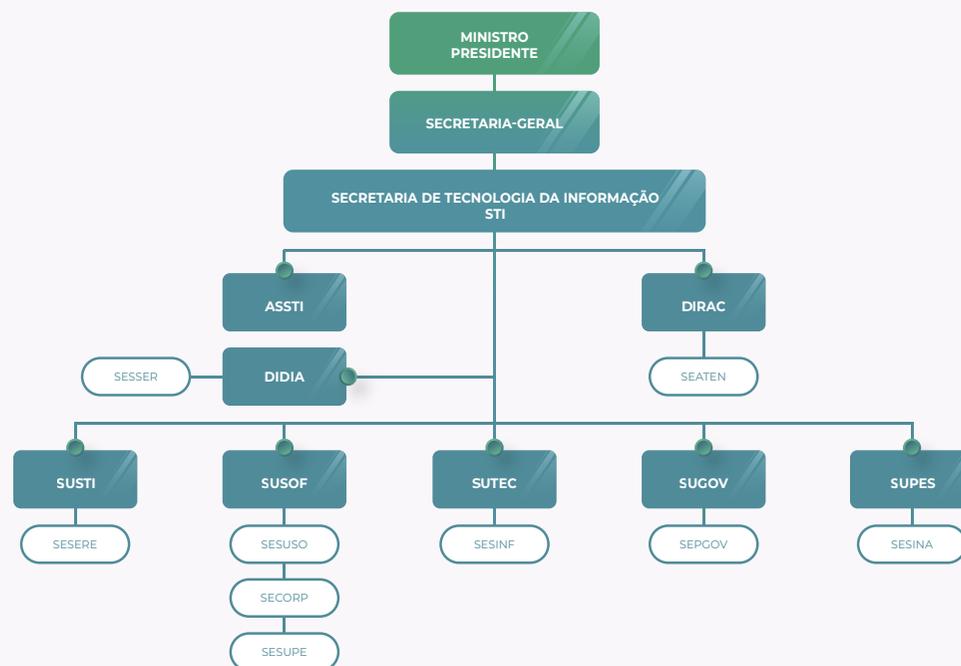

Observa-se que a STI responde à Secretaria-Geral subordinada ao ministro presidente, o que proporciona alto grau de autonomia e valorização das atividades realizadas, demonstrando a clara compreensão da instituição sobre a importância central que a Tecnologia da Informação tem para o desenvolvimento de atividades e alcance do seu objetivo.

Essa configuração é resultado de uma reestruturação da STI realizada por meio da Resolução CJF n. 857, de 23 de novembro de 2023 [DR11], segundo a qual houve a inclusão da Divisão de Tratamento de Dados, Inovação e Inteligência Artificial – DIDIA e da Subsecretaria de Planejamento e Gestão de Sistemas Nacionais – SUPES, definindo duas novas unidades com serviços que já vinham sendo realizados no

âmbito da STI, mas que, atualmente, têm responsabilidades, objetivos e atividades diretamente definidas.

4.5 A FORÇA DE TRABALHO DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

4.5.1 QUANTITATIVO E DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DE TI

Atualmente, a Secretaria de Tecnologia da Informação do CJF possui um total de 26 (vinte e seis) servidores. Ao fazer um comparativo entre a força de trabalho de TI do Conselho com a de outros órgãos do Poder Judiciário, é possível observar que o CJF possui um quantitativo significativamente aquém do observado nos demais. Por exemplo, a Secretaria de Tecnologia da Informação – SETIC do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT, por exemplo, possui 46 servidores de TI. Tal diferença mostra-se ainda mais relevante quando constatado que não presta serviços corporativos de TI ao órgão, atribuição a cargo da Secretaria de TI – SETIN do Tribunal Superior do Trabalho – TST. O foco da SETIC está voltado a projetos de cunho nacional, como o PJe e sistemas da atividade meio, bem como o de organizar e controlar o orçamento nacional voltado a ações de TI.

Já a Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, apesar de também prestar os serviços corporativos de TI tradicionais, assim como a STI do CJF, possui 52 servidores em seus quadros de pessoal.

Tabela 10 Relação entre a força de trabalho de TI do CJF, do CSJT e CNJ

ÓRGÃO	QUANTIDADE DE SERVIDORES ALOCADOS NA ÁREA DE TI	PERCENTUAL DE SERVIDORES A MAIS EM RELAÇÃO AO CJF
CJF	26	---
CSJT	46	76,92%
CNJ	52	100%

A tabela 11, a seguir, apresenta o quantitativo de servidores distribuídos em cada uma das repartições da STI/CJF, bem como distingue os servidores pertencentes ao quadro do Conselho e aqueles que são cedidos de outros órgãos do Judiciário ou até mesmo de outras carreiras:


Tabela 11 Força de trabalho de TI/CJF

SIGLA	NOME	QUANTIDADE DE SERVIDORES EFETIVOS DO QUADRO DO CJF	QUANTIDADE DE SERVIDORES CEDIDOS DE OUTROS ÓRGÃOS	ÓRGÃO DE ORIGEM	TOTAL
STI	STI – Secretaria de Tecnologia da Informação	0	1	PCDF	1

ASSTI	ASSTI - Assessoria da Secretaria de Tecnologia da Informação	0	1	STJ	1
SUGOV	SUGOV - Subsecretaria de Governança de TI	2	0	---	4
	SEPGOV - Seção de Projetos de Governança	1	1	STJ	
SUSTI	SUSTI - Subsecretaria de Segurança da Tecnologia da Informação	0	1	SEPLAD/GDF	2
	SESERE - Seção de Segurança de Rede	0	1	STJ	
SUSOF	SUSOF - Subsecretaria de Engenharia de Software	0	1	PCDF	8
	SESUSO - Seção de Sustentação De Software	3	1	STJ	
	SECORP - Seção de Projetos de Softwares Corporativos	2	0	---	
	SESUPE - Seção de Suporte à Engenharia de Software	1	0	---	
SUTEC	SUTEC - Subsecretaria de Infraestrutura e Suporte Técnico	0	1	STJ	2
	SESINF - Seção de Suporte à Infraestrutura	0	1	STJ	
SUPES	SUPES - Subsecretaria de Planejamento e Gestão de Sistemas Nacionais	1	0	---	3
	SESINA - Seção de Sistemas Nacionais	1	1	MPU	
DIDIA	DIDIA - Divisão de Tratamento de Dados, Inovação e Inteligência Artificial	1	0	---	3
	SESSER - Seção de Suporte a Serviços	2	0	---	
DIRAC	DIRAC - DIVISÃO DE Relacionamento e da AC-JUS	1	0	---	2
	SEATEN - Seção de Atendimento e Suporte ao Usuário	0	1	STJ	
TOTALIS		15	11		26

De forma complementar, a distribuição dos servidores da STI pode ser melhor compreendida através dos gráficos abaixo:

Figura 11 Comparativo de servidores do CJF e requisitados



Ao analisar os dados sobre a quantidade de pessoal alocado na Secretaria de Tecnologia da Informação do CJF, verifica-se uma redução superior a 23,5% na força de trabalho em comparação com o plano diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 2021-2023. Enquanto a STI dispunha, conforme PDTI anterior, de 34 servidores, atualmente ela com apenas 26 servidores.

O déficit de pessoal torna-se ainda mais expressivo quando se analisa a quantidade de servidores alocados na STI que são da carreira do CJF. Apenas 15 servidores são do quadro de pessoal do CJF, os outros 11 são cedidos de órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público ou do governo do Distrito Federal. Sendo, portanto, mais de 42% da força de trabalho da área de Tecnologia da Informação do CJF cedido de outras carreiras.

Outra informação notada pela Tabela 11 é inexistência de servidores do quadro do CJF que atuam em áreas críticas, como a Subsecretaria de Segurança da Tecnologia da Informação e a Subsecretaria de Infraestrutura e Suporte Técnico.

A falta de pessoal lotado na área de TI deste Conselho, é fator que representa um alto risco de descontinuidade para os serviços, dada a possibilidade de baixa retenção de conhecimento, além da existência de riscos inerentes à saúde da força de trabalho em virtude do acúmulo de atividades e riscos para as contratações devido à falta de pessoal com conhecimento das necessidades internas e com conhecimento de mercado.

A falta de pessoal para realização das atividades fica evidente na análise SWOT realizada com as áreas da STI, visto que foi a fraqueza mais apontada no estudo, conforme Tabela 14, a ser apresentada mais adiante.

4.5.2 ALOCAÇÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA DA FORÇA DE TRABALHO DA STI/CJF

Apresenta-se o detalhamento das atividades executadas pelos servidores em cada unidade da STI/CJF, informação que representa importante insumo para a elaboração deste plano diretor, já que a força de trabalho é uma limitação à consecução de objetivos e projetos.

Tabela 12 Alocação da capacidade produtiva de TI do CJF

UNIDADE	QTDE. DE SERVIDORES	PRINCIPAIS ATIVIDADES OPERACIONAIS/CONTINUADAS	CAPACIDADE ALOCADA P/ ATIVIDADES OPERACIONAIS / CONTINUADAS
SUGOV	4	Apoio e controle às contratações de TI; monitoramento dos processos de gerenciamento de serviços de TI; monitoramento do PETI e do PDTI; monitoramento da execução dos planos de contratação, de capacitação e orçamentário de TI; monitoramento dos planos de ação de gestão de riscos de processos de TI, de atendimento ao iGovTIC-JUD e de satisfação de TI; apoio ao Comitê de Governança de TI; gestão de contratos.	80%
SUSTI	2	Gestão das soluções de segurança de TI das estações de trabalho e dos servidores de rede do CJF; verificação de logs e alertas gerados pelas soluções e dispositivos de segurança de TI; verificação de indicadores que evidenciem o comprometimento de ativos de TI do CJF; análise de solicitações de criação, alteração e exclusão de regras de firewall; avaliação e autorização de mudanças no ambiente tecnológico que modifiquem configurações de segurança de TI; resposta aos incidentes de segurança de TI; realização de análise de vulnerabilidades e de riscos de segurança do ambiente de TI; gestão de regras para bloqueio de spam, phishing e outras mensagens maliciosas; definição de ações de proteção contra-ataques cibernéticos; gestão de certificados digitais para os serviços do CJF publicados na internet; gestão de filtros de conteúdo de acesso à internet.	80%
SUSOF	8	Suporte administrativo à SUSOF; sonitoramento das ferramentas de CI/CD; administração dos jobs DEVOPS; atualização dos archetypes de sistemas; prospecção de ferramentas de desenvolvimento; administração de ferramenta SSO; apoio nos MR de implantação de sistemas;	60%

SUTEC	2	gestão de contratos, incluindo o de sustentação da infraestrutura de TI; supervisionar o ambiente tecnológico (infraestrutura, serviços corporativos etc.); gestão dos ativos de infraestrutura de TI.	80%
SUPES	3	Coordenar e supervisionar a implementação de projetos nacionais, assegurando o cumprimento dos objetivos e prazos estabelecidos; identificar proativamente as necessidades da Justiça Federal na área de sistemas de informação em âmbito nacional alinhadas aos objetivos estratégicos da Justiça Federal; acompanhar o portfólio de projetos, ações e iniciativas de sistemas nacionais, garantindo que estejam alinhados e contribuam diretamente para o alcance dos objetivos estratégicos institucionais da Justiça Federal; coordenar atividades técnicas e negociais vinculadas aos projetos nacionais; padronizar e formalizar práticas, processos e operações de gestão de projetos nacionais; avaliar o desempenho dos projetos nacionais com o intuito de identificar oportunidades de otimização para aprimorar a eficiência e eficácia; apoiar o Comitê Gestor Nacional em relação aos projetos nacionais.	60%
DIDIA	3	Coordenar a gestão e o tratamento de dados, abrangendo aspectos como a coleta, armazenamento, processamento e análise dos dados; promover, no que se refere aos aspectos tecnológicos, o fomento à inovação no âmbito da Justiça Federal; realizar a prospecção de tecnologias disruptivas de interesse da Justiça Federal; promover parcerias com as empresas e instituições públicas e privadas, com vistas à modernização e inovação tecnológica; coordenar o planejamento de contratações de ferramentas para atendimento de demandas relacionadas a tratamento de dados, inovação e inteligência artificial; definir as políticas de backup, recuperação e segurança dos dados; promover o avanço estruturado do conhecimento e do uso de práticas de ciência de dados no âmbito do Conselho da Justiça Federal.	70%
DIRAC	2	Gerir e coordenar as atividades da Autoridade Certificadora da Justiça; gestão de ativos de microinformática; gestão e fiscalização de contratos de serviços continuados, incluindo mão de obra alocada em postos de trabalho.	75%

5 ANÁLISE DE AMBIENTE (FORÇAS, FRAQUEZAS, OPORTUNIDADES E AMEAÇAS)

A análise realizada por meio da elaboração da Matriz SWOT é uma importante fonte para compreensão das variáveis do ambiente em que a STI/CJF está inserida e, assim, representa um subsídio para a elaboração de planos futuros.

Essa metodologia analisa as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, no acrônimo em língua inglesa, SWOT – *strengths, weaknesses, opportunities and threats*, advindas do ambiente, conforme a descrição abaixo:

Tabela 13 Modelo de análise SWOT

AMBIENTE INTERNO	AMBIENTE EXTERNO
Forças	Oportunidades
O que nossa unidade faz bem?	Existem lacunas de serviços que nossa unidade possa preencher?
O que diferencia nossa unidade/trabalho?	Quais metas podem ser apontadas para nossa unidade para o período 2024 a 2026?
Fraquezas	Ameaças
O que pode ser melhorado no trabalho da nossa unidade?	Vislumbra mudanças ou novas tendências que podem impactar o trabalho da TI/unidade?
Quais recursos podem ser utilizados para a melhoria?	

O resultado da análise de ambiente realizada para o Conselho da Justiça Federal, com a participação de todas as unidades internas da STI, é apresentado na tabela a seguir:

Tabela 14 Análise de ambiente (SWOT) do CJF

UNIDADE	AMBIENTE INTERNO		AMBIENTE EXTERNO	
	FORÇAS	FRAQUEZAS	OPORTUNIDADES	AMEAÇAS
STI	Plataforma em nuvem – aumento da eficiência da prestação de serviços da JF.	Falta de acessibilidade de ativos físicos e digitais.	Sustentabilidade – fontes de energia sustentável	Segurança de dados – IA
	Investimento em capacitação contínua dos colaboradores.	Baixo uso de aplicações inteligentes no CJF.	IA generativa - regulamentos internos da JF para uso – confiança, riscos e segurança	Alto custo advindo da intensificação da utilização de TI - relativo à seleção de fornecedores e metas financeiras.
		Defasagem do quadro de pessoal - baixa capacidade de retenção de talentos na área de TI.	IA aumentada aplicada à TI.	Mercado aquecido para profissionais de TI, tanto no âmbito governamental quanto na iniciativa privada, ofertando melhor oportunidades salariais.
		Alto investimento em infraestrutura, baixíssimo investimento em pessoal.	Política de transformação digital já descrita em vários poderes e no Poder Judiciário.	
		Baixo nível de gerenciamento de processos das unidades internas da STI.		
SUGOV	Estratégias e indicadores bem definidos para o período 2024-2026 no PETI.	Baixa maturidade da gestão de processos, riscos e recursos.	Benchmarking de práticas de melhoria contínua já implantadas pelo Poder Judiciário	Cenário disruptivo envolvendo IA que implica no aumento de custos.
		Baixa capacidade de geração de valor.		
		Não realização de gestão de custos – e avaliação do retorno do investimento – ROI		
		Falta de planejamento operacional para atuação integrada das unidades internas da STI.		

DIRAC	Boa avaliação interna do serviço prestado pelo suporte ao usuário	Baixa educação digital dos colaboradores do CJF.	Chatbot e interfaces interativas	Aumento de custos de contratação decorrente do aquecimento salarial das áreas de TI.
			Transformação digital demanda mais uso de PKI.	
			PKI como serviço – adoção para simplificação do processo de gestão.	
			Confiança digital e seus padrões como pilares para adoção de políticas organizacionais.	
DIDIA	Se tratando de uma nova unidade, o planejamento de atividades é facilitado pela falta de demandas passadas.	Efetivo reduzido de servidores para execução paralela de demandas que envolvem o desenvolvimento de novas soluções.	Oportunidade de liderar na justiça federal as iniciativas de inovação tecnológica.	
		Baixo nível de gestão de dados e qualidade da informação – sistemas internos não voltados para essa atividade.	IA com entradas em texto, imagem, vídeo e áudio.	
		Demanda engajamento e capacitação dos participantes para implementação da assinatura digital o que provoca retardo nos processos.		
SUSTI	Área de segurança preconizada no planejamento estratégico de TI da Justiça Federal.	Gerenciamento de riscos de segurança de IA.	Gestão contínua de exposição a ameaças.	Aumento do uso de IA usada para aumento de spearphishing.
		Baixo efetivo de servidores o que corresponde a baixas habilidades de segurança.	Regulamentos de conformidade como balizadores.	Popularização da computação quântica e correspondente aumento de vulnerabilidade de segurança e privacidade.
			Soluções para redução do custo de infraestrutura.	

SUSOF	Profissionais com experiência de mercado	Experiência do usuário – melhoria do resultado para o usuário.	Expansão do uso de software de forma massiva – incorporação de tecnologia em todos os processos e vários produtos.	
	Processo e tecnologias de software definidos.		Engenharia de plataforma – reutilização de componentes.	
SUTEC	Indicadores de disponibilidade dos sistemas e serviços dentro do esperado.	Efetivo reduzido com risco à execução das atividades da unidade.	Inovações tecnológicas: Adoção de novas tecnologias (como APM, ITSM, armazenamento e SSD) para melhorar a eficiência.	Ataques cibernéticos: riscos de segurança cibernética e violações de dados.
	Parque de equipamentos e software em processo de modernização.	Desafios na gestão de conhecimentos: dificuldade em documentar e reter o conhecimento gerado pelas equipes, devido a rotatividade.	Treinamento: investimento na capacitação da equipe para melhorar habilidades e conhecimento.	Mudanças rápidas na tecnologia: dificuldade em manter a infraestrutura atualizada com as constantes mudanças tecnológicas.
	Implementação de medidas de segurança avançadas para proteger dados e sistemas.	Complexidade do ambiente tecnológico: arquitetura complexa dos sistemas e serviços podem levar a desafios de manutenção e gestão.	Treinamento: Investimento na capacitação da equipe para melhorar habilidades e conhecimento. Aumento da equipe: acréscimo de recurso humano na equipe.	Cortes de orçamento: falta de orçamento para manutenção e melhorias na infraestrutura.
		Grande quantidade de contratos a serem gerenciados e pequena quantidade de servidores.		
SUPES	Experiência de trabalho integrado com os TRFs a ser compartilhada com as demais unidades da STI.	Baixa exploração de normativos e políticas do CJF para integração tecnológica da JF.	Diversas áreas de TI com oportunidades de projetos a serem aproveitados.	Dimensão territorial com grande diversidade regional.
	Normativos sobre a responsabilidade de gestão em atividades colaborativas já definidos.			

Diante da análise SWOT apresentada pode-se notar que, como forças, foram apontadas questões relativas à existência de boa infraestrutura, parque computacional moderno, investimento em capacitação dos colaboradores, planejamento tático contínuo, boa avaliação do serviço pelos usuários e integração com os TRFs.

Como fraquezas, foram apontadas falta de acessibilidade em sistemas, defasagem de pessoal, baixo nível de gerenciamento de processos, falta de planejamento operacional, entre outras.

Referentes ao ambiente externo, como oportunidades, foram mencionadas a regulamentação e utilização de Inteligência Artificial - IA, benchmarking em boas práticas, utilização de interfaces interativas para atendimento aos usuários internos e externos.

Ademais, como ameaças, foram citados o aumento dos custos com TI advindo do emprego de inteligência artificial e a demanda por performance maior de infraestrutura, o aperfeiçoamento contínuo de ataques cibernéticos e os desafios advindos da grande dimensão territorial brasileira para alcance da atuação da Justiça Federal.

Por fim, pode-se concluir que o CJF possui uma infraestrutura capaz de fornecer serviços de TI de altíssima qualidade para toda a Justiça Federal, além de estrutura adequada para a sustentação e o desenvolvimento de novos projetos utilizando-se de tecnologias de ponta e boas práticas do mercado.

Contudo, diante da defasagem do quadro de pessoal, somada a uma alta rotatividade de servidores cedidos de outros órgãos e levando em consideração o ambiente computacional altamente heterogêneo e complexo, além do baixo nível de gestão de processos e serviços, a STI acaba por sobrecarregar os servidores e incorre em diversos retrabalhos que tornam as atividades penosas e ineficientes.

Resumidamente, a equipe de servidores de TI fica condicionada a trabalhar de uma maneira muito mais reativa e menos orientada ao planejamento e à melhoria de processos e serviços prestados.

6 DIRECIONADORES

6.1 PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL – PETI-JF 2021-2026

O PETI-JF 2021-2026 [DR05] é elaborado com o apoio dos membros do Comitê Gestor do SIJUS e aprovado pelo Plenário do CJF. O Sistema de Tecnologia da Informação da Justiça Federal – SIJUS, constituindo base fundamental para nortear a definição de projetos e de programas de TI integrantes deste plano diretor.

Conforme previsto no art. 42 da Resolução CNJ n. 370/2021 [DR04], que estabelece a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário – ENTIC-JUD, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTI deve contemplar o alinhamento à própria ENTIC-JUD e ao Plano Estratégico Institucional; as diretrizes estabelecidas em resoluções, recomendações e políticas inerentes à TIC instituídas para a concretização das estratégias nacionais do Poder Judiciário; as metas associadas aos indicadores de resultado; e as ações a serem implantadas no ciclo estratégico.

As subseções seguintes apresentam resumidamente os principais componentes do PETI-JF 2021-2026, considerando a alteração dada pela Resolução CJF n. 851, de 23 de novembro de 2023, com destaque para os objetivos estratégicos e indicadores e metas.

6.1.1 MISSÃO

Propor e garantir serviços de Tecnologia da Informação efetivos e sustentáveis para o aprimoramento da função institucional da Justiça Federal.

6.1.2 VISÃO

Ser protagonista da transformação digital na Justiça Federal, consolidando-se como sua parceira estratégica na busca da excelência e da inovação.

6.1.3 ATRIBUTOS DE VALOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A JUSTIÇA FEDERAL

Segurança da informação digital – **adotar as melhores práticas de segurança da informação para a proteção dos ativos digitais da Justiça Federal.**

- ✓ Qualidade – agir com eficiência e efetividade para atender com excelência as necessidades dos clientes internos e externos.
- ✓ Inovação – adotar novas tecnologias e atribuir novas capacidades a produtos, serviços ou processos organizacionais para melhor atender à expectativa da sociedade.
- ✓ Economicidade – promover os resultados esperados com o menor custo possível.
- ✓ Ética – agir com honestidade, integridade e credibilidade em todas as suas ações e relações.
- ✓ Transparência – garantir que a informação esteja disponível e acessível à sociedade.
- ✓ Celeridade – executar ações e processos com a agilidade requerida.
- ✓ Espírito de equipe – atuar de forma coesa e cooperativa, em direção a um objetivo comum, para criar um ambiente de trabalho positivo.
- ✓ Proatividade – tomar a iniciativa e antecipar ações para maximizar o alcance de resultados.
- ✓ Simplicidade – agregar valor continuamente de forma a facilitar os processos organizacionais.
- ✓ Empatia – identificar e compreender as necessidades e expectativas do outro.
- ✓ Resiliência – lidar com desafios e adaptar-se a mudanças de forma controlada e emocionalmente sustentável.

6.1.4 OBJETIVOS, INDICADORES ESTRATÉGICOS E METAS DO PETI-JF 2021-2026

Antes de apresentar objetivos, indicadores e metas, é importante ressaltar que a Resolução CJF n. 851, de 23 de novembro de 2023 retirou duas metas previamente constantes no PETI 2021-2026: “Implantar, até 2026, mais (seis) sistemas nacionais”, originalmente relacionada ao objetivo “Assegurar a atuação sistêmica da TI na Justiça Federal” e “Atingir, até 2026, a regulamentação de 13 (treze) normativos nacionais de segurança da informação”, originalmente relacionada ao objetivo “Promover e fortalecer a segurança da informação digital na JF”.

6.1.4.1 APERFEIÇOAR E ASSEGURAR A EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS DE TI PARA A JUSTIÇA FEDERAL

Tabela 15 Indicadores e metas do objetivo estratégico “Aperfeiçoar e assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal”.

INDICADOR	META
1 - Índice de satisfação dos clientes internos com os serviços de TI.	1 - Atingir, até 2025, 85% de satisfação dos clientes internos de TI.
2 - Índice de satisfação dos clientes externos com os serviços de TI.	2 - Atingir, até 2026, 80% de satisfação dos clientes externos de TI.

6.1.4.2 APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TI NA JUSTIÇA FEDERAL

Tabela 16 Indicadores e metas do objetivo estratégico “Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal”.

INDICADOR	META
3 - Índice de governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - iGovTIC-JUD.	3 - Atingir, em 2022, o nível de maturidade satisfatório, e a partir de 2023, o nível de maturidade aprimorado.

6.1.4.3 ASSEGURAR A ATUAÇÃO SISTÊMICA DA TI NA JUSTIÇA FEDERAL

Tabela 17 Indicadores e metas do objetivo estratégico “Assegurar a atuação sistêmica da TI na Justiça Federal”.

INDICADOR	META
4 - Índice de contratações conjuntas de soluções de TI com a participação dos órgãos da Justiça Federal.	4 - Realizar, até 2026, 10 contratações conjuntas.

6.2 PLANO ESTRATÉGICO DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL – PE/CJF – 2021-2026

O PE-CJF 2021-2026 é aprovado pelo presidente do CJF e sua elaboração é coordenada pela Secretaria de Estratégia e Governança do CJF, produzindo efeitos sobre todas as unidades do órgão.

Em virtude de sua abrangência, este documento limita-se a apresentar, nas subseções ulteriores, os objetivos, indicadores e metas integrantes do PE-CJF 2021-2026 que guardam relação direta com o tema Tecnologia da Informação e que, portanto, influenciam as prioridades definidas no âmbito do Plano Diretor de TI 2024-2026.

O quadro-resumo que trata evolução das metas monitoradas pela STI desde 2021 até o ciclo da estratégia vigente é apresentado no anexo

6.2.1 MACRODESAFIO: FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA NACIONAL DE TIC E DE PROTEÇÃO DE DADOS

6.2.1.1 OBJETIVO: FORTALECER A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Tabela 18 Indicadores e metas do objetivo estratégico "Fortalecer a Segurança da Informação".

INDICADOR	META
Índice de capacidade do processo de gestão de incidentes de segurança.	<p>Manter o nível 2 em 2024, atingir o nível 3 em 2025 e o nível 4 em 2026.</p> <p>Glossário: Nível 1 - Inicial Descrição: Processo de gestão de incidentes de segurança de TI inexistente ou incipiente Características <ul style="list-style-type: none"> • Não há processo para identificar incidentes de segurança de TI. Nível 2 - Gerenciado Descrição: Processo de gestão de incidentes de segurança de TI executado. Características <ul style="list-style-type: none"> • Processo informal para a gestão de incidentes de segurança de TI. • Plano informal de resposta a incidentes. • Ações tomadas de forma reativa. • Equipe de gestão de incidentes de TI designada. • Equipe de segurança de TI capacitada. • Ações de conscientização de usuários em segurança de TI. Nível 3 - Estabelecido Descrição: Processo de gestão de incidentes de segurança de TI definido e seguido. Características <ul style="list-style-type: none"> • Processo formal para a gestão de incidentes de segurança de TI. • Plano formal de resposta a incidentes. • Monitoramento contínuo de incidentes. • Detecção e ação tempestiva de incidentes. • Equipe de gestão de incidentes de incidentes designada formalmente e atualizada. • Equipe de segurança de TI capacitada formalmente. • Ações automatizadas de conscientização de usuários em segurança de TI. Nível 4 - Gerenciado quantitativamente Descrição: Processo de gestão de incidentes de segurança de TI analisado quantitativamente. Características <ul style="list-style-type: none"> • Métricas e indicadores de desempenho coletados e analisados. • Monitoramento contínuo e constante. • Resposta imediata aos incidentes analisados. • Ações quantificadas de conscientização de usuários em segurança de TI. </p>
	<p>Nível 5 - Otimizado Descrição: Processo de gestão de incidentes de segurança de TI integrado e em constante evolução. Características <ul style="list-style-type: none"> • Gerenciamento de incidentes de segurança de TI como parte integrante da cultura organizacional. • Resposta proativa a incidentes de segurança de TI. • Melhoria contínua com base em lições aprendidas. • Aprendizado contínuo e adaptação às ameaças em evolução. </p>

Índice de capacidade do processo de gestão de vulnerabilidades.	<p>Manter o nível 3 em 2024, atingir o nível 4 em 2025 e manter o nível 4 em 2026.</p> <p>Glossário</p> <p>Nível 1 - Inicial Descrição: Processo de gestão de vulnerabilidades inexistente ou incipiente. Características</p> <ul style="list-style-type: none">• Não há processo para identificar e tratar vulnerabilidades. <p>Nível 2 - Gerenciado: Descrição: Processo de gestão de vulnerabilidades executado. Características:</p> <ul style="list-style-type: none">• Processo informal para identificar e avaliar vulnerabilidades.• Tratamento de vulnerabilidades identificadas.• Equipe de gestão de vulnerabilidades designada.• Equipe de segurança de TI capacitada. <p>Nível 3 - Estabelecido Descrição: Processo de gestão de vulnerabilidades definido e seguido. Características:</p> <ul style="list-style-type: none">• Processo formal para identificar e avaliar vulnerabilidades.• Monitoramento contínuo de vulnerabilidades.• Varredura periódica automatizada para identificação de vulnerabilidades.• Avaliação de riscos para priorização.• Plano formal de tratamento de vulnerabilidades.• Correções regulares e planejadas.• Equipe de gestão de vulnerabilidades designada formalmente e atualizada.• Equipe de segurança de TI capacitada formalmente. <p>Nível 4 - Gerenciado quantitativamente Descrição: Processo de gestão de vulnerabilidades otimizado e mensurado. Características</p> <ul style="list-style-type: none">• Métricas e indicadores de desempenho coletados e analisados.• Monitoramento contínuo e constante.• Resposta imediata para as vulnerabilidades analisadas. <p>Nível 5 - Otimizado Descrição: Processo de gestão de vulnerabilidades integrado e em constante evolução. Características</p> <ul style="list-style-type: none">• Gestão de vulnerabilidades como parte integrante da cultura organizacional.• Melhoria contínua com base em resultados e lições aprendidas.• Aprendizado contínuo e adaptação às ameaças em evolução.
---	--

6.2.1.2 OBJETIVO: PROMOVER A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL PARA APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CJF

Tabela 19 Indicadores e metas do objetivo estratégico “Promover a transformação digital para aprimoramento dos serviços prestados pelo CJF”

INDICADOR	META
Taxa de satisfação dos usuários.	Manter, até 2026, 90% de satisfação dos usuários com os serviços de TI

6.2.2 MACRODESAFIO: APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA**6.2.2.1 PROMOVER A MELHORIA DA GOVERNANÇA NO CJF**

Tabela 20 Indicador e meta do objetivo estratégico “Promover a melhoria da governança no CJF”

INDICADOR	META
Índice iGovTIC-JUD	Manter-se no nível “aprimorado” nas avaliações de governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

7 INVENTÁRIO DE NECESSIDADES PRIORIZADAS – 2024-2026

O levantamento de necessidades de TI foi consolidado por intermédio de consulta às unidades do CJF para informar as necessidades de soluções e de serviços de Tecnologia da Informação que potencialmente integrariam as ações do PDTI. O levantamento contemplou a indicação, pelas unidades demandantes, da priorização segundo o modelo GUT, descrito na seção 2.3.4 Atividade: levantamento de necessidades de TI.

Posteriormente, na fase de planejamento, as necessidades informadas pelas unidades foram priorizadas pelas instâncias de governança, consoante o modelo apresentado na seção 2.3.5 Atividade: priorização de necessidades de TI, ocasião em que foi definida a sua prioridade geral.

A relação completa encontra-se no Anexo IV - Inventário de necessidades priorizadas de Tecnologia da Informação do CJF 2024-2026 deste documento. Ao todo foram relacionadas 118 necessidades oriundas das seguintes unidades administrativas:

- ✓ Secretaria de Gestão de Obras – SGO;
- ✓ Secretaria de Estratégia e Governança – SEG;
- ✓ Secretaria de Tecnologia da Informação – STI;
- ✓ Secretaria do Centro de Estudos Judiciários – SCE;
- ✓ Secretaria de Gestão de Pessoas – SGP;
- ✓ Secretaria de Administração – SAD;
- ✓ Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça Federal – SCG;
- ✓ Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças – SPO;
- ✓ Secretaria da Turma Nacional de Uniformização – STU;
- ✓ Assessoria de Comunicação Social – ASCOM;
- ✓ Centro de Cooperação Jurídica Internacional – CECINT;
- ✓ Centro de Gestão Documental – CEGDOC; e
- ✓ Centro de Revisão de Documentos e Publicações – CERREVI.

8 PLANOS

8.1 PLANO DE INICIATIVAS

Como resultado da fase de diagnóstico, por meio da priorização de necessidades com base nas diretrizes traçadas no Plano Estratégico de Tecnologia da Justiça Federal – PETI/JF 2021-2023 e Plano Estratégico do Conselho da Justiça Federal – PE/CJF 2021-2026, foi elaborado o Plano de iniciativas para composição do PDTI 2024-2026, apresentando no Anexo IV – Plano de iniciativas – PDTI 2024-2026.

Nele estão descritas 21 iniciativas para aperfeiçoamento de serviços, procedimentos, metodologia, governança, processos, segurança e infraestrutura de TI. Devido à complexidade, esse plano foi detalhado em outros: plano de contratações de soluções de TI e plano anual de capacitação.

Nesta seção, será descrita a demanda por pessoal da STI/CJF para consecução de objetivos definidos para o período de 2024 a 2026.

8.2 PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE TI – 2024-2026

As contratações a serem realizadas no período de abrangência deste PDTI, entre 2024-2026, estão priorizadas no plano de contratações de soluções de TI, elaborado segundo as diretrizes definidas na Resolução CNJ n. 468/2022, com aprovação das instâncias de governança de TI do CJF.

Nele estão definidas a realização de novas contratações e a renovação de contratações vigentes. Está disposto no Anexo VI – Plano de contratações de TI (novas e continuadas) – PDTI 2024-2026.

8.3 PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2024-2026

As demandas por ações de treinamento e desenvolvimento das pessoas alocadas na área de Tecnologia da Informação estão descritas no Plano Anual de Capacitação – PAC da STI/CJF. O objetivo é melhorar as competências já alocadas e desenvolver as que precisam ser agregadas para aperfeiçoar a entrega de valor proveniente de servidores disponibilizados pela STI.

O plano de capacitação desta STI está disposto no Anexo VII – plano de capacitação de Tecnologia da Informação – PDTI 2024-2026. E ao longo do desenvolvimento do plano diretor outras necessidades serão acrescidas.

8.4 DEMANDA DE PESSOAL DA STI/CJF PARA 2024-2026

Uma das vulnerabilidades mais apontadas no levantamento realizado por meio da análise SWOT é a demanda por pessoal da área de TI, a qual se mostra como uma das principais preocupações quanto à gestão de risco e à continuidade do negócio.

Conforme analisado, há evasão de profissionais de TI do CJF para outros órgãos. Para mitigar os riscos envolvendo pessoas, houve o levantamento da quantidade de pessoal necessário para o desempenho de todas as atribuições da STI – Anexo VIII – Demanda de pessoal STI/CJF – PDTI 2024-2026, que apontou existir uma demanda pela lotação de 108 servidores na TI do CJF. Essa demanda se faz necessária para que não somente serviços sustentados pela infraestrutura tecnológica do CJF sejam mantidos disponíveis e operantes, mas também para que eles possam ser aperfeiçoados e geridos de maneira eficiente.

9 ACOMPANHAMENTO DO PDTI

O ciclo do Plano Diretor de TI envolve ações de acompanhamento de execução, sendo importante para manter a validade do plano como instrumento de antecipação de cenários e de mitigação de riscos e para viabilizar o atingimento dos objetivos propostos em diversos planejamentos da instituição, como o PE-CJF e o PETI-JF.

Com essa finalidade de acompanhamento, apresenta-se, a seguir, um cronograma de pontos de controle a serem empregados para o monitoramento do plano diretor.

Tabela 21 Pontos de controle do PDTI

ASSUNTO	PERIODICIDADE	RESPONSÁVEL
Avaliação e acompanhamento da execução do PDTI	Trimestral	SUGOV
Acompanhamento dos processos de aquisição de bens e serviços de TI / plano de contratações	Trimestral	SUGOV
Revisão do PDTI - Apresentação de oportunidades, novas necessidades, riscos ou problemas para tomada de decisão.	Sob demanda	SUGOV
Reuniões de análise da estratégia e do PDTI com o CGovTI.	Semestral	SUGOV
Fechamento do PDTI do ano e preparação para a revisão do próximo período.	Anual	SUGOV

9.1 INDICADORES E METAS PARA MONITORAMENTO DO PDTI

Apresenta-se, a seguir, cronograma de acompanhamento das ações do PDTI, com o objetivo de realizar o monitoramento e a avaliação da execução do planejamento e de verificar a necessidade de inclusão de novas demandas.

Tabela 22 Indicadores de monitoramento do PDTI

NOME	FORMA DE CÁLCULO	PERIODICIDADE	META ANUAL
Execução do inventário de necessidades do PDTI	Necessidades concluídas no ano / Total de necessidades planejadas para conclusão no ano apurado* 100	Trimestral	80%
Execução do plano de iniciativas do PDTI	Iniciativas concluídas no ano / Total de iniciativas planejadas para conclusão no ano apurado* 100	Trimestral	80%
Execução do plano de contratações	Projetos de contratação (planejamento da contratação) concluídos no exercício / Total de contratações planejadas para o exercício* 100	Trimestral	80%
Orçamento empenhado	Orçamento empenhado no exercício / Total do orçamento planejado para o exercício* 100	Trimestral	90%
Orçamento liquidado	Orçamento liquidado no exercício / Total do orçamento planejado para o exercício* 100.	Trimestral	80%
Execução do plano de capacitação	Treinamentos realizados no exercício / Total de treinamentos planejados para o exercício* 100	Trimestral	60%

10 FATORES CRÍTICOS

Para que este plano diretor seja efetivo, ou seja, alcance os objetivos estabelecidos com eficiência e, assim, desempenhe a função de aperfeiçoamento dos processos de governança do CJF, alguns fatores críticos de sucesso serão identificados a seguir.

- ✓ Participação ativa do Comitê de Gestão de TI – CGTI.
- ✓ Participação ativa do Comitê de Governança de TI – CGovTI.
- ✓ Realização de revisões periódicas do PDTI para contemplar mudanças na estrutura organizacional ou nas diretrizes estratégicas, conforme previsto no cronograma de pontos de controle.
- ✓ Monitoramento e avaliação contínua dos planos estabelecidos neste PDTI.
- ✓ Comprometimento de participação ativa das áreas de negócio nas ações previstas no PDTI.
- ✓ Disponibilidade e alocação adequada de recursos orçamentários e de pessoas.
- ✓ Envolvimento e apoio da alta administração deste Conselho (Presidência e Secretaria-Geral) para consecução das ações planejadas.

A participação do CGTI é fundamental para a articulação das ações das subsecretarias da STI e para nortear a equipe para fazer frente às necessidades e alcançar os objetivos estabelecidos neste plano diretor. Reuniões do CGTI, em que o CJF é representado pelos Secretário de TI e do Subsecretário de Governança de TI, cumprem ainda o papel de palco para a identificação de necessidades e riscos anteriormente não identificados.

11 GESTÃO DE RISCOS

Em um contexto corporativo, os riscos surgem das incertezas dos diversos cenários, seja no campo econômico, político ou social e podem se apresentar como ameaças ou oportunidades na medida em que dificultam ou facilitam o alcance dos objetivos organizacionais.

Segundo a norma ABNT ISO 31000:2018 [DR13], o processo de gestão de riscos envolve a aplicação sistemática de políticas, procedimentos e práticas para as seguintes atividades: definição do contexto dos riscos; identificação, análise e avaliação dos riscos; tratamento e resposta aos riscos; e monitoramento e análise crítica dos riscos.

Na mesma esteira, o Guia de Gestão de Riscos do CJF [DR14] detalha as etapas supracitadas:

- **Definição do contexto dos riscos:** consiste na caracterização da circunstância, ambiente ou cenário no qual aparecem e se desenvolvem os eventos de risco, sendo a matriz SWOT a ferramenta mais utilizada para a análise de ambiente.
- **Identificação dos riscos:** com base no contexto estabelecido, é necessário encontrar, reconhecer e descrever riscos que possam ajudar ou impedir o alcance dos objetivos organizacionais. Nesta etapa, devem ser listados os eventos que representam risco, bem como suas respectivas causas e consequências.
- **Análise e avaliação dos riscos:** em seguida, é necessário compreender a natureza do risco e suas características. Dentre as observâncias feitas nesta etapa, destacam-se a probabilidade de o evento ocorrer e a magnitude das consequências advindas. Esta etapa tem o propósito de apoiar as decisões que serão tomadas com relação ao tratamento e a resposta ao risco descrito.
- **Tratamento e resposta aos riscos:** consiste na escolha de uma ou mais alternativas para modificar o nível de cada risco, assim como o estabelecimento de medidas de controle/tratamento para mitigá-los.
- **Monitoramento e análise crítica dos riscos:** trata-se de um processo contínuo de observação crítica, verificação e identificação de situações que podem trazer mudanças, no qual é feito o acompanhamento regular do contexto que o risco está inserido.

Assim, fazendo uma análise combinada dos fatores levantados na análise SWOT e as categorias de risco de TI estabelecidos pelo framework COBIT 2019, foram estabelecidos os níveis de riscos dos processos de trabalho da Secretaria de Tecnologia da Informação do CJF.

Nem todas as dezenove categorias de risco estabelecidas pelo COBIT 2019 foram utilizadas. Dentre as categorias ligadas aos processos de trabalho da STI, as que apresentam riscos muito altos são:

- Riscos de ataques lógicos (hacking, malwares etc.).
- Riscos de incidentes operacionais de infraestrutura.
- Riscos de arquitetura corporativa de TI.
- Riscos de ações não autorizadas.

Com riscos altos foram identificadas as seguintes:

- Riscos de falhas de software.
- Riscos de experiência, habilidades e comportamento de TI, os quais estão ligados à perda de oportunidade de negócio e de

aperfeiçoamento de processos.

Com nível médio estão:

- Riscos de incidentes de hardware.
- Riscos de gerenciamento de dados e informações.

E com nível baixo:

- Riscos relativos a investimentos de TI.
- Riscos de adoção de software/problemas de uso.

Para fazer frente a tais riscos, foram estabelecidas iniciativas e, ligadas a elas, as necessidades a serem supridas com a execução de ações das várias unidades da STI. Com o mesmo objetivo de mitigar riscos foram estabelecidas a demanda de pessoal e a necessidade de capacitação. Todas essas análises e demandas foram realizadas tendo como base temporal o período de 2024 a 2026.

Muitos dos riscos descritos necessitam, para seu tratamento, a realização de contratações, consequentemente, o risco orçamentário está presente, bem como os riscos associados ao ciclo de vida das contratações, o qual envolve as fases de planejamento, de seleção do fornecedor e de execução contratual.

Os processos de trabalho foram definidos tendo como base a cadeia de valor, o modelo de negócios e a arquitetura de processos de 1º e 2º níveis do Conselho da Justiça Federal [DR15] para a área de Tecnologia da Informação, no qual está definido como processo de 1º nível “Gerir política de Tecnologia da Informação” e, como processos de 2º nível:

- Propor políticas e diretrizes de governança de TI.
- Auxiliar na definição da estratégia de governança da informação.
- Definir diretrizes metodológicas para o desenvolvimento de sistemas de informação.
- Propor a adoção de soluções nacionais de infraestrutura computacional e de software.
- Coordenar as atividades da Autoridade Certificadora da Justiça AC-Jus.

Além desses, também estão elencados para gerenciamento dos riscos, neste PDTI, processos de trabalho de terceiro nível.

11.1 RELAÇÃO DE RISCOS DO PDTI

A seguir, serão apresentados os riscos identificados durante a elaboração do documento, os quais podem impactar positivamente ou negativamente o alcance dos resultados esperados.

A identificação, análise, avaliação e tratamento foram concebidos sob a perspectiva da STI, motivo pelo qual, em algumas ocasiões, consta como estratégia de resposta ao risco a transferência para outras unidades ou instâncias do CJF.

Na análise realizada a partir das necessidades levantadas durante a fase de Diagnóstico foram identificados diversos riscos, os quais estão dispostos em categorias e foram analisados e avaliados segundo o Guia de Gestão de Riscos do CJF.

11.1.1 RISCOS ORGANIZACIONAIS

Os riscos organizacionais dizem respeito às estratégias e às prioridades estabelecidas pela alta gestão do CJF, as quais podem incluir restrições orçamentárias para a execução do planejamento no período ou até mesmo mudanças na priorização de demandas, tendo em vista a troca de gestão que o órgão passará no ano de 2024.

Tabela 23 Risco PDTI n.1

ID:	1	
1. CAUSAS	1.1	Restrição orçamentária.
2. EVENTOS	2.1	Interrupção ou precarização de serviços atualmente fornecidos pela STI.
	2.2	Inexecução de necessidades priorizadas no PDTI.
3. CONSEQUÊNCIAS	3.1	Comprometimento do alcance dos resultados esperados do PDTI.
	3.2	Não disponibilidade de determinados serviços de TI.
4. PROCESSOS RELACIONADOS	4.1	Fortalecer a estratégia de TIC e de proteção de dados.
	4.2	Promover a transformação digital para o aprimoramento dos serviços prestados pelo CJF.
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO		
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO
(Muito baixa - 1) IMPROVÁVEL	(Alto - 4) SIGNIFICATIVO	BAIXO (4)
RESPOSTA E TRATAMENTO AO RISCO		
RESPOSTA		RESPONSÁVEL
ACEITAR ou TRANSFERIR		Secretaria-Geral
TRATAMENTO		

Caso a restrição orçamentária aconteça no âmbito federal, por determinação da União, cabe ao CJF aceitar e buscar soluções de contorno.
Caso a restrição orçamentária seja no âmbito do CJF, deve-se transferir a ação para a Secretaria-Geral, de forma que ela possa reavaliar as necessidades a serem impactadas e priorizar, se for o caso.

Tabela 24 Risco PDTI n. 2

ID.:	2	
CAUSAS	1.1	Ausência de avaliação ou de priorização das necessidades pelo CGovTI.
EVENTOS	2.1	Interrupção ou precarização de serviços atualmente fornecidos pela STI.
	2.2	Inexecução de necessidades priorizadas no PDTI.
CONSEQUÊNCIAS	3.1	Comprometimento do alcance dos resultados esperados do PDTI.
	3.2	Indisponibilidade de determinados serviços de TI.
PROCESSOS RELACIONADOS	4.1	Fortalecer a estratégia de TIC e de proteção de dados.
	4.2	Promover a transformação digital para o aprimoramento dos serviços prestados pelo CJF.
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO		
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO
(Baixa - 2) RARA	(Alto - 4) SIGNIFICATIVO	MÉDIO (8)
RESPOSTA E TRATAMENTO AO RISCO		
RESPOSTA	RESPONSÁVEL	
TRANSFERIR	Comitê de Governança de TI - CGovTI	
TRATAMENTO		
Não se aplica.		

11.1.2 RISCOS GERENCIAIS

Os riscos gerenciais podem decorrer do planejamento das ações e das iniciativas, do cronograma de execução dos projetos, estimativas imprecisas, recursos humanos etc. Nesta categoria, foram identificados riscos decorrentes de deficiência no levantamento das necessidades do órgão, de avaliações imprecisas quanto à priorização pela matriz GUT e, ainda, o risco de recursos humanos que, devido à defasagem do número de servidores de TI, pode ocasionar sobrecarga de demandas e atraso na execução do planejamento.

Tabela 25 Risco PDTI n. 3

ID.:	3	
CAUSAS	1.1	Falha de comunicação com as áreas demandantes de serviços de TI.
	1.2	Avaliação equivocada das necessidades segundo a matriz GUT.
EVENTOS	2.1	Inexecução de necessidades que requerem maior prioridade.
	2.2	Atraso na execução de ações e iniciativas previstas.
CONSEQUÊNCIAS	3.1	Comprometimento do alcance dos resultados esperados do PDTI.
	3.2	Interrupção na prestação de serviços de TI.
PROCESSOS RELACIONADOS	4.1	Coordenar a elaboração e realizar o acompanhamento do PDTI do CJF.
	4.2	---
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO		
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO
(Alta - 3) PROVÁVEL	(Baixo - 2) PEQUENO	BAIXO (6)
RESPOSTA E TRATAMENTO AO RISCO		
RESPOSTA	RESPONSÁVEL	
MITIGAR	SUGOV	
TRATAMENTO		

A SUGOV realizará avaliação dos campos relativos à matriz GUT para garantir coerência entre os valores apresentados e a real prioridade de determinada necessidade;
Submeter as necessidades com os respectivos campos da matriz GUT para avaliação complementar do CGovTI.

Tabela 26 Risco PDTI n. 4

ID.	04	
CAUSAS	1.1	Equipe da STI sobrecarregada com as atividades operacionais e o excesso de demandas provenientes do PDTI.
EVENTOS:	2.1	Ações e iniciativas com menor prioridade não são iniciadas.
	2.2	Ações e iniciativas são executadas com atraso.
CONSEQUÊNCIAS:	3.1	Comprometimento do alcance dos resultados esperados do PDTI.
	3.2	---
PROCESSOS RELACIONADOS:	4.1	Coordenar e apoiar as contratações de STIC do CJF.
	4.2	---

ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO

PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO
(Muito alta - 5) PRATICAMENTE CERTA	(Médio - 3) MODERADO	ALTO (15)

RESPOSTA E TRATAMENTO AO RISCO

RESPOSTA	RESPONSÁVEL
TRANSFERIR e MITIGAR	CGovTI e STI

TRATAMENTO

Caso esse cenário aconteça, o CGovTI deverá ser acionado para estabelecer as ações prioritárias contidas neste PDTI, ao passo que a STI trabalha para mitigar os impactos decorrentes das dificuldades encontradas.

11.1.3 RISCOS TÉCNICOS

A categoria de riscos técnicos é a mais abrangente deste planejamento, pois engloba diversas faces do escopo aqui tratado. Assim, os riscos desta categoria foram elencados segundo a classificação do framework COBIT 2019.

Inicialmente, identificou-se o risco de ataques lógicos, os quais vão desde ataques provenientes da Internet como também da contaminação por vírus e malwares.

Tabela 27 Risco PDTI n. 5

ID.:	5	
CAUSAS	1.1	Não contratação de serviços essenciais relacionados à segurança da informação.
	1.2	Não migração de sistemas legados para novas tecnologias.
EVENTOS	2.1	Falha no fornecimento de serviços de rede.
	2.2	Falha de segurança em sistemas legados.
CONSEQUÊNCIAS	3.1	Indisponibilidade de serviços de rede.
	3.2	Indisponibilidade de sistemas sustentados pela infraestrutura tecnológica do CJF.
	3.3	Vazamento ou perda de dados sensíveis decorrente de ataques cibernético.
PROCESSOS RELACIONADOS	4.1	Auxiliar na definição da estratégia de governança de segurança da informação (2º nível).
	4.2	Contratar solução em Tecnologia da Informação.
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO		
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO
(Alta - 4) PROVÁVEL	(Muito alto - 5) CATASTRÓFICO	MUITO ALTO (20)
RESPOSTA E TRATAMENTO AO RISCO		
Resposta	Responsável	
MITIGAR	STI	
TRATAMENTO		
Priorizar as contratações descritas nas necessidades NEC-2024-38, NEC-2024-39, NEC-2024-40, NEC-2024-41, NEC-2024-46, NEC-2024-68 e NEC-2024-70.		

Ainda, relacionado à segurança da informação, identificou-se o risco de incidentes de infraestrutura e operações.

Tabela 28 Risco PDTI n. 6

ID.:	6	
CAUSAS	1.1	Atraso na contratação de serviços essenciais para as operações de infraestrutura.
	1.2	Falta de plano operacional.
	1.3	Planejamento inadequado das contratações de soluções de TIC.
EVENTOS	2.1	Falha no fornecimento de serviços de rede.
	2.2	Falha de segurança em sistemas legados.
	2.3	Atraso nos processos de contratação.
	2.4	Aquisição de solução de TIC inadequada ou incompleta.
CONSEQUÊNCIAS	3.1	Indisponibilidade de serviços de rede.
	3.2	Indisponibilidade de sistemas sustentados pela infraestrutura tecnológica do CJF.
	3.3	Alto custo de manutenção das operações.
	3.4	Baixa utilização dos recursos de nuvem.
	3.5	Perda de oportunidade de melhoria do processo.
PROCESSOS RELACIONADOS	4.1	Propor a adoção de soluções nacionais de infraestrutura computacional e de software (2º nível)
	4.2	Contratar solução em Tecnologia da Informação.
	4.3	Contratar suporte técnico a equipamentos de Tecnologia da Informação.
	4.4	Subscrever licenças de software de prateleira.
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO		
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO
(Alta - 4) PROVÁVEL	(Muito alto - 5) CATASTRÓFICO	MUITO ALTO (20)

RESPOSTA E TRATAMENTO AO RISCO	
RESPOSTA	RESPONSÁVEL
MITIGAR	STI

TRATAMENTO

Priorizar as necessidades relativas à SUTEC, SUSTI e DIDIA, bem como recompor o quadro de servidores da STI.

Também foi identificado o risco de ações não autorizadas, o qual também é uma ameaça à segurança informação.

Tabela 29 Risco PDTI n. 7

ID.:	7	
CAUSAS	1.1	Ausência de certificação digital.
	1.2	Atraso nos processos de contratação.
	1.3	Vulnerabilidade de sistemas de Tecnologia da Informação.
EVENTOS	2.1	Falha no fornecimento dos serviços terceirizados.
CONSEQUÊNCIAS	3.1	Autoridade certificadora inoperante.
	3.2	Não atendimento dos usuários.
PROCESSOS RELACIONADOS	4.1	Coordenar as atividades da Autoridade Certificadora da Justiça AC-Jus (2º nível).

ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO

PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO
(Média - 3) POSSÍVEL	(Muito alto - 5) CATASTRÓFICO	ALTO (15)

RESPOSTA E TRATAMENTO AO RISCO

RESPOSTA	RESPONSÁVEL
MITIGAR	STI
TRATAMENTO	
Priorizar as necessidades NEC-2024-012, NEC-2024-013 e NEC-2024-014.	

Prosseguindo, identificou-se o risco de falhas de software, o qual decorre do cenário onde as demandas para desenvolvimento ou manutenção de sistemas legados ficam prejudicadas.

Tabela 30 Risco PDTI n. 8

ID.:	8	
CAUSAS	1.1	Baixo número de colaboradores para execução das atividades.
	1.2	Falta de plano operacional.
EVENTOS	2.1	Não atendimento de demandas de desenvolvimento ou manutenção de software formalizadas por meio de TSS.
	2.3	Falha de disponibilidade de sistemas.
CONSEQUÊNCIAS	3.1	Não atendimento dos usuários de serviços de TI.
	3.2	Experiência ruim na interação de usuários com sistemas.
PROCESSOS RELACIONADOS	4.1	Definir diretrizes metodológicas para o desenvolvimento de sistemas de informação (2º nível)
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO		
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO
(Alta - 4) PROVÁVEL	(Alto - 4) SIGNIFICATIVO	ALTO (16)

RESPOSTA E TRATAMENTO AO RISCO	
RESPOSTA	RESPONSÁVEL
MITIGAR	STI
TRATAMENTO	
Recompor o quadro de servidores da STI para que sejam implementadas metodologias de desenvolvimento de software com integração contínua (CI) e entregas contínuas (CD), sem esquecer a preparação da infraestrutura disponível para abarcar essas atividades.	

Outro risco é o risco de experiência, habilidades e comportamento, aqui atrelado às ações de governança e gestão de TI e avaliado conforme disposta na tabela a seguir:

Tabela 31 Risco PDTI n. 9

ID:	9	
CAUSAS	1.1	Defasagem do quadro de servidores da STI.
	1.2	Falta de planejamento operacional.
	1.3	Escassez de informações e ausência de Base de Conhecimento unificada.
	1.4	Falta de mapeamento de processos.
	1.5	Baixa capacitação dos colaboradores.
	1.6	Não acompanhamento do processo de inovação contínua de TI.

EVENTOS	2.1	Falhas em controles e processos.
	2.2	Falha nas ações de governança de TI.
	2.3	Falha de gestão.
	2.4	Equívocos na tomada de decisão.
	2.5	Não atendimento das demandas das áreas negociais.
CONSEQUÊNCIAS	3.1	Aumento do custo dos processos.
	3.2	Processos mal executados.
	3.3	Qualidade na prestação de serviços aquém do esperado pelos usuários finais.
	3.4	Perda de eficiência.
	3.5	Baixa qualidade de processos.
	3.6	Baixa capacidade de inovação.
	3.7	Não absorção de novos processos.
PROCESSOS RELACIONADOS	4.1	Propor políticas e diretrizes de governança de TI (2º Nível)
	4.2	Efetivar contratações relacionadas à capacitação em TI.
	4.3	Contratar consultoria em Tecnologia da Informação.

ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO

PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO
(Média - 3) POSSÍVEL	(Alto - 4) SIGNIFICATIVO	ALTO (12)

RESPOSTA E TRATAMENTO AO RISCO

RESPOSTA	RESPONSÁVEL
MITIGAR	STI

TRATAMENTO

Mapear e descrever todos os processos da STI com vistas à padronização e a identificação de melhorias possíveis, além de instituir formalmente metodologias de gerenciamento de processos e serviços.

A seguir, avalia-se o risco de incidentes de hardware:

Tabela 32 Risco PDTI n. 10

ID.: 10		
CAUSAS	1.1	Equipamentos obsoletos.
	1.2	Quebra de equipamentos.
EVENTOS:	2.1	Falha em equipamentos.
	2.2	Falta de equipamentos de TI.
	2.3	Utilização de equipamentos de TI inadequados para finalidade.
CONSEQUÊNCIAS:	3.1	Atraso em processos de trabalho.
	3.2	Aumento da demanda por manutenção corretiva.
	3.3	Aumento do custo de operações.
PROCESSOS RELACIONADOS:	4.1	Adquirir itens de Tecnologia da Informação.
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO		
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO
(Baixa - 2) RARA	(Alto - 4) SIGNIFICATIVO	MÉDIO (8)
RESPOSTA E TRATAMENTO AO RISCO		
RESPOSTA	RESPONSÁVEL	

MITIGAR	STI
---------	-----

TRATAMENTO

Atentar e priorizar a renovação do parque tecnológico do CJF, incluindo a infraestrutura de data center e equipamentos de microinformática, além de manter vigentes os contratos que dão suporte técnico e garantia a esses equipamentos.

Em decorrência do rápido avanço de tecnologias baseadas em inteligência artificial para o tratamento de dados, é imprescindível que o CJF se adeque a essa mudança de paradigma. Com isso, identificou-se o risco de gerenciamento de dados e informações.

Tabela 33 Risco PDTI n. 11

ID.:	11	
CAUSAS	1.1	Falta de processos específicos para gestão de dados e IA.
	1.2	Falta de soluções de gestão de dados e IA.
	1.3	Falta de formação apropriada para utilização de ferramentas.
EVENTOS	2.1	Perda de dados.
	2.2	Falhas em informações.
	2.3	Uso inadequado de soluções para gestão de dados e IA.
CONSEQUÊNCIAS	3.1	Perda de oportunidades de melhoria da eficiência de processos.
	3.2	Descumprimento de normas de proteção de dados.
PROCESSOS RELACIONADOS	4.1	Adquirir solução de gestão de dados e Inteligência Artificial.
	4.2	Contratar solução de gestão de dados e Inteligência Artificial.
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO		
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO
(Média - 3) POSSÍVEL	(Médio - 3) MODERADO	MÉDIO (9)

RESPOSTA E TRATAMENTO AO RISCO	
RESPOSTA	RESPONSÁVEL
MITIGAR	STI

TRATAMENTO

Priorizar a capacitação dos servidores da DIDIA para o uso de ferramentas de IA e definir ou atualizar as políticas de tratamentos de dados do CJF abrangendo também o uso dessas ferramentas de forma institucionalizada.

Por fim, identificou-se o risco de adoção de software e de problemas de uso, relacionado.

Tabela 34 Risco PDTI n. 12

ID:	12	
CAUSAS	1.1	Falta de planejamento da contratação.
	1.2	Falta de definição de requisitos.
	1.3	Atraso no processo de contratação.
EVENTOS	2.1	Atraso no processo de contratação.
	2.2	Previsão orçamentária insuficiente.
	2.3	Não realização da aquisição.
CONSEQUÊNCIAS	3.1	Não contratação das soluções desejadas.
	3.2	Descontinuidade temporária dos serviços.
PROCESSOS RELACIONADOS	4.1	Contratar assinatura solução de Tecnologia da Informação para acesso a base de informações.

ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO

PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO
(Baixa - 2) RARA	(Baixo - 2) PEQUENO	BAIXO (4)

RESPOSTA E TRATAMENTO AO RISCO	
RESPOSTA	RESPONSÁVEL
MITIGAR	STI
TRATAMENTO	
Adoção de software público alternativo. Desenvolvimento de software por servidores do quadro.	

12 CONCLUSÃO

Este PDTI/CJF 2024-2026 prevê o desenvolvimento de ações de inovação e melhoria contínua da prestação de serviço pela Justiça Federal, com fundamento nas determinações prescritas nos normativos que regulamentam, para área de Tecnologia da Informação, o Centro de Desenvolvimento Colaborativo do CJF e da Justiça Federal de 1º e 2º graus (Resolução CJF n. 632, de 21 de maio de 2020); o Comitê de Segurança da Informação da Justiça Federal (Resolução CJF n. 687/2020, de 15 de dezembro de 2020); a Comissão Técnica da Autoridade Certificadora da Justiça Federal – AC-Jus (Resolução Conjunta n. 004/2019); e a governança, gestão e operação da Nuvem da Justiça Federal – NUJUFÉ e os serviços internos caros a unidade de Tecnologia da Informação do CJF.

Planeja-se, portanto, realizar, ao longo dos próximos três anos, consecução de contratações, desenvolvimento e sustentação de software, procedimentos de gestão de dados, de segurança da informação e de manutenção da infraestrutura, em atividades compartilhadas com outros órgãos da Justiça Federal de 1º e 2º graus, para efetivar as entregas aqui previstas, com objetivo de prestar os melhores serviços ao público interno e externo.

13 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Durante a preparação do PDTI foram reunidos os documentos de referência e de apoio elencados na tabela abaixo, utilizados como fonte de informação, de normas e regulamentos, de modelos e de boas práticas para a elaboração deste instrumento de planejamento de TI.

Tabela 35 Documentos de referência

ID	Documento	Descrição
DR01	Guia de PDTIC do SISP, versão 2.1	Modelo de referência a partir do qual foi concebido o processo de elaboração do PDTI 2024-2026.
DR02	Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI 2021-2023 - CJF.	Contém as iniciativas prioritizadas referentes ao PDTI anterior de modo a permitir a avaliação das ações planejadas e concluídas, bem como dos resultados efetivamente alcançados.
DR03	Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026.	Resolução CNJ n. 325, de 30 de junho de 2020. Dispõe sobre a Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026 e dá outras providências.
DR04	Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD).	Resolução do CNJ n. 370, de 28 de janeiro de 2021. Dispõe sobre a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD).
DR05	Planejamento Estratégico de TI da Justiça Federal - PETI 2021-2026.	Resolução CJF n. 685, de 15 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação da Justiça Federal, período 2021-2026.
DR06	Centro Tecnológico de Desenvolvimento Colaborativo.	Resolução CJF n. 781, de 8 de agosto de 2022, que dispõe sobre a criação, o funcionamento e a organização do Centro Tecnológico de Desenvolvimento Colaborativo e a política de concepção, sustentação e gestão dos sistemas corporativos nacionais no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de 1º e 2º graus
DR07	Estratégia da Justiça Federal 2021-2026.	Resolução CJF n. 668, de 9 de novembro de 2020, que dispõe sobre a Estratégia da Justiça Federal 2021-2026.
DR08	Estratégia do Conselho da Justiça Federal para o período de 2021 a 2026.	Portaria CJF n. 576, de 24 de novembro de 2020, que dispõe sobre a Estratégia do Conselho da Justiça Federal para o período de 2021 a 2026.
DR09	Instituição do Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação (CGTI) no âmbito do Conselho da Justiça Federal	Portaria CJF n. 294, de 20 de maio de 2024, que dispõe sobre a instituição do Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação (CGTI) no âmbito do Conselho da Justiça Federal.
DR10	Instituição do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação (CGovTI) no âmbito do Conselho da Justiça Federal.	Portaria CJF n. 537, de 4 de novembro de 2020, que dispõe sobre a instituição do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação (CGovTI) no âmbito do Conselho da Justiça Federal.

DR11	Estrutura Orgânica do Conselho da Justiça Federal.	Portaria CJF n. 857, de 23 de novembro 2023, que versa sobre a alteração da estrutura orgânica do CJF.
DR12	Organização do Sistema de Tecnologia da Informação da Justiça Federal (SIJUS).	Resolução do CJF n. 743, de 14 de dezembro 2021, que dispõe sobre a organização do Sistema de Tecnologia da Informação da Justiça Federal.
DR13	Norma ABNT ISO 31000 - "Gestão de riscos - Diretrizes".	2. ed., de 28 de março de 2018.
DR14	Guia de Gestão de Riscos do CJF.	Resolução CJF n. 798, de 24 de outubro de 2022, que institui o Guia de Gestão de Riscos do Conselho e da Justiça Federal de 1º e 2º graus.
DR15	Cadeia de valor, modelo de negócios e arquitetura de processos de 1º e 2º níveis do CJF.	Portaria CJF n. 848, de 19 de dezembro de 2023, que define a cadeia de valor, o modelo de negócios e a arquitetura de processos de 1º e 2º níveis do Conselho da Justiça Federal.

14 HISTÓRICO DE VERSÕES DO PDTI

Tabela 36 Histórico de versões do PDTI 2024-2026

ID	DATA	AUTOR	DESCRIÇÃO
0.1	Junho de 2024	SUGOV	Versão preliminar do PDTI
0.2	Julho de 2024	SUGOV	Versão ajustada considerando alinhamento estratégico apresentado pela SEG
1.0	Agosto de 2024	SUGOV	Versão aprovada pelo CGovTI

ANEXOS

Anexo 1 REVISÃO PDTI 2021-2023 - CAPACITAÇÃO

ID	UNIDADE	CURSOS	STATUS	PERSISTE A NECESSIDADE
PACTI-2021-001	STI	ITIL v4	Concluído	Sim
PACTI-2021-002	STI/ SUSTI	RSA Conference 2022	Cancelado	Não
PACTI-2021-003	STI	Conferência Gartner Infraestrutura de TI, Operações&Estratégias de Cloud	Concluído	Sim
PACTI-2021-004	STI	Formação Oracle DBA 12G - PL/SQL	Cancelado	Não
PACTI-2021-005	STI	Pós-Graduação/Mestrado da Tecnologia na computação em nuvem	Cancelado	Não
PACTI-2021-006	STI	VMworld Conference 2021	Cancelado	Não
PACTI-2021-007	STI	Open Journal Systems - OJS/SEER	Cancelado	Não
PACTI-2021-008	STI	Gartner IT Symposium/Xpo		Não
PACTI-2021-009	STI/ SUSTI	Capacitação Certified Information Security Manager - CISM	Cancelado	Sim
PACTI-2021-010	STI	Capacitação em Inteligência Artificial	Cancelado	Sim
PACTI-2021-011	STI	Gestão de Riscos e Incidentes de Segurança da Informação - Visão Governança	Cancelado	Sim
PACTI-2021-012	STI	Transformação Digital	Cancelado	Sim
PACTI-2021-013	STI	IPv6	Cancelado	Não
PACTI-2021-014	STI	Jboss Enterprise	Cancelado	Não
PACTI-2021-015	STI	Contratação de Soluções de TI	Concluído	Sim

PACTI-2021-016	STI/ SUSTI	Mestrado em Cibersegurança, Segurança dos Sistemas de Informação e das Redes ou em Gestão de Riscos.	Cancelado	Não
PACTI-2021-017	STI	LGPD na Prática	Concluído	Sim
PACTI-2021-018	STI	Análise em Ponto de Função	Concluído	Sim
PACTI-2021-019	STI/ SUSTI	Capacitação CompTIA Security+	Cancelado	Sim
PACTI-2021-020	STI	Kanban	Concluído	Sim
PACTI-2021-021	STI	Programa (Palestras) de Conscientização sobre a importância de prevenir os riscos à segurança das informações corporativas. (Abrangência: todos os servidores e magistrados do CJF)	Concluído	Não
PACTI-2021-022	STI	Programa EAD para proporcionar conhecimentos, princípios, conceitos, recomendações, deveres e habilidades básicas necessárias para os cuidados com a Segurança da Informação. (Abrangência: todos os magistrados e servidores do CJF e JF)	Cancelado	Não
PACTI-2021-023	STI	Gerenciamento Ágil de Projetos de Software com Scrum	Concluído	Sim
PACTI-2021-024	STI	Capacitação em Governança de TI (COBIT 2019)	Concluído	Sim
PACTI-2021-025	STI	Auditando o Processo de Contratações de TI	Concluído	Sim
PACTI-2021-026	STI	Plataforma de ensino à distância	Concluído	Sim
PACTI-2021-027	STI	Gerência de Configurações - Integração contínua, Git, Testes, Qualidade, Gerenciamento de mudanças	Concluído	Sim
PACTI-2021-028	STI	Arquitetura de aplicação em nuvem (container/kubernetes/serverles)	Concluído	Sim
PACTI-2021-029	STI	Arquitetura de micro serviço com SpringBoot e Angular	Concluído	Sim
PACTI-2021-030	STI/ SUSTI	Gestão da Segurança da Informação - NBR 27001 E NBR27002	Cancelado	Sim
PACTI-2021-031	STI/ SUSTI	Gestão de Riscos de TI - NBR 31000 e NBR 27005	Cancelado	Sim

PACTI-2021-032	Fiscais de Contratos	Gestão e Fiscalização de Contratos	Concluído	Sim
PACTI-2021-033	Fiscais de Contratos	Nova Lei de Licitações e Contratos	Concluído	Sim
PACTI-2021-034	STI	eSocial Intermediário	Concluído	Não
PACTI-2021-035	STI	Escrituração Fiscal Digital de Retenções e outras Informações Fiscais - EDF Reinf	Concluído	Não
PAC - 2022 - 05	STI	Acessibilidade Digital na Administração Pública	Cancelado	Sim
PAC - 2022 - 06	STI	Análise Forense Computacional	Cancelado	
PAC - 2022 - 07	STI	Auditoria de Qualidade de Software	Cancelado	Sim
PAC - 2022 - 08	STI	CompTIA Security+	Cancelado	
PAC - 2022 - 09	STI	Ethical Hacking	Concluído	Sim
PAC - 2023 - 01	STI	Certified Chief Information Security Officer - CCISO	Cancelado	Sim
PAC - 2023 - 02	STI	Certified Hacking Forensic Investigator - CHFI	Cancelado	Não
PAC - 2023 - 03	STI	Certified Information Systems Security Professional - CISSP	Concluído	Sim
PAC - 2023 - 04	STI	Comunicação e Negociação - Argumentação	Cancelado	Sim
PAC - 2023 - 05	STI	Gerenciamento e Análise de Dados (Data Science)	Cancelado	Sim
PAC - 2023 - 06	STI	ICITS'23 International Conference on Information Technology & Systems	Cancelado	Sim
PAC - 2023 - 07	STI	Técnicas de Elaboração e Acompanhamento do Plano Diretor de TI, com ênfase na prática	Cancelado	Sim
PAC - 2023 - 08	STI	Aplicando a Lei 14.133/2021 - Planejamento	Concluído	Sim
PAC - 2023 - 09	STI	Aplicando a Lei 14.133/2021 - Seleção do fornecedor	Concluído	Sim
PAC - 2023 - 10	STI	Aplicando a Lei 14.133/2021 - Fiscalização	Concluído	Sim

Anexo 2 REVISÃO PDTI 2021-2023 - CONTRATAÇÕES EFETIVADAS

ANO	ID	N. PROCESSO	N. CONTRATO	DESCRIÇÃO	CONTRATADA
2021	2.2	0005871-10.2019.4.90.8000	014/2020	Prestação de serviços de Suporte - PSS para a Autoridade Certificadora da Justiça - AC-JUS, compreendendo as atividades de hospedagem, manutenção e operacionalização do ambiente seguro da AC e disponibilização de um ponto de publicação de Listas de Certificados Revogados.	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
2021	2.5	0005034-55.2019.4.90.8000	012/2020	Subscrições Microsoft	BRASOFTWARE
2021	2.6	CJF-ADM-2015/0057.02 / 0000723-73.2019.4.90.8000	030/2016	Aquisição de terminal de comunicação FULL HD (1080p) - CODEC (licença/software, instalação, configuração e suporte técnico); monitor LCD ou LED (instalação e suporte técnico), por meio da Ata de Registro de Preços n. 019/2015 - CJF.	SEAL TELECOM E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
2021	2.7	0004312-84.2019.4.90.8000 / 0002004-79.2019.4.90.8000	009/2016	Prestação de serviços de emissão de certificados digitais com dispositivos tokens USB.	SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A
2021	2.12	0000217-10.2019.4.90.8000	004/2019	Manutenção corretiva do equipamento Storage NETAPP FAS-6290.	SERVIX INFORMÁTICA
2021	2.13	0002351-83.2019.4.90.8000	021/2019	Serviço de comunicação de dados entre o CJF e a gráfica.	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
2021	2.14	CJF-ADM-2016/00286.01 / 0000084-46.2019.4.90.8000	023/2017	Contratação de solução de proteção de dados.	DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2021	2.16	0001818-22.2019.4.90.8000 / 0001956-11.2019.4.90.8000	047/2017	Contratação de solução para o gerenciamento de ameaças de segurança, contemplando o fornecimento de equipamentos, softwares e sistemas de gerenciamento da solução, com garantia de 60 meses e serviços de instalação, configuração, transferência de conhecimento.	NCT INFORMÁTICA
2021	2.19	0002067-52.2019.4.90.8000 / 0002263-54.2019.4.90.8000	031/2018	Contratação de solução de segurança para proteção de endpoint e datacenter.	ALLTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
2021	2.20	0001959-14.2020.4.90.8000 / 0003210-49.2020.4.90.8000	016/2020	Prestação de serviços de comunicação de dados para conexão da rede do CJF à internet e de proteção contra-ataques distribuídos de negação de serviço (anti-DDoS) - Lote 1	RD TELECOM

2021		0001959-14.2020.4.90.8000 / 0003212-19.2020.4.90.8000	017/2020	Serviços de comunicação de dados para conexão da rede do Conselho da Justiça Federal à internet e de proteção contra-ataques distribuídos de negação de serviço (anti-DDoS), sob demanda – Lote 2.	NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL
2021	2.24	0002981-28.2020.4.90.8000 / 0003658-44.2020.4.90.8000	021/2020	Prestação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em Tecnologia da Informação, na forma de subscrição.	GARTNER
2021	2.35	0000843-22.2020.4.90.8000 / 0001635-68.2021.4.90.8000	011/2021	Registro de preços de solução de segurança da informação para NUJUFE (solução de firewall para aplicações WEB-WAF), contemplando fornecimento de equipamentos (appliances), licenciamento de software, serviços de instalação e configuração, suporte técnico e garantia para 36 meses conforme especificações e quantidades descritas no Termo de Referência (Módulo I do Edital).	NCT INFORMÁTICA
2021	2.36	0000843-22.2020.4.90.8000/ 0001635-68.2021.4.90.8000	012/2021	Registro de preços de solução de segurança da informação para proteção da NUJUFE (solução de proteção para ambiente de data center virtual), contemplando fornecimento de equipamentos (appliances), licenciamento de software, serviços de instalação e configuração, suporte técnico e garantia para 36 meses conforme especificações e quantidades descritas no Termo de Referência (Módulo I do Edital).	NCT INFORMÁTICA
2021	---	0000843-22.2020.4.90.8000/ 0001635-68.2021.4.90.8000	013/2021	Contratação de solução de segurança da informação do Conselho da Justiça Federal – CJF para proteção da Nuvem Privada da Justiça Federal – NUJUFE (solução de proteção para ambiente de data center virtual), contemplando fornecimento de equipamentos (appliances), licenciamento de software, serviços de instalação e configuração, suporte técnico e garantia para 36 meses.	ALLTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
2021	2.37	0001995-70.2020.4.90.8000/ 0004489-79.2020.4.90.8000	028/2020	Serviço de distribuição de informações de cadastro com tecnologia Blockchain como Serviço – BcaaS, para acesso a dados do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, intitulada b-CNPJ.	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA – DATAPREV
2021	2.38	0003606-13.2020.4.90.8000 / 0004568-15.2020.4.90.8000	031/2020	Serviços de suporte especializado ao produto (“product support”) e atualização de versão de software (“software updates”) do fabricante.	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS
2021	2.39	0000556-59.2020.4.90.8000 / 0004493-55.2020.4.90.8000	29/2020	Serviços de comunicação de dados (internet e MPLS), incluindo o fornecimento, a instalação e a configuração de equipamentos e enlaces de comunicação e gerenciamento proativo contra falhas, no modelo/tecnologia SDWAN.	ALGAR MULTIMÍDIA S/A

2021	2.41	0003178-74.2020.4.90.8000 / 0001917-74.2021.4.90.8000	Contrato 021/2021	Fornecimento de certificados digitais A3.	AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI
2021	2.42	0003178-74.2020.4.90.8000 / 0001918-55.2021.4.90.8000	Contrato 022/2021	Fornecimento de certificados digitais A1.	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
2021	2.43	0002509-40.2020.4.90.8000	Contrato n. 016/2021	fornecimento de licenças de software de virtualização de estações de trabalho (Horizon 7 Enterprise - CCU).	MEMORA PROCESSOS INOVADORES S/A
2021	2.44	0004108-15.2020.4.90.8000 / 0002146-51.2021.4.90.8000	Contrato n. 025/2021	Prestação de serviços de assistência técnica para equipamentos pertencentes à solução do ambiente físico seguro e seus subsistemas, do tipo sala-cofre modular.	ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A
2021	2.45	0000341-64.2021.4.90.8000	Contrato n. 19/2021	Aquisição de licenças (como serviço) da solução Dicionário Houaiss Corporativo.	INSTITUTO ANTÔNIO HOUAISS
2021	2.46	0004442-13.2020.4.90.8000 / 0002183-03.2021.4.90.8000	Contrato n. 26/2021	Prestação de serviços de impressão distribuída (outsourcing de impressão)	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A
2021	2.47	0000547-85.2021.4.90.8000	Contrato n. 33/2021	Software ZOOM Vídeo Webinar para até 1.000 participantes.	SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS
2021	2.48	0000378-56.2021.4.90.8000	Contrato n. 20/2021	Subscrições da solução de videoconferência ZOOM meeting, para até 100 participantes.	SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS
2021	1.21	0000483-86.2021.4.90.8000	Empenho	Serviço de atualização (upgrade) dos softwares CYPECAD e PROHIDRÁULICA, com suporte técnico.	MULTIPLUS APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI
2021		0004481-11.2020.4.90.8000 / 0003864-35.2021.4.90.8000	Contrato 050/2021	Solução para Gerenciamento de Acesso Privilegiado (Privileged Access Management - PAM) para proteção dos ambientes computacionais do Conselho da Justiça Federal - CJF.	ARVVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS
2022	2.7	0004312-84.2019.4.90.8000 / 0002004-79.2019.4.90.8000	009/2016	Prestação de serviços de emissão de certificados digitais com dispositivos tokens USB.	SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A
2022	2.27	CJF-ADM-2018/00032	028/2018	Subscrição de SUSE LINUX.	INGRAM

2022	2.20	0001959-14.2020.4.90.8000	017/2020	Prestação de serviços de comunicação de dados para conexão da rede do Conselho da Justiça Federal à internet e de proteção contra-ataques distribuídos de negação de serviço (anti-DDoS).	NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL
2022	2.21	0001959-14.2020.4.90.8000	016/2020	Prestação de serviços de comunicação de dados para conexão da rede do Conselho da Justiça Federal à Internet e de proteção contra-ataques distribuídos de negação de serviço (anti-DDoS).	RD TELECOM
2022	2.3	0001989-89.2019.4.90.8000	008/2020	Contratação de serviços gerenciados de segurança da informação.	ISH TECNOLOGIA S/A
2022	2.1	0002507-35.2019.4.90.8000	010/2018	Contratação de extensão da garantia dos equipamentos servidores de rede em lâmina (blades), incluindo substituição de peças, serviço de suporte e atualização de firmware e de versão dos softwares de gerência.	HEWLETT PACKARD BRASIL
2022	2.14	CJF-ADM-2016/00286.01 0000084-46.2019.4.90.8000	023/2017	Contratação de solução de proteção de dados.	DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
2022	2.15	0001453-54.2019.4.90.8000	002/2020	Prestação e serviços de sustentação do ambiente de Tecnologia da Informação (TI) do Conselho da Justiça Federal.	ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S/A
2022	1.10	0003171-06.2020.4.90.8000	ARP 024/2021	Registro de preços para eventual periféricos e bens de TI.	COMPUSET INFORMÁTICA
2022	2.24	0002981-28.2020.4.90.8000 / 0003658-44.2020.4.90.8000	021/2020	Prestação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em Tecnologia da Informação, na forma de subscrição.	GARTNER
2022	2.16	0001818-22.2019.4.90.8000 / 0001956-11.2019.4.90.8000	047/2017	Contratação de solução para o gerenciamento de ameaças de segurança, contemplando o fornecimento de equipamentos, softwares e sistemas de gerenciamento da solução, com garantia de 60 (sessenta) meses e serviços de instalação, configuração, transferência de conhecimento.	NCT INFORMÁTICA
2022	2.38	0003606-13.2020.4.90.8000	031/2020	Serviços de suporte especializado ao produto ("product support") e atualização de versão de software ("Software Updates") do fabricante	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS
2022	2.5	0005034-55.2019.4.90.8000	012/2020	Subscrições Microsoft	BRASOFTWARE

2022	2.39	0000556-59.2020.4.90.8000	29/2020	Serviços de comunicação de dados (internet e MPLS), incluindo o fornecimento, a instalação e a configuração de equipamentos e enlaces de comunicação e gerenciamento proativo contra falhas, no modelo/tecnologia SDWAN.	ALGAR MULTIMÍDIA S/A
2022	2.19	0002067-52.2019.4.90.8000 / 0002263-54.2019.4.90.8000	031/2018	Contratação de solução de segurança para proteção de endpoint e datacenter.	ALLTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
2022	75	0001634-87.2021.4.90.8000	Empenho	Subscrições do software PHPStorm para atender às necessidades do Grupo de Trabalho de desenvolvimento e implantação do Sistema Eletrônico de Recursos Humanos - SERH Nacional.	TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2022	1.31	0000685-73.2021.4.90.8000 / 0003037-51.2021.4.90.8000	Contrato 035/2021	Atualização da versão vitalícia do VW Ponto para Velti Ponto com migração de dados e serviços de suporte especializado ao produto pelo período de 30 meses.	VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS
2022	1.18	0004099-90.2020.4.90.8000 / 0003464-84.2021.4.90.8000	Contrato 040/2021	Serviço de suporte aos usuários com solução de gerenciamento de serviços de TI.	QUALIFICAR - GESTÃO TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS CORPORATIVOS E TECNOLOGIA EIRELI
2022	2.43	0002509-40.2020.4.90.8000	Contrato n. 016/2021	fornecimento de licenças de software de virtualização de estações de trabalho (Horizon 7 Enterprise - CCU).	MEMORA PROCESSOS INOVADORES S/A
2022	2.36	0000843-22.2020.4.90.8000	013/2021	Contratação de solução de segurança da informação do Conselho da Justiça Federal - CJF para proteção da Nuvem Privada da Justiça Federal - NUJUFE (Solução de proteção para ambiente de Data Center virtual), contemplando fornecimento de equipamentos (appliances), licenciamento de software, serviços de instalação e configuração, suporte técnico e garantia para 36 (trinta e seis) meses.	ALLTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
2022	2.34	0000843-22.2020.4.90.8000	011/2021	Contratação de solução de segurança da informação do Conselho da Justiça Federal - CJF para proteção da Nuvem Privada da Justiça Federal - NUJUFE (Solução de Gerenciamento Unificado de Ameaças-UTM), contemplando fornecimento de equipamentos (appliances), licenciamento de software, serviços de instalação e configuração, suporte técnico e garantia para 36 meses.	NCT INFORMÁTICA

2022	2.35	0000843-22.2020.4.90.8000	012/2021	Contratação de solução de segurança da informação do Conselho da Justiça Federal - CJF para proteção da Nuvem Privada da Justiça Federal - NUJUFE (Solução de Firewall para Aplicações WEB -WAF), contemplando fornecimento de equipamentos (appliances), licenciamento de software, serviços de instalação e configuração, suporte técnico e garantia para 36 (trinta e seis) meses.	NCT INFORMÁTICA
2022	2.44	0004108-15.2020.4.90.8000	Contrato n. 025/2021	Prestação de serviços de assistência técnica para equipamentos pertencentes à solução do ambiente físico seguro e seus subsistemas, do tipo sala-cofre modular.	ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A
2022	35	0002070-18.2021.4.90.8000 / 0000930-13.2022.4.90.8000	Contrato 003/2022	VWPonto - manutenção equipamentos (cenário II).	UNIVERSO DA SEGURANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
2022	2.13	0002351-83.2019.4.90.8000	021/2019	Serviço de comunicação de dados entre o CJF e a gráfica.	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
2022	71	0000261-45.2021.4.90.8000 / 0003854-63.2021.4.90.8000	Contrato 045/2021	Serviços de manutenção corretiva e preventiva do equipamento Storage Netapp FAS-9000 como extensão da garantia.	SERVIX INFORMÁTICA
2022	2.2	0005871-10.2019.4.90.8000	014/2020	Prestação de serviço de suporte - PSS para a Autoridade Certificadora da Justiça - AC-JUS, compreendendo as atividades de hospedagem, manutenção e operacionalização do ambiente seguro da AC e disponibilização de um ponto de publicação de listas de certificados revogados.	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
2022	1.15	0004481-11.2020.4.90.8000 / 0003864-35.2021.4.90.8000	Contrato 050/2021	Solução para Gerenciamento de Acesso Privilegiado (Privileged Access Management - PAM) para proteção dos ambientes computacionais do Conselho da Justiça Federal - CJF.	ARVVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS
2022	2.37	0001995-70.2020.4.90.8000	028/2020	Serviço de distribuição de informações de cadastro com tecnologia blockchain como Serviço - BCAAS, para acesso a dados do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, intitulada b-CNPJ.	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV
2022	2.42	0003178-74.2020.4.90.8000	Contrato 022/2021	Fornecimento de certificados digitais A1.	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
2022	2.41	0003178-74.2020.4.90.8000	Contrato 021/2021	Fornecimento de certificados digitais A3.	AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI,

2022	2.46	0004442-13.2020.4.90.8000	Contrato n. 26/2021	Prestação de serviços de impressão distribuída (outsourcing de impressão).	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A
2022	69	0003522-71.2020.4.90.8000	Contrato 004/2022	Contratação de um gerenciador de repositório de software (Gitlab Enterprise).	TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2022		0003672-01.2020.4.90.8000 / 0001539-46.2022.4.90.8000	CONTRATO 012/2022	Manutenção Sistema ASI.	LINK DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS S/A
2022		0002285-20.2021.4.90.8000 / 0002579-97.2022.4.90.8000	Contrato 019/2022	Prestação de serviços de comunicação de dados para conexão da rede do CJF à Internet com saída pelo STJ.	RD TELECOM
2022		0003517-11.2020.4.90.8000	Contrato 021/2022 ARP 015/2022	RedHat - Contratação de empresa especializada para o fornecimento de subscrições de software corporativo de código aberto do tipo plataforma de contêineres, sistemas operacionais e servidores de aplicação da RedHat. Conjunta TRF5.	SUPORTE INFORMÁTICA SOLUÇÕES
2022		0001159-11.2021.4.90.8000	ARP 013/2022	Subscrição de SUSE LINUX Enterprise Server	O3S CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2022		0000387-64.2022.4.90.8000	Empenho	Aquisição de câmeras de videoconferência acompanhadas de microfones de expansão, com o intuito de atender às necessidades das sessões do Conselho da Justiça Federal.	HD SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA..
2022		0001191-79.2022.4.90.8000	Contrato 029/2022	Licenças (como serviço) da solução Dicionário Houaiss Corporativo, com garantia de 36 (trinta e seis) meses, incluindo suporte técnico remoto.	INSTITUTO ANTÔNIO HOUAISS DE LEXICOGRAFIA E BANCO DE DADOS DA LÍNGUA PORTUGUESA S/C
2022		0003775-25.2021.4.90.8000	Contrato 028/2022	PERGAMUM - Suporte técnico mensal, com atualização e manutenção preventiva, corretiva, evolutiva e adaptativa, de migração e integração e de treinamento para o software Pergamum.	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA PONTÍFICA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ (APC)
2022		0003812-12.2021.4.90.8000 / 0003768-13.2022.4.90.8000	Contrato 030/2022	Serviço técnico de sustentação do ambiente de infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) e monitoramento.	CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

2022		0001085-68.2022.4.90.8000	Empenho	Plugin de renderização em tempo real Enscape, compatível com o software Autodesk Revit.	2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI
2023	2.20	0001959-14.2020.4.90.8000	017/2020	Prestação de serviços de comunicação de dados para conexão da rede do Conselho da Justiça Federal à Internet e de proteção contra-ataques distribuídos de negação de serviço (anti-DDoS).	NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.
2023	2.21	0001959-14.2020.4.90.8000	016/2020	Prestação de serviços de comunicação de dados para conexão da rede do Conselho da Justiça Federal à Internet e de proteção contra-ataques distribuídos de negação de serviço (anti-DDoS).	RD TELECOM LTDA.
2023	2.38	0003606-13.2020.4.90.8000	031/2020	Serviços de suporte especializado ao produto ("Product Support") e atualização de versão de software ("Software Updates") do fabricante	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.
2023	2.5	0003441-13.2022.4.90.8000 / 0001717-83.2023.4.90.8000	019/2023	Subscrições Microsoft	BRASOFTWARE
2023	2.31	0001275-39.2023.4.90.8000 / 0003117-12.2023.4.90.8000	029/2023	Subscrição Adobe Creative Cloud	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.
2023	2.25	0001410-19.2023.4.90.8000 / 0002569-32.2023.4.90.8000	022/2023	Serviço de suporte técnico dos servidores de rede em lâmina (tipo blade).	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA.
2023	2.39	0000556-59.2020.4.90.8000	29/2020	Serviços de comunicação de dados (internet e MPLS), incluindo o fornecimento, a instalação e a configuração de equipamentos e enlaces de comunicação e gerenciamento proativo contra falhas, no modelo/tecnologia SDWAN.	ALGAR MULTIMÍDIA S/A
2023	2.19	0002067-52.2019.4.90.8000	031/2018	Contratação de solução de segurança para proteção de endpoint e datacenter	ALLTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.
2023	1.31	0000685-73.2021.4.90.8000	Contrato 035/2021	Subscrições do software PHPStorm para atender às necessidades do Grupo de Trabalho de desenvolvimento e implantação do Sistema Eletrônico de Recursos Humanos - SERH Nacional (Ferramenta IDE).	VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA. TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

2023	2.36	0000843-22.2020.4.90.8000	013/2021	Contratação de solução de segurança da informação do Conselho da Justiça Federal - CJF para proteção da Nuvem Privada da Justiça Federal - NUJUFE (Solução de proteção para ambiente de Data Center virtual), contemplando fornecimento de equipamentos (appliances), licenciamento de software, serviços de instalação e configuração, suporte técnico e garantia para 36 (trinta e seis) meses.	ALLTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.
2023	2.34	0000843-22.2020.4.90.8000	011/2021	Contratação de solução de segurança da informação do Conselho da Justiça Federal - CJF para proteção da Nuvem Privada da Justiça Federal - NUJUFE (Solução de Gerenciamento Unificado de Ameaças-UTM), contemplando fornecimento de equipamentos (appliances), licenciamento de software, serviços de instalação e configuração, suporte técnico e garantia para 36 (trinta e seis) meses.	NCT INFORMÁTICA LTDA.
2023	2.35	0000843-22.2020.4.90.8000	012/2021	Contratação de solução de segurança da informação do Conselho da Justiça Federal - CJF para proteção da Nuvem Privada da Justiça Federal - NUJUFE (Solução de Firewall para Aplicações WEB -WAF), contemplando fornecimento de equipamentos (appliances), licenciamento de software, serviços de instalação e configuração, suporte técnico e garantia para 36 (trinta e seis) meses.	NCT INFORMÁTICA LTDA.
2023	2.44	0004108-15.2020.4.90.8000	Contrato n. 025/2021	Prestação de serviços de assistência técnica para equipamentos pertencentes à solução do ambiente físico seguro e seus subsistemas, do tipo Sala-Cofre Modular.	ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A
2023	35	0002070-18.2021.4.90.8000 / 000093-13.2022.4.90.8000	Contrato 003/2022	VWPonto - manutenção equipamentos (cenário II).	UNIVERSO DA SEGURANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
2023	2.13	0002351-83.2019.4.90.8000 / 0006639-08.2019.4.90.8000	021/2019	Serviço de comunicação de dados entre o CJF e a gráfica.	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
2023	71	0000261-45.2021.4.90.8000 / 0003854-63.2021.4.90.8000	Contrato 045/2021	Serviços de manutenção corretiva e preventiva do equipamento Storage Netapp FAS-9000 como extensão da garantia.	SERVIX INFORMÁTICA LTDA.
2023	1.15	0004481-11.2020.4.90.8000	Contrato 050/2021	Solução para Gerenciamento de Acesso Privilegiado (Privileged Access Management - PAM) para proteção dos ambientes computacionais do Conselho da Justiça Federal - CJF.	ARVVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

2023	2.37	0001995-70.2020.4.90.8000	028/2020	Serviço de distribuição de informações de cadastro com tecnologia Blockchain como Serviço - BaaS, para acesso a dados do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, intitulada b-CNPJ.	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV
2023	2.42	0003178-74.2020.4.90.8000	Contrato 022/2021	Fornecimento de certificados digitais A1.	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
2023	2.41	0003178-74.2020.4.90.8000	Contrato 021/2021	Fornecimento de certificados digitais A3.	AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI
2023		0003672-01.2020.4.90.8000	CONTRATO 012/2022	Manutenção Sistema ASI	LINK DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS S/A
2023		0002285-20.2021.4.90.8000	Contrato 019/2022	Prestação de serviços de comunicação de dados para conexão da rede do CJF à Internet com saída pelo STJ.	RD TELECOM LTDA.
2023		0002028-41.2023.4.90.8000	Contrato 024/2023	RedHat - Contratação de empresa especializada para o fornecimento de subscrições de software corporativo de código aberto do tipo plataforma de contêineres, sistemas operacionais e servidores de aplicação da RedHat. Conjunta TRF5.	SUPORTE INFORMÁTICA SOLUÇÕES LTDA.
2023		0001159-11.2021.4.90.8000 / 0002615-95.2022.4.90.8000	Contrato 22/2022	Subscrição de SUSE LINUX Enterprise Server.	O3S CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
2023		0001191-79.2022.4.90.8000 /	Contrato 029/2022	Licenças (como serviço) da solução Dicionário Houaiss Corporativo, com garantia de 36 meses, incluindo suporte técnico remoto.	INSTITUTO ANTÔNIO HOUAISS DE LEXICOGRAFIA E BANCO DE DADOS DA LÍNGUA PORTUGUESA S/C LTDA.
2023		0003775-25.2021.4.90.8000 / 0003663-46.2022.4.90.8000	Contrato 028/2022	PERGAMUM - Suporte técnico mensal, com atualização e manutenção preventiva, corretiva, evolutiva e adaptativa, de migração e integração e de treinamento para o software Pergamum.	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA PONTÍFICA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ (APC)
2023		0003812-12.2021.4.90.8000	Contrato 030/2022	Serviço técnico de sustentação do ambiente de infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) e monitoramento.	CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
2023		0001085-68.2022.4.90.8000	Contrato 13/2023	Plugin de renderização em tempo real Enscape, compatível com o software Autodesk Revit.	2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI
2023		0000615-88.2022.4.90.8000 / 0000036-43.2023.4.90.8000	Contrato 010/2023	Serviço de extensão de garantia do fabricante, serviços de atualização e suporte técnico, manutenção corretiva e preventiva das soluções de segurança de perímetro.	NCT INFORMÁTICA LTDA.

2023	0000348-58.2022.4.90.8000 / 0000035-62.2023.4.90.8000	Contrato 09/2023	Extensão de garantia do fabricante, serviços de atualização e suporte técnico de dois equipamentos appliance Dell DD6800.	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.
2023	CJF-ADM-2016/00286.01 / 0000084-46.2019.4.90.8000	023/2017	Contratação de solução de proteção de dados, nesta data, contemplando os equipamentos de backup, os módulos de expansão, os cabos para interligação desses equipamentos ao ambiente tecnológico do CJF e as licenças dos softwares.	DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
2023	0001818-22.2019.4.90.8000 / 0001956-11.2019.4.90.8000	047/2017	Contrato consiste na contratação de solução para o gerenciamento de ameaças de segurança, contemplando o fornecimento de equipamentos, softwares e sistemas de gerenciamento da solução, com garantia de 60 meses e serviços de instalação e configuração.	NCT INFORMÁTICA LTDA.
2023	0003517-11.2020.4.90.8000	021/2023	Fornecimento de subscrições de software corporativo de código aberto do tipo plataforma de contêineres, sistemas operacionais e servidores de aplicação da RedHat.	SUPORTE INFORMÁTICA SOLUÇÕES LTDA.

ANEXO 3 QUADRO-RESUMO DA EVOLUÇÃO DAS METAS MONITORADAS PELA STI DESDE 2021

Objetivo Estratégico - CJF	Período: 2021 - Portaria CJF 100/2021	Período: 2022 - Portaria CJF 224/2022	Período: 2023 - Portaria CJF 329/2023	Período: 2024 - Portaria CJF 303/2024
Estreitar a integração com a JF e outras instituições nacionais e internacionais.	META 6 - Atingir, até 2026, mais 6 sistemas nacionais	META 6 - Atingir, até 2026, mais 3 sistemas nacionais	-	-
	META 7 - Realizar, até 2026, 10 contratações conjuntas	META 7 - Realizar, até 2026, 10 contratações	META 2 - Realizar, no mínimo, duas contratações conjuntas de TI por ano.	META 2 - Realizar, no mínimo, duas contratações conjuntas de TI por ano.
Promover a melhoria na governança no CJF.	META 13 - Manter-se no nível "aprimorado" nas avaliações de governança de TI até 2026	META 13 - Manter-se no nível "aprimorado" nas avaliações de governança.	-	-
	META 14 - Manter-se no nível "aprimorado" nas avaliações de governança de TI até 2026	META 14 - Manter-se no nível "aprimorado" nas avaliações de governança de TI até 2026	META 10 - Manter-se, no mínimo, no nível "aprimorado" nas avaliações de governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).	META 13 - Manter-se, no mínimo, no nível "aprimorado" nas avaliações de governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).
Fortalecer a segurança da informação.	META 21 - Atingir, até 2026, institucionalização de 13 normativos de política de segurança da informação	-	-	-
	META 22 - Evoluir, até 2026, em 20% com relação à maturidade base em segurança da informação	META 22 - Atingir, em 2026, o nível 3 no processo de gestão de incidentes	META 14 - Atingir o nível 2 no processo de gestão de incidentes	META 18 - Manter o nível 2 no processo de gestão de incidentes.
	META 23 - Atingir, em 2026 o nível 4 nos processos de gestão de vulnerabilidade	META 23 - Atingir, em 2026 o nível 3 nos processos de gestão de vulnerabilidade	META 15 - Atingir o nível 3 nos processos de gestão de vulnerabilidade	META 19 - Manter o nível 3 no processo de gestão de vulnerabilidade.
Promover a transformação digital para aprimoramento dos serviços prestados pelo CJF.	META 24 - Manter, até 2026, 90% de satisfação dos usuários com os serviços de TI	META 24 - Manter, até 2026, 90% de satisfação dos usuários com os serviços de TI.	META 22 - Manter 90% de satisfação de usuários com os serviços de Tecnologia da Informação (TI).	META 25 - Manter 90% de satisfação de usuários com os serviços de Tecnologia da Informação (TI).
	META 25 - Atingir, até 2026, 12 inovações e modernizações tecnológicas implementadas aos usuários	META 25 - Atingir, até 2026, 12 inovações e modernizações tecnológicas implementadas aos usuários	-	-

Anexo 4 INVENTÁRIO DE NECESSIDADES PRIORIZADAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CJF 2024-2026

ID	NECESSIDADE	DESCRIÇÃO	PROCESSO	CONTRATAÇÃO CONTINUADA?	UNIDADE DEMANDANTE	G	U	T	PRIORIZAÇÃO GUT
NEC-2024-001	Conjunto de ferramentas integradas para criação de mídias digitais e design gráfico	Subscrição Adobe Creative Cloud	0001275-39.2023.4.90.8000	Sim	ASCOM e CEJ	4	2	2	16
NEC-2024-002	Solução de distribuição de informações de cadastro com tecnologia Blockchain para acesso a dados de CNPJ	Contratação da solução de distribuição de informações de cadastro com tecnologia Blockchain, como Serviço - BcaaS, para acesso a dados do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, intitulada b-CNPJ.	---	Sim	DIDIA	5	3	2	30
NEC-2024-003	Solução de distribuição de informações de cadastro com tecnologia Blockchain para acesso a dados de CPF	Contratação da solução distribuição de informações de cadastro com tecnologia Blockchain, como Serviço - BcaaS, para acesso a dados do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, intitulada b-CPF.	0000985-13.2024.4.90.8000	Sim	DIDIA	5	4	4	80
NEC-2024-004	Serviço de suporte ao Serviço de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) Oracle	Contratação de serviços de suporte especializado ao produto "product support" e atualização de versão de software "software updates" dos produtos Oracle licenciados para o Conselho da Justiça Federal.	---	Sim	DIDIA	4	2	2	16
NEC-2024-005	Solução de IA generativa	Aquisição de solução de inteligência artificial generativa e LLM (Large Language Models) para processamento de documentos, apresentando a capacidade de realizar sumarizações, dentre outras funcionalidades.	---	Sim	DIDIA	3	5	5	75
NEC-2024-006	Solução baseada em grafos para análise profunda de vínculos, com aplicação de algoritmos de Inteligência Artificial	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação, configuração, suporte, serviço técnico e treinamento na plataforma de gerenciamento dados.	---	Sim	DIDIA	3	3	3	27
NEC-2024-007	Solução de busca baseada em texto livre, com suporte a análise de dados e aplicação de algoritmos de Inteligência Artificial	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação, configuração, suporte, serviço técnico e treinamento na plataforma de busca textual.	0000920-78.2024.4.90.8000	Sim	DIDIA	3	4	5	60

NEC-2024-008	Processo de fomento a inovação tecnológica no CJF	Estabelecer um processo de fomento a inovação por parte da STI, atuando em conjunto com o Laboratório de Inovação do CJF (IpêLab) e a Rede Inovação em Governo (InovaGov)	---	Não	DIDIA	3	3	3	27
NEC-2024-009	Solução de criptografia e anonimização de banco de dados	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação, configuração, suporte, serviço técnico e treinamento de uma solução de criptografia e anonimização de bancos de dados, com suporte a múltiplas tecnologias (relacionais e não relacionais).	---	Sim	DIDIA e SUSTI	5	4	4	80
NEC-2024-010	Renovação do parque de microinformática e criação de reserva técnica	Aquisição de microcomputador desktop tipo II (300 equipamentos), workstation (8 equipamentos) e notebooks (30 equipamentos).	---	Não	DIRAC	3	2	1	6
NEC-2024-011	Renovação do parque de microinformática e criação de reserva técnica	Aquisição de Microcomputador desktop tipo I (200 equipamentos).	0002954-70.2024.4.01.8000	Não	DIRAC	3	2	1	6
NEC-2024-012	Hospedagem, manutenção e operacionalização da autoridade certificadora da Justiça Federal	Prestação de serviço de suporte - PSS para a Autoridade Certificadora da Justiça - AC-JUS, compreendendo as atividades de hospedagem, manutenção e operacionalização do ambiente seguro da AC e disponibilização de um ponto de publicação de listas de certificados revogados.	---	Sim	DIRAC	4	4	3	48
NEC-2024-013	Certificação digital para o SISPREC	Fornecimento de certificado digital para o SISPREC.	---	Sim	DIRAC	5	3	3	45
NEC-2024-014	Certificação digital A1	Fornecimento de certificados digitais A1	---	Sim	DIRAC	4	3	3	36
NEC-2024-015	Certificação digital A3	Fornecimento de certificados digitais A3	---	Sim	DIRAC	4	3	3	36
NEC-2024-016	Serviço de impressão corporativa distribuída	Prestação de serviços de impressão distribuída (outsourcing de impressão).	---	Sim	DIRAC	3	2	1	6
NEC-2024-017	Efetivar a política de transformação digital com foco na qualidade de processos	Aquisição de câmeras de videoconferência acompanhadas de microfones de expansão, com o intuito de atender às necessidades das sessões do Conselho da Justiça Federal.	---	Não	DIRAC	2	2	1	4

NEC-2024-018	Efetivar política de transformação digital por meio da disponibilização de plataforma de reuniões e seminários online	10 (dez) licenças da Plataforma Zoom Meetings - Pro - 3 Year Prepay (PAR1-PRO-BASE-NH3Y), conforme item 7 da precitada Ata de Registro de Preços; uma licença da Plataforma Zoom Zoom Events 1,000 - 3 Year Prepay (PAR1-EVN-1000-FL3Y), conforme item 8 da precitada Ata de Registro de Preços.	---	Sim	DIRAC	2	1	1	2
NEC-2024-019	Implementar objetivos de aperfeiçoar e assegurar a qualidade e celeridade do serviço de suporte e atendimento técnico ao usuário final	Serviço de atendimento e suporte N1 e N2 (service desk).	0000896-11.2024.4.90.8000	Sim	DIRAC	5	5	5	125
NEC-2024-020	Adoção de novas tecnologias como fomento à transformação digital	Novo sistema corporativo especializado para a gestão do ciclo de vida das contratações.	---	Não	STI	4	3	3	36
NEC-2024-021	Renovação do parque de microinformática e criação de reserva técnica	Aquisição de monitores	---	Não	DIRAC	4	3	2	24
NEC-2024-022	Implementação de nova central de serviços de TI, com suporte aos processos de gestão de TI	Aquisição de solução de gerenciamento de serviços de TI (ITSM).	0001222-59.2021.4.01.8000	Sim	DIRAC	4	3	5	60
NEC-2024-023	Dicionário online para trabalhos de revisão textual do CERREVI	Licenças (como serviço) da solução Dicionário Houaiss Corporativo, com garantia de 36 (trinta e seis) meses, incluindo suporte técnico remoto.	0001191-79.2022.4.90.8000	Sim	SG/CERREVI	3	3	1	9
NEC-2024-024	Software de desenvolvimento de projetos de Arquitetura e Engenharia civil, com integração de projetos.	Contratação de licenças do software AUTODESK AEC - Architecture, Engineering and Construction Collection (nove licenças)	0002477-80.2023.4.90.8000	Sim	SGO	4	3	2	24
NEC-2024-025	Adoção de novas tecnologias como fomento à transformação digital	Nova solução de jurisprudência com correlação de atos a partir de algoritmos de inteligência artificial.	---	Não	STU	4	5	4	80

NEC-2024-026	Promoção de inovação por meio de serviço de consultoria e aconselhamento imparcial em TI	Contratação de serviço de consultoria e aconselhamento imparcial em TI.	---	Sim	STI	1	1	2	2
NEC-2024-027	Qualificação dos colaboradores na busca por eficiência, efetividade e inovação por meio da contratação de Plataforma de cursos online para capacitação técnica em TI	Contratação de ação de educação, por meio de assinatura de treinamento.	---	Sim	STI	4	4	3	48
NEC-2024-028	Qualificação dos colaboradores na busca por eficiência, efetividade e inovação por meio da contratação de biblioteca digital de livros e/ou artigos técnicos	Contratação de plataforma de acesso a livros e artigos online contendo acervo técnico de Tecnologia da Informação.	---	Sim	STI	4	4	3	48
NEC-2024-029	Controle e melhoria de processos	Educação para adoção de boas práticas por todas as unidades da STI. Orientação para desenvolvimento de planos operacionais, mapeamento e melhoria de processos, definição de procedimentos operacionais para que o uso da TI atenda aos objetivos de negócio.	---	Não	SUGOV	4	3	3	36
NEC-2024-030	Controle de custos para otimização da aplicação de recursos financeiros	Organizar e disponibilizar dados de alta qualidade para análise e otimização de riscos e de recursos financeiros envolvidos em contratações de TI.	---	Não	SUGOV	3	2	2	12
NEC-2024-031	Implementação de governança de dados e ações de suporte à tomada de decisão	Disponibilizar dados de alta qualidade para avaliação do uso de recursos de TI e propiciar eficácia e inovação no âmbito do CJF e da Justiça Federal.	---	Não	SUGOV	3	2	2	12
NEC-2024-032	Monitoramento do resultado de ações de segurança da informação e qualidade de software	Educação em boas práticas e garantia de adequação normativa.	---	Não	SUGOV	4	3	3	36
NEC-2024-033	Apoio técnico para gestão em TI	Contratação de serviços para atividades de apoio técnico à gestão de Tecnologia da Informação.	0002787-22.2022.4.90.8000	Sim	SUGOV	4	4	3	48
NEC-2024-034	Aperfeiçoamento do Gerenciamento de projetos	Ferramenta de gerenciamento de projetos, portfólios em âmbito nacional	---	Sim	SUPES	4	3	4	48

NEC-2024-035	Implantação de ambiente integrado para desenvolvimento de software	Subscrições do software PHPStorm para atender às necessidades do Grupo de Trabalho de desenvolvimento e implantação do Sistema Eletrônico de Recursos Humanos - SERH Nacional.	0001880-82.2023.4.90.8000	Sim	SUSOF	3	2	1	6
NEC-2024-036	Adoção de ferramenta de gerenciamento de ciclo de vida de software	Subscrição de ferramenta de gerenciamento de ciclo de vida de software GitLab Ultimate para atendimento ao desenvolvimento e manutenção de software do CJF.	0004136-11.2022.4.90.8000	Sim	SUSOF	3	2	1	6
NEC-2024-037	Desenvolvimento de sistemas novos e manutenção de sistemas legados	Atender à demanda dos usuários por desenvolvimento de sistemas novos e atualização de sistemas legados para manter suas funcionalidades, sua disponibilidade, a integridade e a confidencialidade das informações, bem como a transparência e a proteção aos dados pessoais	0004138-75.2022.4.90.8000	Sim	SUSOF	5	5	5	125
NEC-2024-038	Garantia da prestação dos serviços de segurança de TI	Serviços Gerenciados de Segurança da Informação (SOC) - Prorrogação	0001989-89.2019.4.90.8000	Sim	SUSTI	3	1	1	3
NEC-2024-039	Garantia da prestação dos serviços de segurança de TI	Serviços Gerenciados de Segurança da Informação (SOC) - Nova contratação	---	Sim	SUSTI	5	4	3	60
NEC-2024-040	Segurança para proteção de servidores de rede, estações de trabalho, serviço de e-mail e Office 365	Contratação de Solução de Segurança de TI para proteção de servidores de rede, estações de trabalho, serviço de e-mail e Office 365 contemplando instalação e configuração, suporte técnico e garantia do fabricante.	0001703-88.2023.4.90.8000	Sim	SUSTI	4	4	3	48
NEC-2024-041	Fortalecimento da segurança da informação por meio de solução de gerenciamento de acesso privilegiado para a Justiça Federal	Solução para Gerenciamento de Acesso Privilegiado (Privileged Access Management - PAM)	0002941-92.2023.4.90.8000	Sim	SUSTI	3	3	2	18
NEC-2024-042	Fortalecimento da segurança da informação por meio de solução de proteção para ambiente de Data Center virtual para a NUJUFE	Contratação de solução de segurança da informação do Conselho da Justiça Federal - CJF para proteção da Nuvem Privada da Justiça Federal - NUJUFE (Solução de proteção para ambiente de Data Center virtual), contemplando fornecimento de equipamentos (appliances), licenciamento de software, serviços de instalação e configuração, suporte técnico e garantia para 36 (trinta e seis) meses.	0000843-22.2020.4.90.8000	Sim	SUSTI	4	3	3	36

NEC-2024-043	Fortalecimento da segurança da informação por meio de manutenção da solução de Firewall para Aplicações (WAF) e da solução de Gerenciamento Unificado de Ameaças (UTM) para o CJF	Serviço de extensão de garantia do fabricante, serviços de atualização e suporte técnico, manutenção corretiva e preventiva das soluções de segurança de perímetro.	0000615-88.2022.4.90.8000	Sim	SUSTI	4	3	1	12
NEC-2024-044	Conscientização dos usuários sobre segurança da informação	Contratação de plataforma de testes e treinamento corporativo em segurança da informação para magistrados, servidores, terceirizados e estagiários do CJF.	---	Sim	SUSTI	4	3	3	36
NEC-2024-045	Ação para assegurar a efetividade dos serviços de TI por meio da manutenção técnica dos equipamentos servidores corporativos do CJF	Serviço de suporte técnico dos servidores de rede em lâmina (tipo blade).	---	Sim	SUTEC	4	3	2	24
NEC-2024-046	Ação para assegurar a efetividade dos serviços de TI por meio do provimento de comunicação de dados entre o Conselho da Justiça Federal e os TRFs	Serviços de comunicação de dados (internet e MPLS), incluindo o fornecimento, a instalação e a configuração de equipamentos e enlaces de comunicação e gerenciamento proativo contra falhas, no modelo/tecnologia SDWAN.	---	Sim	SUTEC	3	3	3	27
NEC-2024-047	Ação para assegurar a efetividade dos serviços de TI por meio da atualização dos equipamentos de climatização da Sala-Cofre do CJF	Prestação de serviços de assistência técnica para equipamentos pertencentes à solução do ambiente físico seguro e seus subsistemas, do tipo Sala-Cofre Modular.	---	Não	SUTEC	4	3	3	36
NEC-2024-048	Comunicação de dados com unidade remota do Conselho da Justiça Federal	Serviço de comunicação de dados entre o CJF e a gráfica.	0001068-00.2024.4.90.8000	Sim	SUTEC	4	5	4	80
NEC-2024-049	Manutenção técnica dos elementos ativos de rede	Extensão de garantia do fabricante, serviços de atualização e suporte técnico de ativos de rede do CJF (Switches CORE, Acesso e Wifi).	---	Sim	SUTEC	3	3	2	18
NEC-2024-050	Manutenção técnica da solução de armazenamento de dados corporativos	Serviço de manutenção corretiva e preventiva do equipamento Storage Netapp FAS-9000.	0000261-45.2021.4.90.8000	Sim	SUTEC	3	3	3	27

NEC-2024-051	Prover comunicação de dados entre o Conselho da Justiça Federal e a Internet	Prestação de serviços de comunicação de dados para conexão da rede do CJF à Internet com saída pelo STJ.	---	Sim	SUTEC	4	3	3	36
NEC-2024-052	Manutenção técnica da solução de proteção de dados corporativos	Extensão de garantia do fabricante, serviços de atualização e suporte técnico de dois equipamentos appliance Dell DD6800	---	Sim	SUTEC	3	2	2	12
NEC-2024-053	Manutenção técnica dos equipamentos que compõe a NUJUFE	Extensão de garantia do fabricante, serviços de atualização e suporte técnico de equipamentos da NUJUFE (Servidores VXRail, IDPA e Switches).	---	Sim	SUTEC	3	2	2	12
NEC-2024-054	Atualização tecnológica do ambiente corporativo do CJF	Aquisição de novos servidores de rede.	0000957-42.2023.4.90.8000	Não	SUTEC	3	4	2	24
NEC-2024-055	Prover solução de acesso externo aos serviços e infraestrutura	Fornecimento de licenças de software de virtualização de estações de trabalho (Horizon 7 Enterprise - CCU).	---	Sim	SUTEC	2	1	1	2
NEC-2024-056	Subscrições do ambiente de virtualização de servidores e redes	Contratação de solução de virtualização do ambiente corporativo.	---	Sim	SUTEC	5	3	4	60
NEC-2024-057	Melhoria do ambiente de climatização da sala-cofre do CJF	Expansão do sistema de climatização e confinamento da sala-cofre.	---	Não	SUTEC	4	3	3	36
NEC-2024-058	Implementar camada adicional da solução de proteção de dados por meio de biblioteca automatizada de fitas padrão LTO	Aquisição de biblioteca de fitas padrão LTO compatível com a solução de proteção de dados em uso no Conselho da Justiça Federal.	---	Não	SUTEC	4	2	2	16
NEC-2024-059	Renovação da contratação de licenças e suporte do sistema operacional SUSE Linux e a ferramenta SUSE Manager	Contratação de subscrição de serviço de suporte prioritário do sistema operacional SUSE Linux e da ferramenta de gerenciamento centralizado SUSE Manager, com atualização de versão.	---	Sim	SUTEC e DIDIA	3	3	2	18

NEC-2024-060	Contratação de serviço técnico de sustentação do ambiente de Infraestrutura de Tecnologia da Informação	Contratação de serviço técnico de sustentação do ambiente de Infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) do Conselho da Justiça Federal.	---	Sim	SUTEC e DIDIA	5	5	5	125
NEC-2024-061	Renovação das subscrições do ambiente de containers do CJF	Contratação da solução Red Hat Cloud Suite, Premium (2 Sockets, 32 Cores) Part Number: RV00085F3.	---	Sim	SUTEC e DIDIA	3	2	1	6
NEC-2024-062	Acompanhar e monitorar o desempenho das aplicações críticas	Contratação de solução de análise e gerenciamento de desempenho de banco de dados.	---	Não	SUTEC e DIDIA	3	3	1	9
NEC-2024-063	Prover solução de otimização de desempenho e disponibilidade de aplicações web	Contratação de empresa especializada na entrega, instalação e configuração de controlador de fornecimento de aplicação - ADC (Application Delivery Controller) com balanceamento de cargas e aplicações.	0000919-34.2024.4.90.8000	Sim	SUTEC e SUSTI	5	5	4	100
NEC-2024-064	Aplicativos Microsoft para escritório e Data Center	Contratação de subscrições da Microsoft, (software aplicativos, banco de dados e sistemas operacionais) destinados aos equipamentos servidores e estações de trabalho do Conselho da Justiça Federal (CJF).	0003441-13.2022.4.90.8000	Sim	SUTEC, DIDIA e DIRAC	5	3	3	45
NEC-2024-065	Implementação de auditoria nos serviços de email, autenticação e arquivos	Contratação de solução de auditoria de e-mail, servidor de arquivos e serviço de diretório.		Não	SUTEC, DIDIA e SUSTI	5	4	3	60
NEC-2024-066	Plataforma para consulta e planejamento orçamentário aplicado a Engenharia Civil	Software para engenharia, contemplando os módulos: Básico Orçamento, Bases Adicionais, Medição de obras, Diário de Obras.	---	Sim	SGO	4	3	2	24
NEC-2024-067	Ampliação do acesso ao conteúdo bibliográfico e às pesquisas aos magistrados da Justiça Federal e aos alunos da Enfam.	Rede Virtual de Bibliotecas (RVBI) do Senado Federal.	---	Sim	SCE	3	4	3	36

NEC-2024-068	Serviço de suporte técnico ao Sistema Pergamum	Serviço de suporte técnico ao Sistema Pergamum	---	Sim	SCE	3	4	3	36
NEC-2024-069	Garantia de segurança para o serviço de editoração de revista	Serviço de suporte técnico ao Sistema SEER	---	Sim	SCE	3	4	3	36
NEC-2024-070	Serviço de suporte e garantia do Sistema de Atos Normativos	Prestação de Serviço de Suporte e Garantia de Solução a Sistema de Atos Normativos	---	Sim	SCE	3	4	3	36
NEC-2024-071	Disponibilização de serviço de descoberta de conteúdo em escala	Serviço de descoberta de conteúdo em escala (Web Scale Discovery Service) ENFAM	---	Sim	SCE	3	4	3	36
NEC-2024-072	Plugin de renderização 3D em tempo real para projetos BIM de Arquitetura	Subscrição de licenças de plugin de renderização em tempo real compatível com AutoCAD e Revit.	0002477-80.2023.4.90.8000	Sim	SGO	3	2	1	6
NEC-2024-073	Softwares para dimensionamento de projetos de Engenharia	Aquisição de licenças de softwares destinados ao desenvolvimento de projetos de estruturas em concreto armado, estruturas metálicas, projetos elétricos, hidrossanitários e de telecomunicações.	0000178-82.2024.4.90.8000	Não	SGO	3	2	2	12
NEC-2024-074	Eficiência e efetividade para atender as necessidades internas de gestão de patrimônio mobiliário	Serviços de suporte técnico (help desk) e manutenção continuada, com garantia de funcionamento e atualização de versão para os módulos de Patrimônio Mobiliário e Almoxarifado - Sistema ASIWEB	---	Sim	SAD	3	3	3	27
NEC-2024-075	Eficiência e efetividade para atender as necessidades internas de gestão de patrimônio mobiliário	Implantação de automação de inventário do software de gestão ASI, suportada pela tecnologia RFID, integrada com o sistema de Gestão patrimonial.	---	Sim	SAD	3	3	3	27
NEC-2024-076	Assegurar a transformação digital e a favorecer a qualidade da tomada de decisão	Contratação de serviços integrados em nuvem por demanda, para armazenamento, processamento e análise de dados em larga escala, com recursos computacionais escaláveis, segurança de dados e garantias de disponibilidade e continuidade do serviço.	---	Sim	SEG	2	2	1	4

NEC-2024-077	Atendimento das necessidades dos clientes internos para consecução da função institucional da Justiça Federal.	Contratação de serviços de mailing.	---	Sim	ASCOM	4	3	2	24
NEC-2024-078	Assegurar a transformação digital e a favorecer a qualidade da tomada de decisão	Aquisição de solução de governança/auditoria de dados.		Sim	DIDIA	3	2	3	18
NEC-2024-079	Eficiência e efetividade para atender as necessidades internas de software e comunicação	Contratação de serviço de manutenção da solução de hiperconvergência.	---	Sim	DIDIA	5	3	3	45
NEC-2024-080	Agregar e reter pessoas	Criação de cargos e contratação de servidores por meio da realização de concurso público para a área de Tecnologia da Informação.		Não	STI	5	5	5	125
NEC-2024-081	Solução Application Performance Monitoring (APM).	Solução para identificar as falhas nos ambientes de aplicações nacionais monitorados, bem como coletar, armazenar e disponibilizar métricas de desempenho, além da emissão de relatórios para a descoberta da causa raiz de um problema no ambiente de aplicação, rede e banco de dados.	0000865-15.2024.4.90.8000	Não	SUTEC	3	2	3	18
NEC-2024-082	Expansão da capacidade da NUJUFE	Aquisição de novos appliances da solução de hiperconvergência com vistas à expansão da capacidade da Nuvem da Justiça Federal - NUJUFE.	---	Não	SUTEC	4	4	3	48
NEC-2024-083	Solução para gestão de contratos	Cessão de direito de uso de software destinado à gestão do ciclo de vida de contratos administrativos, possibilitando realizar controle de prazos, controle e acompanhamento da execução financeira, fiscalização e emissão de relatórios.	---	Sim	SUGOV	5	5	4	100
NEC-2024-084	Solução de monitoramento de desempenho e integridade de dados em SGBDs	Solução de Monitoramento de Performance e Integridade de plataformas de Banco de Dados (ORACLE, MYSQL, MONGODB, POSTGRES SQL, SQL SERVER) com suporte técnico e manutenções.	0001741-11.2024.4.05.7000	Sim	DIDIA	3	3	3	27

NEC-2024-085	Solução para detecção e prevenção de ameaças e padrões de ataques	Solução de buscas e análises de dados na internet profunda (deep/dark web) para detecção e prevenção de ameaças e padrões de ataques, análise de OSINT (Open Source Intelligence) para análise de redes sociais e fontes abertas.	---	Sim	SUSTI	4	3	2	24
NEC-2024-086	Solução de microsserviços para inteligência artificial generativa	Solução tecnológica em caráter de plataforma baseada em microsserviços para inteligência artificial generativa que ofereça uma gama de recursos avançados projetados para aprimorar modelos de IA em um universo "open", com características de proteção a dados	---	Sim	DIDIA	3	3	3	27
NEC-2024-087	Implantação de controles do Gerenciamento de Segurança da Informação	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço técnico especializado de desenvolvimento e assessoria para implementação do Sistema de Gerenciamento de Segurança da Informação - SGSI, fundamentado nas normas da família NBR ISO/IEC 27000	---	Sim	SUSTI	4	3	3	36
NEC-2024-088	Solução apoiar saúde ocupacional do CJF	Solução de Saúde Ocupacional, Assistencial e Medicina do Trabalho	---	Sim	ASMED	4	3	2	24
NEC-2024-089	Serviço de suporte para plataforma moodle do CEJ	Contratação, por demanda, de serviço de suporte para plataforma moodle do CEJ	---	Sim	SCE	3	3	2	18
NEC-2024-090	Solução de Monitoramento e Auditoria de endpoints para detecção automatizada dos incidentes de segurança, fornecendo informações detalhadas sobre o incidente ou vulnerabilidade para ação de contenção e resposta, composto de serviços técnicos especializados de instalação, configuração, suporte técnico e consultoria	Monitoramento e auditoria de incidentes de segurança	---	Sim	SUSTI	4	3	3	36
NEC-2024-091	Solução de inteligência artificial com transformador pré-generativo multimodal (conversação e imagem) que utilize linguagem natural (NLP) e permita a importação de data set especializado	Emprego de inteligência artificial com uso de transformadores para processamento de texto	---	Sim	DIDIA	4	3	4	48

NEC-2024-092	Proteção de servidores de rede	Contratação de Solução de Segurança de TI para proteção de servidores de rede, estações de trabalho, serviço de e-mail e Office 365 contemplando instalação e configuração, suporte técnico e garantia do fabricante.	0001703-88.2023.4.90.8000	Sim	SUSTI	4	4	3	48
NEC-2024-093	Solução de backup de dados	Contratação de solução de backup de dados para os ambientes computacionais do Conselho da Justiça Federal - CJF e dos Tribunais Regionais Federais partícipes, contemplando a subscrição de licenciamento de software e o fornecimento de equipamento(s), serviços de instalação e configuração, transferência de conhecimento, serviço de suporte técnico especializado mensal e garantia para 60 (sessenta) meses	0000958-23.2023.4.90.8000	Sim	SUSTI	4	4	3	48
NEC-2024-094	Ampliação de solução de armazenamento de dados	Ampliação da solução de armazenamento principal NETAPP FAS9000 do Conselho da Justiça Federal - CJF e aquisição de solução de armazenamento de contingência do CJF e ambiente principal e de contingência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, do fabricante NETAPP, contemplando o fornecimento de equipamento(s), discos e gavetas, serviços de instalação e configuração, e garantia para 60 (sessenta) meses	0000959-12.2023.4.90.8000	Sim	SUSTI	4	4	3	48
NEC-2024-095	Garantia de conformidade trabalhista, previdenciária e orçamentária	eSocial - Sistema Simplificado de Escrituração Digital das Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais	0004514-14.2020.4.90.8000 0001558-26.2023.4.90.8000	Não	SGP	4	3	2	24
NEC-2024-096	Atendimento com excelência às funções institucionais da Justiça Federal	DOD 0033224 - Solução de processamento de precatórios (Sisprec) - Fase 2	0000814-45.2019.4.90.8000	Não	SPO	5	4	4	80
NEC-2024-097	Atendimento com excelência às funções institucionais da Justiça Federal	TSS 26 - Desenvolvimento de serviço para extração de dados do sistema de óbitos do INSS	0002465-29.2022.4.90.8000	Não	CEGDOC	4	3	3	36
NEC-2024-098	Garantia de conformidade nas atividades da Justiça Federal	TSS 31 - Atualização e manutenção do sistema de inspeção - SINSP.	0002933-65.2022.4.90.8000	Não	SCG	3	3	3	27

NEC-2024-099	Garantia de conformidade trabalhista, previdenciária e orçamentária	TSS 16 - Desenvolver o leiaute e a ferramenta de transmissão de dados da EFD-Reinf.	0000821-51.2022.4.90.8000	Não	SAD	3	3	3	27
NEC-2024-100	Atendimento com excelência às funções institucionais da Justiça Federal	TSS 28 - Nova solução de pesquisa à base de Jurisprudência.	0001035-81.2021.4.90.8000	Não	STU	5	4	4	80
NEC-2024-101	Atendimento com excelência às funções institucionais da Justiça Federal	TSS 33 - Emissão de certidões unificadas, conforme previsto no Capítulo II da Resolução CJF 680/2020.	0006016-27.2019.4.90.8000	Não	CEGDOC	5	5	4	100
NEC-2024-102	Garantia de conformidade trabalhista, previdenciária e orçamentária	e-CJF - Aplicativo com informações funcionais dos servidores de toda a justiça federal (identidade funcional de servidores e magistrados, visualização de contracheque, visualização de ponto, etc).	---	Não	SGP	3	3	4	36
NEC-2024-103	Atendimento com excelência às funções institucionais da Justiça Federal	TSS 38 - Manutenção evolutiva no sistema Enunciare	0003699-57.2022.4.90.8000	Não	SCE	4	4	4	64
NEC-2024-104	Adoção de novas tecnologias como fomento à transformação digital	TSS 9 - Integrações para possibilitar a implantação do SERH Nacional no CJF (registro do ponto eletrônico)	0001439-09.2023.4.90.8000	Não	STI	4	2	1	8
NEC-2024-105	Adoção de novas tecnologias como fomento à transformação digital	TSS 11 - Proporcionar aos usuários do Conselho da Justiça Federal um canal eficiente para registrar demandas de competência da SUMAG.	0001792-53.2023.4.90.8000	Não	SAD	3	3	2	18
NEC-2024-106	Atendimento com excelência às funções institucionais da Justiça Federal	TSS - Desenvolver o VOTAJUD nacional.	0000512-90.2023.4.90.8000	Não	SCE	5	2	1	10
NEC-2024-107	Garantia de conformidade nas atividades da Justiça Federal	TSS 22 - Relatórios após Padronização da Nomenclatura das rubricas no SISUR	0003360-98.2021.4.90.8000	Não	SGP	3	3	2	18

NEC-2024-108	Garantia de conformidade trabalhista, previdenciária e orçamentária	TSS 20 – Extração de dados previdenciários 2024 - base julho de 2023	0002496-42.2023.4.90.8000	Não	SGP	3	3	3	27
NEC-2024-109	Garantia de conformidade nas atividades da Justiça Federal	TSS 33/2022 – SISPREC (criação de novos campos)	0003378-34.2022.4.90.8000	Não	SPO	3	4	1	12
NEC-2024-110	Atendimento com excelência às funções institucionais da Justiça Federal	TSS 24/2023 – Coopera (Cadastro Servidores da 2ª Instância)	0003449-80.2023.4.90.8000	Não	CECINT	3	2	2	12
NEC-2024-111	Garantia de conformidade nas atividades da Justiça Federal	TSS 25/2023 – Sistema de Diária e Passagens	0003187-17.2023.4.90.8000	Não	SAD	3	3	4	36
NEC-2024-112	Garantia de conformidade nas atividades da Justiça Federal	TSS 26/2023 – CADIJUS (Recuperação de senha)	0001283-12.2021.4.90.8000	Não	SGO	3	2	1	6

Anexo 5 PLANO DE INICIATIVAS – PDTI 2024-2026

ID	INICIATIVAS	OBJETIVO ESTRATÉGICO CJF - PLANO ESTRATÉGICO 2021 A 2026	DESCRIÇÃO	INDICADOR	META 2024	META 2025	META 2026	RESPONSÁVEL	NECESSIDADE
INIC - 2024 -001	Aprimorar o fornecimento de serviços de TI para os usuários internos do CJF	Promover a gestão do conhecimento e da inovação para aperfeiçoamento da gestão judicial e administrativa do CJF	Serviço de atendimento e suporte N1 e N2 (Service Desk).	Andamento do projeto	100%			DIRAC	NEC-2024-019
INIC - 2024 -002	Promover a atualização tecnológica dos sistemas legados.	Promover a transformação digital para aprimoramento dos serviços prestados pelo CJF	Atender à demanda dos usuários por desenvolvimento de sistemas novos e atualização de sistemas legados para manter suas funcionalidades, sua disponibilidade, a integridade e a confidencialidade das informações, bem como a transparência e a proteção aos dados pessoais.	Andamento do projeto	100%			SUSOF	NEC-2024-037

INIC - 2024-003	Aprimorar política e procedimentos de segurança da informação.	Fortalecer a segurança da informação.	Serviços Gerenciados de Segurança da Informação (SOC) - Prorrogação.	Andamento do projeto	100%			SUSTI	NEC-2024-038
			Serviços Gerenciados de Segurança da Informação (SOC) - Nova contratação.	Andamento do projeto		100%			NEC-2024-039
			Contratação de Solução de Segurança de TI para proteção de servidores de rede, estações de trabalho, serviço de e-mail e Office 365 contemplando instalação e configuração, suporte técnico e garantia do fabricante.	Andamento do projeto	100%				NEC-2024-040
			Solução para Gerenciamento de Acesso Privilegiado (Privileged Access Management - PAM).	Andamento do projeto	100%				NEC-2024-041
			Contratação de solução de segurança da informação do Conselho da Justiça Federal - CJF para proteção da Nuvem Privada da Justiça Federal - NUJUFE (Solução de proteção para ambiente de Data Center virtual), contemplando fornecimento de equipamentos (appliances), licenciamento de software, serviços de instalação e configuração, suporte técnico e garantia para 36 (trinta e seis) meses.	Andamento do projeto		100%			NEC-2024-042
			Serviço de extensão de garantia do fabricante, serviços de atualização e suporte técnico, manutenção corretiva e preventiva das soluções de segurança de perímetro.	Andamento do projeto			100%		NEC-2024-043
			Contratação de plataforma de testes e treinamento corporativo em segurança da informação para magistrados, servidores, terceirizados e estagiários do CJF.	Andamento do projeto		100%			NEC-2024-044
			Contratação de monitoramento e auditoria de incidentes de segurança	Andamento do projeto		100%			NEC-2024-090
			Proteção de servidores de rede	Andamento do projeto	100%				NEC-2024-092
			Solução de backup de dados	Andamento do projeto	100%				NEC-2024-093
			Solução para detecção e prevenção de ameaças e padrões de ataques	Andamento do projeto		100%			NEC-2024-085
			Implantação de controles de gerenciamento de segurança da informação	Andamento do projeto		100%			NEC-2024-087
			Ampliação de solução de armazenamento de dados	Andamento do projeto	100%				NEC-2024-094

INIC - 2024 -004	Aperfeiçoar procedimentos de infraestrutura de TI	Promover a transformação digital para aprimoramento dos serviços prestados pelo CJF / Fortalecer a segurança da informação	Serviços de comunicação de dados (internet e MPLS), incluindo o fornecimento, a instalação e a configuração de equipamentos e enlaces de comunicação e gerenciamento proativo contra falhas, no modelo/tecnologia SDWAN.	Andamento do projeto		100%		SUTEC / DIDIA / SUSTI / DIRAC	NEC-2024-046
			Serviço de comunicação de dados entre o CJF e a gráfica.	Andamento do projeto	100%				NEC-2024-048
			Prestação de serviços de comunicação de dados para conexão da rede do CJF à Internet com saída pelo STJ.	Andamento do projeto	100%				NEC-2024-051
			Aquisição de novos servidores de rede.	Andamento do projeto		100%			NEC-2024-054
			Fornecimento de licenças de software de virtualização de estações de trabalho (Horizon 7 Enterprise - CCU).	Andamento do projeto	100%				NEC-2024-055
			Contratação de solução de virtualização do ambiente corporativo.	Andamento do projeto	100%				NEC-2024-056
			Expansão do sistema de climatização e confinamento da sala-cofre.	Andamento do projeto		100%			NEC-2024-057
			Aquisição de biblioteca de fitas padrão LTO compatível com a solução de proteção de dados em uso no Conselho da Justiça Federal.	Andamento do projeto		100%			NEC-2024-058
			Contratação de serviço técnico de sustentação do ambiente de Infraestrutura de TI do CJF.	Andamento do projeto		100%			NEC-2024-060
			Contratação da solução Red Hat Cloud Suite, Premium (2 Sockets, 32 Cores) Part Number: RV00085F3.	Andamento do projeto			100%		NEC-2024-061
			Contratação de solução de análise e gerenciamento de desempenho de banco de dados.	Andamento do projeto			100%		NEC-2024-062
			Contratação de empresa especializada na entrega, instalação e configuração de controlador de fornecimento de aplicação - ADC (Application Delivery Controller) com balanceamento de cargas e aplicações.	Andamento do projeto	100%				NEC-2024-063
			Contratação de subscrições da Microsoft, (software aplicativos, banco de dados e sistemas operacionais) destinados aos equipamentos servidores e estações de trabalho do Conselho da Justiça Federal (CJF).	Andamento do projeto			100%		NEC-2024-064
			Contratação de solução de auditoria de e-mail, servidor de arquivos e serviço de diretório.	Andamento do projeto	100%				NEC-2024-065
			Solução para identificar as falhas nos ambientes de aplicações nacionais monitorados, bem como coletar, armazenar e disponibilizar métricas de desempenho, além da emissão de relatórios para a descoberta da causa raiz de um problema no ambiente de aplicação, rede e banco de dados.	Andamento do projeto	100%				NEC-2024-081
			Adquirir novos appliances da solução de hiperconvergência com vistas à expansão da capacidade da Nuvem da Justiça Federal - NUJUFE.	Andamento do projeto		100%			NEC-2024-082
Contratação de subscrições do Sistema Gerenciados de Banco de Dados MySQL Enterprise.	Andamento do projeto	100%			NEC-2024-084				

INIC - 2024 -005	Estabelecer procedimento de segurança e autenticidade de dados	Fortalecer a segurança da informação / Promover a gestão do conhecimento e da inovação para aperfeiçoamento da gestão judicial e administrativa do CJF	Contratação da solução de distribuição de informações de cadastro com tecnologia Blockchain, como Serviço - BcaaS, para acesso a dados do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, intitulada b-CNPJ.	Andamento do projeto	100%			DIDIA / SUSTI / DIRAC	NEC-2024-002
			Contratação da solução distribuição de informações de cadastro com tecnologia Blockchain, como Serviço - BcaaS, para acesso a dados do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, intitulada b-CPF.	Andamento do projeto	100%				NEC-2024-003
			Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação, configuração, suporte, serviço técnico e treinamento de uma solução de criptografia e anonimização de bancos de dados, com suporte a múltiplas tecnologias (relacionais e não-relacionais).	Andamento do projeto	100%				NEC-2024-009
			Prestação de serviço de suporte - PSS para a Autoridade Certificadora da Justiça - AC-JUS, compreendendo as atividades de hospedagem, manutenção e operacionalização do ambiente seguro da AC e disponibilização de 1(um) ponto de publicação de Listas de Certificados Revogados.	Andamento do projeto		100%			NEC-2024-012
			Fornecimento de certificado digital para o SISPREC.	Andamento do projeto			100%		NEC-2024-013
			Fornecimento de certificados digitais A1	Andamento do projeto		100%			NEC-2024-014
			Fornecimento de certificados digitais A3	Andamento do projeto			100%		NEC-2024-015

INIC - 2024-006	Aprimorar o fornecimento de serviços de TI para os usuários da Justiça Federal	Promover a gestão do conhecimento e da inovação para aperfeiçoamento da gestão judicial e administrativa do CJF	eSocial - Sistema Simplificado de Escrituração Digital das Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais	Andamento do projeto	100%			SUSOF	NEC-2024-095
			DOD 0033224 - Solução de processamento de precatórios (Sisprec) - Fase 2	Andamento do projeto	100%			NEC-2024-096	
			TSS 26 - Desenvolvimento de serviço para extração de dados do sistema de óbitos do INSS	Andamento do projeto	100%			NEC-2024-097	
			TSS 31 - Atualização e manutenção do sistema de inspeção - SINSP.	Andamento do projeto	100%			NEC-2024-098	
			TSS 16 - Desenvolver o leiaute e a ferramenta de transmissão de dados da EFD-Reinf	Andamento do projeto	100%			NEC-2024-099	
			TSS 28 - Nova solução de pesquisa à base de Jurisprudência	Andamento do projeto	100%			NEC-2024-100	
			TSS 33 - Emissão de certidões unificadas, conforme previsto no Capítulo II da Resolução CJF 680/2020.	Andamento do projeto	100%			NEC-2024-101	
			TSS 38 - Manutenção evolutiva no sistema Enunciare	Andamento do projeto	100%			NEC-2024-103	
			TSS 9 - Integrações para possibilitar a implantação do SERH Nacional no CJF (registro do ponto eletrônico)	Andamento do projeto	100%			NEC-2024-104	
			TSS - Desenvolver o VOTAJUD nacional	Andamento do projeto	100%			NEC-2024-106	
			TSS 22 - Relatórios após Padronização da Nomenclatura das rubricas no SISUR	Andamento do projeto	100%			NEC-2024-107	
			TSS 20 - Extração de dados previdenciários	Andamento do projeto	100%			NEC-2024-108	
			TSS 33/2022 - SISPREC (criação de novos campos)	Andamento do projeto	100%			NEC-2024-109	
			TSS 24/2023 - Coopera (Cadastro Servidores da 2ª Instância)	Andamento do projeto	100%			NEC-2024-110	
			TSS 25/2023 - Sistema de Diária e Passagens	Andamento do projeto	100%			NEC-2024-111	
			TSS 26/2023 - CADIJUS (Recuperação de senha)	Andamento do projeto	100%			NEC-2024-112	
			e-CJF - Aplicativo com informações funcionais dos servidores de toda a justiça federal (identidade funcional de servidores e magistrados, visualização de contracheque, visualização de ponto, etc)	Andamento do projeto		100%		NEC-2024-102	
			Nova solução de jurisprudência com correlação de atos a partir de algoritmos de inteligência artificial.	Andamento do projeto		100%		NEC-2024-025	
			Novo sistema corporativo especializado para a gestão do ciclo de vida das contratações.	Andamento do projeto		100%		NEC-2024-020	
			Solução para apoiar saúde ocupacional do CJF	Andamento do projeto		100%		NEC-2024-088	
TSS 11 - Proporcionar aos usuários do Conselho da Justiça Federal um canal eficiente para registrar demandas de competência da SUMAG.	Andamento do projeto	100%			NEC-2024-105				

INIC - 2024-007	Implementar política de gestão de pessoas de TI.	Desenvolver, integrar e valorizar pessoas	Contratação de ação de educação, por meio de assinatura de treinamento.	Andamento do projeto		100%		STI	NEC-2024-027
			Contratação de plataforma de acesso a livros e artigos online contendo acervo técnico de Tecnologia da Informação.	Andamento do projeto	100%				NEC-2024-028
			Criação de cargos e contratação de servidores por meio da realização de concurso público para a área de Tecnologia da Informação.	Andamento do projeto	100%				NEC-2024-080
INIC - 2024-008	Implantar política de gestão de dados e inteligência artificial	Promover a gestão do conhecimento e da inovação para aperfeiçoamento da gestão judicial e administrativa do CJF	Contratação de serviços de suporte especializado ao produto "product support" e atualização de versão de software "software updates" dos produtos Oracle licenciados para o Conselho da Justiça Federal.	Andamento do projeto	100%			DIDIA / SGO / SEG	NEC-2024-004
			Aquisição de solução de inteligência artificial generativa e LLM (Large Language Models) para processamento de documentos, apresentando a capacidade de realizar sumarizações, dentre outras funcionalidades.	Andamento do projeto			100%		NEC-2024-005
			Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação, configuração, suporte, serviço técnico e treinamento na plataforma de gerenciamento de dados.	Andamento do projeto		100%			NEC-2024-006
			Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação, configuração, suporte, serviço técnico e treinamento em plataforma de busca textual.	Andamento do projeto		100%			NEC-2024-007
			Contratação de serviços integrados em nuvem por demanda, para armazenamento, processamento e análise de dados em larga escala, com recursos computacionais escaláveis, segurança de dados e garantias de disponibilidade e continuidade do serviço.	Andamento do projeto	100%				NEC-2024-076
			Aquisição de solução de governança/auditoria de dados	Andamento do projeto	100%				NEC-2024-078
			Contratação de serviço de manutenção da solução de hiperconvergência	Andamento do projeto	100%				NEC-2024-079
			Solução de inteligência artificial com transformador pré-generativo multimodal	Andamento do projeto	100%				NEC-2024-091
INIC - 2024-009	Aperfeiçoar o gerenciamento e a entrega de serviços técnicos de TI	Promover a transformação digital para aprimoramento dos serviços prestados pelo CJF	Adquirir de solução de gerenciamento de serviços de TI (ITSM).	Andamento do projeto	100%			DIRAC	NEC-2024-022
INIC - 2024-010	Aprimorar a metodologia de desenvolvimento de Software.	Promover a transformação digital para aprimoramento dos serviços prestados pelo CJF	Subscrições do software PHPStorm para atender às necessidades do Grupo de Trabalho de desenvolvimento e implantação do Sistema Eletrônico de Recursos Humanos - SERH Nacional.	Andamento do projeto	100%			SUSOF	NEC-2024-035
			Subscrição de ferramenta de gerenciamento de ciclo de vida de software GitLab Ultimate para atendimento ao desenvolvimento e manutenção de software do CJF.	Andamento do projeto	100%				NEC-2024-036

INIC - 2024-011	Aprimorar o fornecimento de serviços de TI para os usuários internos e externos do CJF	Impulsionar a prestação jurisdicional de excelência para a sociedade	10 (dez) licenças da Plataforma Zoom Meetings - Pro - 3 Year Prepay (PAR1-PRO-BASE-NH3Y), conforme item 7 da precitada Ata de Registro de Preços; 1 (uma) licença da Plataforma Zoom Zoom Events 1.000 - 3 Year Prepay (PAR1-EVN-1000-FL3Y), conforme item 8 da precitada Ata de Registro de Preços.	Andamento do projeto		100%		DIRAC / SCG	NEC-2024-018
INIC - 2024-012	Aprimorar os processos de governança e gerenciamento de serviços de TI	Promover a melhoria da governança no CJF	Educação para adoção de boas práticas por todas as unidades da STI. Orientação para desenvolvimento de planos operacionais, mapeamento e melhoria de processos, definição de procedimentos operacionais para que o uso da TI atenda aos objetivos de negócio.	Andamento do projeto		100%		SUGOV / SUPES	NEC-2024-029
			Organizar e disponibilizar dados de alta qualidade para análise e otimização de riscos e de recursos financeiros envolvidos em contratações de TI.	Andamento do projeto		100%			NEC-2024-030
			Disponibilizar dados de alta qualidade para avaliação do uso de recursos de TI e propiciar eficácia e inovação no âmbito do CJF e da Justiça Federal.	Andamento do projeto		100%			NEC-2024-031
			Educação em boas práticas e garantia de adequação normativa.	Andamento do projeto		100%			NEC-2024-032
			Solução para gestão de contratos	Andamento do projeto		100%			NEC-2024-083
			Ferramenta de gerenciamento de projetos, portfólios em âmbito nacional.	Andamento do projeto	100%				NEC-2024-034
INIC - 2024-013	Atuar de forma conjunta para o desenvolvimento de inovação.	Promover a gestão do conhecimento e da inovação para aperfeiçoamento da gestão judicial e administrativa do CJF	Estabelecer um processo de fomento a inovação por parte da STI, atuando em conjunto com o Laboratório de Inovação do CJF (IpéLab) e a Rede Inovação em Governo (InovaGov)	Andamento do projeto		100%		DIDIA	NEC-2024-008
INIC - 2024-014	Atuar de forma conjunta para prover soluções de gestão patrimonial	Promover a transformação digital para aprimoramento dos serviços prestados pelo CJF	Serviços de suporte técnico (help desk) e manutenção continuada, com garantia de funcionamento e atualização de versão para os módulos de Patrimônio Mobiliário e Almoxarifado - Sistema ASIWEB	Andamento do projeto	100%			SAD	NEC-2024-074
			Implantação de automação de inventário do software de gestão ASI, suportada pela tecnologia RFID, integrada com o sistema de gestão patrimonial.	Andamento do projeto	100%				NEC-2024-075
INIC - 2024-015	Atuar de forma conjunta para prover soluções para área de comunicação social	Promover a transformação digital para aprimoramento dos serviços prestados pelo CJF / Garantir direito à informação	Aquisição de subscrição Adobe Creative Cloud	Andamento do projeto			100%	ASCOM / CEJ	NEC-2024-001
			Serviço de suporte para plataforma moodle do CEJ	Andamento do projeto		100%			NEC-2024-089
			Contratação de serviços de mailling	Andamento do projeto			100%		NEC-2024-077

INIC - 2024-016	Atuar de forma conjunta para prover soluções para bibliotecas e editoração	Promover a transformação digital para aprimoramento dos serviços prestados pelo CJF	Licenças (como serviço) da solução Dicionário Houaiss Corporativo, com garantia de 36 (trinta e seis) meses, incluindo suporte técnico remoto.	Andamento do projeto	100%			SG/CEREVI - SCE/DIBIE	NEC-2024-023
			Rede Virtual de Bibliotecas (RVBI) do Senado Federal.	Andamento do projeto	100%				NEC-2024-067
			Serviço de suporte técnico ao Sistema Pergamum	Andamento do projeto	100%				NEC-2024-068
			Serviço de suporte técnico ao Sistema SEER	Andamento do projeto	100%				NEC-2024-069
			Prestação de Serviço de Suporte e Garantia de Solução a Sistema de Atos Normativos	Andamento do projeto	100%				NEC-2024-070
			Serviço de descoberta de conteúdo em escala (Web Scale Discovery Service) ENFAM	Andamento do projeto	100%				NEC-2024-071
INIC - 2024-017	Atuar de forma conjunta para prover soluções para projetos e planejamento de obras	Promover a transformação digital para aprimoramento dos serviços prestados pelo CJF	Contratação de licenças do software AUTODESK AEC - Architecture, Engineering and Construction Collection	Andamento do projeto	100%			SGO	NEC-2024-024
			Software para engenharia, contemplando os módulos: Básico Orçamento, Bases Adicionais, Medição de obras, Diário de Obras.	Andamento do projeto	100%				NEC-2024-066
			Subscrição de licenças de plugin de renderização em tempo real compatível com AutoCAD e Revit.	Andamento do projeto	100%				NEC-2024-072
			Aquisição de licenças de softwares destinados ao desenvolvimento de projetos de estruturas em concreto armado, estruturas metálicas, projetos elétricos, hidrossanitários e de telecomunicações.	Andamento do projeto	100%				NEC-2024-073

INIC - 2024-018	Atuar para manutenção dos processos de infraestrutura de TI	Promover a transformação digital para aprimoramento dos serviços prestados pelo CJF	Serviço de suporte técnico dos servidores de rede em lâmina (tipo blade).	Andamento do projeto		100%		SUTEC / DIDIA	NEC-2024-045
			Prestação de serviços de assistência técnica para equipamentos pertencentes à solução do ambiente físico seguro e seus subsistemas, do tipo Sala-Cofre Modular.	Andamento do projeto			100%		NEC-2024-047
			Extensão de garantia do fabricante, serviços de atualização e suporte técnico de ativos de rede do CJF (Switches CORE, Acesso e Wifi).	Andamento do projeto	100%				NEC-2024-049
			Serviço de manutenção corretiva e preventiva do equipamento Storage Netapp FAS-9000.	Andamento do projeto	100%	100%	100%		NEC-2024-050
			Extensão de garantia do fabricante, serviços de atualização e suporte técnico de dois equipamentos appliance Dell DD6800	Andamento do projeto	100%	100%	100%		NEC-2024-052
			Extensão de garantia do fabricante, serviços de atualização e suporte técnico de equipamentos da NUJUFE (Servidores VXRail, IDPA e Switches).	Andamento do projeto	100%				NEC-2024-053
			Contratação de subscrição de serviço de suporte prioritário do sistema operacional SUSE Linux e da ferramenta de gerenciamento centralizado SUSE Manager, com atualização de versão.	Andamento do projeto	100%				NEC-2024-059
INIC - 2024-019	Promover atualização do parque computacional	Promover a transformação digital para aprimoramento dos serviços prestados pelo CJF	Aquisição de microcomputador desktop tipo II (300 equipamentos), workstation (08 equipamentos) e notebooks (30 equipamentos).	Andamento do projeto	30%	60%	100%	DIRAC	NEC-2024-010
			Aquisição de Microcomputador desktop tipo I (200 equipamentos).	Andamento do projeto			100%		NEC-2024-011
			Prestação de serviços de impressão distribuída (outsourcing de impressão).	Andamento do projeto			100%		NEC-2024-016
			Aquisição de monitores	Andamento do projeto	100%				NEC-2024-021
INIC - 2024-020	Promover inovação nos processos e produtos de TI.	Promover a gestão do conhecimento e da inovação para aperfeiçoamento da gestão judicial e administrativa do CJF	Contratação de serviço de consultoria e aconselhamento imparcial em TI.	Andamento do projeto	100%			STI / SUGOV	NEC-2024-026
			Contratação de serviços para atividades de apoio técnico à gestão de Tecnologia da Informação.	Andamento do projeto	100%				NEC-2024-033

Anexo 6 PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TI (NOVAS E CONTINUADAS) - PDTI 2024-2026

NOVAS CONTRATAÇÕES								
Item	Descrição	Iniciat. PDTI	Neces. PDTI	Unidade Demandante	Valor Estimado 2022 (R\$)	Período	Data Desejada para Compra / Contratação	Justificativa
CONTR-2024-01	Atender à demanda dos usuários por desenvolvimento de sistemas novos e atualização de sistemas legados para manter suas funcionalidades, sua disponibilidade, a integridade e a confidencialidade das informações, bem como a transparência e a proteção aos dados pessoais.	INIC - 2024 -002	NEC- 2024- 037	SUSOF	300.000	12	1/9/2024	Desenvolvimento de sistemas novos e manutenção de sistemas legados.
CONTR-2024-02	Serviços Gerenciados de Segurança da Informação (SOC). Nova contratação.	INIC - 2024 -003	NEC- 2024- 039	SUSTI	1.200.000	30	27/12/2024	Garantia da prestação dos serviços de segurança de TI.
CONTR-2024-03	Contratação de Solução de Segurança de TI para proteção de servidores de rede, estações de trabalho, serviço de e-mail e Office 365 contemplando instalação e configuração, suporte técnico e garantia do fabricante.	INIC - 2024 -003	NEC- 2024- 040	SUSTI	2.500.000	36	17/7/2025	Solução de segurança para proteção de servidores de rede, estações de trabalho, serviço de e-mail e Office 365
CONTR-2024-04	Solução para Gerenciamento de Acesso Privilegiado (Privileged Access Management - PAM).	INIC - 2024 -003	NEC- 2024- 041	SUSTI	500.000	36	19/7/2026	Solução de gerenciamento de acesso privilegiado para o CJF e Justiça Federal.
CONTR-2024-05	Contratação de subscrições do Sistema Gerenciados de Banco de Dados MySQL Enterprise	INIC - 2024 -004	NEC- 2024- 084	SUTEC	286.999,72	24	1/9/2024	Cada servidor de rede que roda o SGBD MySQL precisa ser licenciado. O ambiente computacional do CJF a ser licenciado é constituído por 4 servidores de processamento.
CONTR-2024-06	Contratação de solução de segurança da informação do Conselho da Justiça Federal - CJF para proteção da Nuvem Privada da Justiça Federal - NUJUFE (Solução de proteção para ambiente de Data Center virtual), contemplando fornecimento de equipamentos (appliances), licenciamento de software, serviços de instalação e configuração, suporte técnico e garantia para 36 (trinta e seis) meses.	INIC - 2024 -003	NEC- 2024- 042	SUSTI	36.000	36	16/7/2026	Solução de proteção para ambiente de Data Center virtual para a NUJUFE.
CONTR-2024-07	Contratação de plataforma de testes e treinamento corporativo em segurança da informação para magistrados, servidores, terceirizados e estagiários do CJF.	INIC - 2024 -003	NEC- 2024- 044	SUSTI	150.000	30	1/8/2025	Conscientização dos usuários sobre segurança da informação.

CONTR-2024-08	Serviços de comunicação de dados (internet e MPLS), incluindo o fornecimento, a instalação e a configuração de equipamentos e enlaces de comunicação e gerenciamento proativo contra falhas, no modelo/tecnologia SDWAN.	INIC - 2024 -004	NEC- 2024- 046	SUTEC/ DIDIA	3.200.000	36	25/7/2025	Prover comunicação de dados entre o Conselho da Justiça Federal e os TRFs
CONTR-2024-09	Serviço de comunicação de dados entre o CJF e a gráfica.	INIC - 2024 -004	NEC- 2024- 048	SUTEC/ DIDIA/ SUSTI/ DIRAC	50.000	36	1/9/2024	Comunicação de dados com unidade remota do Conselho da Justiça Federal
CONTR-2024-10	Aquisição de novos servidores de rede.	INIC - 2024 -004	NEC- 2024- 054	SUTEC/ DIDIA/ SUSTI/ DIRAC	3.000.000	12	1/9/2024	Atualização tecnológica do ambiente corporativo do CJF
CONTR-2024-11	Fornecimento de licenças de software de virtualização de estações de trabalho (Horizon 7 Enterprise - CCU).	INIC - 2024 -004	NEC- 2024- 055	SUTEC/ DIDIA/ SUSTI/ DIRAC	115.000	36	1/9/2024	Prover solução de acesso externo aos serviços e infraestrutura
CONTR-2024-12	Contratação de solução de virtualização do ambiente corporativo.	INIC - 2024 -004	NEC- 2024- 056	SUTEC/ DIDIA/ SUSTI/ DIRAC	500.000	36	1/9/2024	Subscrições do ambiente de virtualização de servidores e redes
CONTR-2024-13	Expansão do sistema de climatização e confinamento da sala-cofre.	INIC - 2024 -004	NEC- 2024- 057	SUTEC/ DIDIA/ SUSTI/ DIRAC	300.000	12	1/8/2025	Melhoria do ambiente de climatização da sala-cofre do CJF
CONTR-2024-14	Aquisição de biblioteca de fitas padrão LTO compatível com a solução de proteção de dados em uso no Conselho da Justiça Federal.	INIC - 2024 -004	NEC- 2024- 058	SUTEC/ DIDIA/ SUSTI/ DIRAC	200.000	60	1/9/2024	Implementar camada adicional da solução de proteção de dados por meio de biblioteca automatizada de fitas padrão LTO
CONTR-2024-15	Contratação da solução Red Hat Cloud Suite, Premium (2 Sockets, 32 Cores) Part Number: RV00085F3.	INIC - 2024 -004	NEC- 2024- 061	SUTEC/ DIDIA	1.100.000	36	1/9/2024	Subscrições do ambiente de containers do CJF
CONTR-2024-16	Contratação de solução de análise e gerenciamento de desempenho de banco de dados.	INIC - 2024 -004	NEC- 2024- 062	SUTEC/ DIDIA	2.000.000	36	1/8/2026	Acompanhar e monitorar o desempenho das aplicações críticas
CONTR-2024-17	Contratação de empresa especializada na entrega, instalação e configuração de controlador de fornecimento de aplicação - ADC (Application Delivery Controller) com balanceamento de cargas e aplicações.	INIC - 2024 -004	NEC- 2024- 063	SUTEC/ DIDIA	3.500.000	36	1/9/2024	Prover solução de otimização de desempenho e disponibilidade de aplicações web

CONTR-2024-18	Contratação de subscrições da Microsoft, (software aplicativos, banco de dados e sistemas operacionais) destinados aos equipamentos servidores e estações de trabalho do Conselho da Justiça Federal (CJF).	INIC - 2024-004	NEC-2024-064	SUTEC/DIDIA	1.000.000	36	1/8/2026	Aplicativos Microsoft para escritório e Data Center
CONTR-2024-19	Contratação de solução de auditoria de e-mail, servidor de arquivos e serviço de diretório.	INIC - 2024-004	NEC-2024-065	SUTEC/DIDIA/SUSTI/DIRAC	1.000.000	36	1/8/2025	Implementação de auditoria nos serviços de e-mail, autenticação e arquivos
CONTR-2024-20	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação, configuração, suporte, serviço técnico e treinamento de uma solução de criptografia e anonimização de bancos de dados, com suporte a múltiplas tecnologias (relacionais e não-relacionais).	INIC - 2024-005	NEC-2024-009	DIDIA / SUSTI / DIRAC	1.000.000	12	1/9/2024	Solução de criptografia e anonimização de banco de dados
CONTR-2024-21	Prestação de serviço de Suporte – PSS para a Autoridade Certificadora da Justiça – AC-JUS, compreendendo as atividades de hospedagem, manutenção e operacionalização do ambiente seguro da AC e disponibilização de 1(um) ponto de publicação de Listas de Certificados Revogados.	INIC - 2024-005	NEC-2024-012	DIDIA/SUSTI/DIRAC	400.000	12	30/8/2025	Hospedagem, manutenção e operacionalização da autoridade certificadora da Justiça Federal
CONTR-2024-22	Fornecimento de certificado digital para o SISPREC.	INIC - 2024-005	NEC-2024-013	DIDIA/SUSTI/DIRAC	400.000	12	23/5/2026	Certificação digital para o SISPREC
CONTR-2024-23	Contratação de ação de educação, por meio de assinatura de treinamento.	INIC - 2024-007	NEC-2024-027	STI	70.000	12	1/8/2026	Plataforma de cursos online para capacitação técnica em TI
CONTR-2024-24	Contratação de plataforma de acesso a livros e artigos online contendo acervo técnico de Tecnologia da Informação.	INIC - 2024-007	NEC-2024-028	STI	100.000	12	1/10/2025	Biblioteca digital de livros e/ou artigos técnicos
CONTR-2024-25	Aquisição de solução de inteligência artificial generativa e LLM (Large Language Models) para processamento de documentos, apresentando a capacidade de realizar sumarizações, dentre outras funcionalidades.	INIC - 2024-008	NEC-2024-005	DIDIA	1.000.000	24	26/5/2026	Solução de IA generativa
CONTR-2024-26	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação, configuração, suporte, serviço técnico e treinamento em plataforma de gerenciamento de dados.	INIC - 2024-008	NEC-2024-006	DIDIA	1.700.000	12	27/12/2025	Solução baseada em grafos para análise profunda de vínculos, com aplicação de algoritmos de Inteligência Artificial
CONTR-2024-27	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação, configuração, suporte, serviço técnico e treinamento em plataforma de busca textual.	INIC - 2024-008	NEC-2024-007	DIDIA	2.000.000	12	24/9/2025	Solução de busca baseada em texto livre, com suporte a análise de dados e aplicação de algoritmos de Inteligência Artificial.

CONTR-2024-28	Software (como serviço) de renderização de projetos arquitetônicos em tempo real.	INIC - 2024-008	NEC-2024-072	SGO	20.000	12	1/9/2024	boa qualidade da apresentação dos projetos arquitetônicos elaborados para a Justiça Federal de primeiro e segundo graus.
CONTR-2024-29	Contratação de serviços integrados em nuvem por demanda, para armazenamento, processamento e análise de dados em larga escala, com recursos computacionais escaláveis, segurança de dados e garantias de disponibilidade e continuidade do serviço.	INIC - 2024-008	NEC-2024-076	SEG	42.000	12	1/9/2024	Fortalecimento da segurança da informação por meio de solução de proteção para ambiente de Data Center virtual para a NUJUFE.
CONTR-2024-30	Aquisição de solução de governança/auditoria de dados.	INIC - 2024-008	NEC-2024-078	DIDIA	850.000	12	1/9/2025	Assegurar a transformação digital e a favorecer a qualidade da tomada de decisão.
CONTR-2024-31	Contratação de serviço de manutenção da solução de hiperconvergência	INIC - 2024-008	NEC-2024-079	DIDIA / SGO / SEG	100.000	12	1/8/2025	Eficiência e efetividade para atender as necessidades internas de software e comunicação.
CONTR-2024-32	Adquirir de solução de gerenciamento de serviços de TI (ITSM).	INIC - 2024-009	NEC-2024-022	DIRAC	1.200.000	12	1/9/2024	Implementação de nova central de serviços de TI, com suporte aos processos de gestão de TI.
CONTR-2024-33	10 (dez) licenças da Plataforma Zoom Meetings - Pro - 3 Year Prepay (PAR1-PRO-BASE-NH3Y), conforme item 7 da precitada Ata de Registro de Preços; 1 (uma) licença da Plataforma Zoom Zoom Events 1,000 - 3 Year Prepay (PAR1-EVN-1000-FL3Y), conforme item 8 da precitada Ata de Registro de Preços.	INIC - 2024-011	NEC-2024-018	DIRAC/ SCG	400.000	36	1/8/2025	Plataforma de reuniões e seminários online.
CONTR-2024-34	Estabelecer um processo de fomento a inovação por parte da STI, atuando em conjunto com o Laboratório de Inovação do CJF (IpêLab) e a Rede Inovação em Governo (InovaGov)	INIC - 2024-013	NEC-2024-008	DIDIA	500.000	12	1/8/2026	Processo de fomento a inovação tecnológica no CJF.
CONTR-2024-35	Serviços de suporte técnico (help desk) e manutenção continuada, com garantia de funcionamento e atualização de versão para os módulos de Patrimônio Mobiliário e Almoxarifado - Sistema ASIWEB.	INIC - 2024-014	NEC-2024-074	SAD	460.000	12	1/9/2024	Serviços de suporte técnico (help desk)
CONTR-2024-36	Implantação de automação de inventário do software de gestão ASI, suportada pela tecnologia RFID, integrada com o sistema de Gestão patrimonial.	INIC - 2024-014	NEC-2024-075	SAD	700.000	12	1/9/2024	Implantação de automação de inventário do software de gestão ASI
CONTR-2024-37	Contratação de serviços de mailing.	INIC - 2024-015	NEC-2024-077	ASCOM /CEJ	10.000	12	1/8/2025	Atendimento das necessidades dos clientes internos para consecução da função institucional da Justiça Federal.
CONTR-2024-38	Licenças (como serviço) da solução Dicionário Houaiss Corporativo, com garantia de 36 (trinta e seis) meses, incluindo suporte técnico remoto.	INIC - 2024-016	NEC-2024-023	SG/CEREVI - SCE/DIBIE	2.160	36	1/9/2024	Dicionário online para trabalhos de revisão textual do CEREVI

CONTR-2024-39	Software para engenharia, contemplando os módulos: Básico Orçamento, Bases Adicionais, Medição de obras, Diário de Obras.	INIC - 2024-018	NEC-2024-066	SGO	20.000	12	1/10/2024	Plataforma para consulta e planejamento orçamentário aplicado a Engenharia Civil
CONTR-2024-40	Subscrição de licenças de plug-in de renderização em tempo real compatível com AutoCAD e Revit.	INIC - 2024-018	NEC-2024-072	SGO	360.000	12	1/10/2024	Plugin de renderização 3D em tempo real para projetos de Arquitetura
CONTR-2024-41	Aquisição de licenças de softwares destinados ao desenvolvimento de projetos de estruturas em concreto armado, estruturas metálicas, projetos elétricos, hidrossanitários e de telecomunicações.	INIC - 2024-018	NEC-2024-073	SGO	20.000	12	01/7/2024	Softwares para dimensionamento de projetos de Engenharia
CONTR-2024-42	Serviço de suporte técnico dos servidores de rede em lâmina (tipo blade).	INIC - 2024-019	NEC-2024-045	SUTEC	93.000	12	25/7/2025	Manutenção técnica dos equipamentos servidores corporativos do CJF
CONTR-2024-43	Extensão de garantia do fabricante, serviços de atualização e suporte técnico de ativos de rede do CJF (Switches CORE, Acesso e Wifi).	INIC - 2024-019	NEC-2024-049	SUTEC	135.000	36	1/9/2024	Manutenção técnica dos elementos ativos de rede
CONTR-2024-44	Serviço de manutenção corretiva e preventiva do equipamento Storage Netapp FAS-9000.	INIC - 2024-019	NEC-2024-050	SUTEC	650.000	36	1/8/2025	Manutenção técnica da solução de armazenamento de dados corporativos
CONTR-2024-45	Extensão de garantia do fabricante, serviços de atualização e suporte técnico de dois equipamentos appliance Dell DD6800	INIC - 2024-019	NEC-2024-052	SUTEC		24	1/9/2024	Manutenção técnica da solução de proteção de dados corporativos
CONTR-2024-46	Extensão de garantia do fabricante, serviços de atualização e suporte técnico de equipamentos da NUJUFE (Servidores VXRail, IDPA e Switches).	INIC - 2024-019	NEC-2024-053	SUTEC / DIDIA	300.000	36	1/9/2024	Manutenção técnica dos equipamentos que compõe a NUJUFE
CONTR-2024-47	Contratação de subscrição de serviço de suporte prioritário do sistema operacional SUSE Linux e da ferramenta de gerenciamento centralizado SUSE Manager, com atualização de versão.	INIC - 2024-019	NEC-2024-059	SUTEC/ DIDIA	100.000	36	1/8/2024	Renovação da contratação de licenças e suporte do sistema operacional SUSE Linux e a ferramenta SUSE Manager
CONTR-2024-48	Aquisição de microcomputador desktop tipo II (300 equipamentos), workstation (08 equipamentos) e notebooks (30 equipamentos).	INIC - 2024-020	NEC-2024-010	DIRAC	755.000	12	29/12/2024	Renovação do parque de microinformática e criação de reserva técnica
CONTR-2024-49	Aquisição de Microcomputador desktop tipo I (200 equipamentos).	INIC - 2024-020	NEC-2024-011	DIRAC	2.000.000	12	23/8/2026	Renovação do parque de microinformática e criação de reserva técnica

CONTR-2024-50	Prestação de serviços de impressão distribuída (outsourcing de impressão).	INIC - 2024-020	NEC-2024-016	DIRAC	1.270.000	36	27/9/2026	Serviço de impressão corporativa distribuída
CONTR-2024-51	Aquisição de câmeras de videoconferência acompanhadas de microfones de expansão, com o intuito de atender às necessidades das sessões do Conselho da Justiça Federal	INIC - 2024-020	NEC-2024-017	DIRAC/SCG	400.000	12	10/5/2025	Aquisição e implantação de sistema de videoconferência para sala de reuniões da SCG
CONTR-2024-52	Aquisição de monitores	INIC - 2024-020	NEC-2024-021	DIRAC	600.000	12	1/10/2024	Renovação do parque de microinformática e criação de reserva técnica
CONTR-2024-53	Contratação de serviço de consultoria e aconselhamento imparcial em TI.	INIC - 2024-021	NEC-2024-026	SUGOV	150.000	12	1/8/2025	Serviço de consultoria e aconselhamento imparcial em TI
CONTR-2024-54	Contratação de serviços para atividades de apoio técnico à gestão de Tecnologia da Informação.	INIC - 2024-021	NEC-2024-033	SUGOV	720.000	12	1/12/2024	Apoio técnico para gestão em TI
CONTR-2024-55	Subscrições do software PHPStorm para atender às necessidades do Grupo de Trabalho de desenvolvimento e implantação do Sistema Eletrônico de Recursos Humanos - SERH Nacional.	INIC - 2024-010	NEC-2024-035	SUFOF	190.000	12	1/7/2024	Ambiente integrado para desenvolvimento de software
CONTR-2024-56	Serviço de suporte e garantia do Sistema de Atos Normativos	INIC - 2024-016	NEC-2024-070	SCE/DIBIE	200.000	12	1/9/2024	Prestação de Serviço de Suporte e Garantia de Solução a Sistema de Atos Normativos
CONTR-2024-57	Serviço de descoberta de conteúdo em escala (Web Scale Discovery Service) ENFAM	INIC - 2024-016	NEC-2024-071	SCE/DIBIE	127.000	12	1/12/2024	Disponibilização de serviço de descoberta de conteúdo em escala
CONTR-2024-58	Prestação de serviços de assistência técnica para equipamentos pertencentes à solução do ambiente físico seguro e seus subsistemas, do tipo Sala-Cofre Modular.	INIC - 2024-019	NEC-2024-047	SUTEC	100.000	12	9/11/2026	Manutenção técnica da sala-cofre e seus subsistemas
CONTR-2024-59	Aquisição de solução de Monitoramento e Auditoria de endpoints para detecção automatizada dos incidentes de segurança, fornecendo informações detalhadas sobre o incidente ou vulnerabilidade para ação de contenção e resposta, composto de serviços técnicos especializados de instalação, configuração, suporte técnico e consultoria.	INIC - 2024-003	NEC-2024-090	SUSTI	360.000	36	1/7/2026	Monitoramento e auditoria de incidentes de segurança
CONTR-2024-60	Solução de inteligência artificial com transformador pré-generativo multimodal (conversa e imagem) que utilize linguagem natural (NLP) e permita a importação de data set especializado	INIC - 2024-008	NEC-2024-091	DIDIA	150.000	36	1/7/2025	Emprego de inteligência artificial com uso de transformadores para processamento de texto

Anexo 7 PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PDTI 2024-2026

ID	UNIDADE	CURSO/TREINAMENTO	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026
PACTI-2024-001	SUPES e SUGOV	Programa master PMP com certificação		X	
PACTI-2024-002	SUPES e SUGOV	Certified ScrumMaster (CSM)		X	
PACTI-2024-003	SUPES e SUGOV	Prince2 Project Management		X	
PACTI-2024-004	SUPES	Master Project Manager (MPM)			X
PACTI-2024-005	SUPES	Certified Project Director (CPD)			X
PACTI-2024-006	SUPES e SUGOV	Certificação profissional de gerenciamento de programas (PgMP)			X
PACTI-2024-007	SUPES e SUGOV	Professional Scrum Master (PSM I)		X	
PACTI-2024-008	SUPES	Certificação Scrum Product Owner (CSPO)		X	
PACTI-2024-009	SUPES	Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)	X		
PACTI-2024-010	SUPES e SUGOV	Kanban Management Professional (KMP)			X
PACTI-2024-011	SUPES	SAFe Practioner (SP)		X	
PACTI-2024-012	SUPES	SAFe Agilist (SA)			X
PACTI-2024-013	SUTEC	VMworld Conference (conferência mundial de virtualização e segurança)	X	X	X
PACTI-2024-014	SUTEC	Conferência Gartner Infraestrutura de TI, Operações & Estratégias de Cloud		X	X
PACTI-2024-015	SUTEC	RSA Conference (conferência mundial sobre segurança e infraestrutura)	X	X	X
PACTI-2024-016	SUPES	PMO Summit Latin America		X	X

PACTI-2024-017	SUPES	Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança	X	X	X
PACTI-2024-018	SUPES	Agile Trends e Agile Trends Gov	X	X	X
PACTI-2024-019	DIDIA	ElasticSearch	X	X	
PACTI-2024-020	DIDIA	IBM Watson			X
PACTI-2024-021	DIDIA	Pós-Graduação FIAP/Alura - Data Analytics OU Machine Learning Engineering	X	X	X
PACTI-2024-022	SUGOV e DIRAC	ITIL 4		X	X
PACTI-2024-023	SUTEC	Conferência Gartner Infraestrutura de TI, Operações&Estratégias de Cloud		X	X
PACTI-2024-024	SUSTI	Capacitação Certified Information Security Manager - CISM		X	X
PACTI-2024-025	DIDIA	Fundamentos de Inteligência Artificial	X	X	
PACTI-2024-026	SUGOV e SUSTI	Gestão da Continuidade de Negócio baseado na Norma ISO 22301	X	X	X
PACTI-2024-027	DIDIA	Transformação Digital		X	
PACTI-2024-028	STI	LGPD na Prática		X	
PACTI-2024-029	SUSOF	Análise em Ponto de Função		X	
PACTI-2024-030	SUSTI	Capacitação CompTIA Security+		X	
PACTI-2024-031	SUSOF	Gerenciamento Ágil de Projetos de Software com Scrum		X	
PACTI-2024-032	SUGOV	Capacitação em Governança de TI (COBIT 2019)		X	X
PACTI-2024-033	SUGOV	Auditando o Processo de Contratações de TI		X	
PACTI-2024-034	SUSOF	Gerência de Configurações - Integração contínua, Git, Testes, Qualidade, Gerenciamento de mudanças -		X	

PACTI-2024-035	SUSOF	Arquitetura de aplicação em nuvem (container/kubernetes/serverles)		X	
PACTI-2024-036	SUSOF	Arquitetura de micro serviço com SpringBoot e Angular		X	
PACTI-2024-037	SUSTI	Gestão da Segurança da Informação - NBR 27001 E NBR27002		X	
PACTI-2024-038	SUSTI	NBR 27005 - Gestão de Riscos de TI			X
PACTI-2024-039	SUGOV e SUSTI	NBR 31000 - Gestão de Riscos Corporativos		X	
PACTI-2024-040	SUSOF	Acessibilidade Digital na Administração Pública (eMAG)		X	
PACTI-2024-041	SUSOF	Auditoria de Qualidade de Software			X
PACTI-2024-042	SUSTI	Ethical Hacking		X	
PACTI-2024-043	SUSTI	Certified Chief Information Security Officer - CCISO			X
PACTI-2024-044	SUSTI	Certified Information Systems Security Professional - CISSP			X
PACTI-2024-045	STI	Comunicação e Negociação - Argumentação		X	
PACTI-2024-046	DIDIA	Gerenciamento e Análise de Dados (Data Science)	X		
PACTI-2024-047	STI	International Conference on Information Technology & Systems		X	X
PACTI-2024-048	SUGOV	Técnicas de Elaboração e Acompanhamento do Plano Diretor de TI, com ênfase na prática		X	X
PACTI-2024-049	SUGOV	ISO/IEC 38507 - Governança de TI - Implicações do uso de inteligência artificial pelas organizações.		X	X
PACTI-2024-050	SUGOV	Resolução n. 468 e Resolução CNJ n. 480 acerca do planejamento de contratações.		X	X
PACTI-2024-051	SUGOV e DIDIA	ISO/IEC 42001 - Sistema de gestão de inteligência artificial.		X	X
PACTI-2024-052	SUGOV e DIDIA	Gartner Data & Analytics Summit		X	X

PACTI-2024-053	SUGOV	Lei 14.133/2021 - Planejamento	X	X	X
PACTI-2024-054	SUGOV	Lei 14.133/2021 - Seleção do fornecedor		X	X
PACTI-2024-055	STI	Lei 14.133/2021 - Fiscalização		X	X
PACTI-2024-056	SUGOV	Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos	X	X	X
PACTI-2024-057	DIDIA	Evento "Convergência 2024: Inovação pública. Conexão humana."	X		
PACTI-2024-058	DIDIA, SUSOF, SUPES e SUGOV	Evento "Congresso Brasileiro de Software: Teoria e Prática (CBSofT)"	X	X	X
PACTI-2024-059	SUGOV	Evento "HDI Experience Conference & Expo"	X	X	X
PACTI-2024-060	SUGOV	Evento "HDI ExpoTI"		X	X

Anexo 8 DEMANDA DE PESSOAL STI/CJF - PDTI 2024-2026

UNIDADE (NÍVEL SUBSECRETARIA E ASSESSORIA)	QUANTIDADE DE SERVIDORES ATUALMENTE	QUANTIDADE ADICIONAL DE SERVIDORES PARA O PERÍODO DE 2024-2026	TOTAL DA DEMANDA DE PESSOAL PARA A UNIDADE
STI	1	-	1
ASSTI	1	-	1
SUGOV	4	9	13
DIRAC	2	3	5
DIDIA	3	6	9
SUSTI	2	6	8
SUSOF	8	22	30
SUTEC	2	20	22
SUPES	3	18	21
	26		110

Anexo 9 NECESSIDADES NÃO EFETIVADAS 2021-2023

NECESSIDADES NÃO EFETIVADAS 2021-2023				
Ano	Item	Processo	Descrição	Motivo
2021 e 2022	2.9	0000022-43.2019.4.90.8000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de assistência técnica para equipamentos pertencentes à solução do ambiente físico seguro e seus subsistemas, do tipo Sala-Cofre Modular, do CJF	Estudos técnicos preliminares não concluídos
2021, 2022 e 2023	2.32	0000077-17.2019.4.90.8000 / 0006949-60.2019.4.90.8000	Aquisição de 3 conjuntos de vídeo wall	Estudos técnicos preliminares não concluídos
2021 e 2022	2.18	0000090-94.2019.4.90.8000	Prestação de serviço consulta ao Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), por intermédio do Sistema de Informações para Convenientes (InfoConv-WS).	Planejamento de nova contratação.
2022	2.12	0000217-10.2019.4.90.8000	Manutenção corretiva do equipamento storage NETAPP FAS-6290	Estudos técnicos preliminares não concluídos
2021	1.11	0000255-05.2021.4.90.8000	Adequação do ambiente de backup	Cancelada - não foi autorizada a expansão da atual solução de backup (id. 0248307)
2022	90	0000316-71.2022.4.90.8000	Serviço de moving do storage	Estudos técnicos preliminares não concluídos
2022	2.45	0000341-64.2021.4.90.8000	Aquisição de licenças (como serviço) da solução Dicionário Houaiss Corporativo	Planejamento de nova contratação.
2022	2.48	0000378-56.2021.4.90.8000	Subscrições da solução de videoconferência ZOOM meeting, para até 100 (cem) participantes	Estudos técnicos preliminares não concluídos
2021 e 2022	2.40	0000384-34.2019.4.90.8000	Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 16-Core Premium (36 meses). SKU MW0161758F3	Estudos técnicos preliminares não concluídos
2022	2.47	0000547-85.2021.4.90.8000	Software ZOOM Vídeo Webinar para até 1.000 participantes	Estudos técnicos preliminares não concluídos
2022	79	0000565-67.2021.4.90.8000	Contratação de serviço de atualização tecnológica de softwares	Cancelada - nova contratação de desenvolvimento id. 0386179
2021	1.33	0000858-26.2021.4.90.8000	Solução de descoberta de conteúdo	Cancelada - revogação do Pregão CJF n. 1/2023 (id.0436772)
2022	89	0001007-45.2022.4.90.8000	Contratação de serviço de manutenção do Storage	Projeto não iniciado.
2023	93	0001057-12.2022.4.90.8000	Tesouro Jurídico	Não concluída - dependente de outro projeto (id. 0359561)

2022		0001085-68.2022.4.90.8000	Plugin de renderização em tempo real Enscape, compatível com o software Autodesk Revit	Estudos técnicos preliminares não concluídos
2023	16	0001171-25.2022.4.90.8000	Sistema SEER	Estudos técnicos preliminares não concluídos
2023	2.10	0001291-59.2023.4.90.8000	CONTRATAÇÃO de serviços de atualização de versão e suporte técnico remoto por telefone ou e-mail para esclarecimento de dúvidas e para resolução de problemas com o funcionamento do software BR/Search (e camada de aplicação NetAnswer1) para 8 usuários simultâneos	Estudos técnicos preliminares não concluídos
2021 e 2022	2.8	0001532-92.2019.4.90.8000	PRESTAÇÃO de serviços de impressão distribuída (outsourcing de impressão) pelo prazo de 48 meses, para atender as necessidades do Conselho da Justiça Federal em Brasília - DF	Planejamento de nova contratação.
2023	75	0001634-87.2021.4.90.8000	Subscrições do software PHPStorm para atender às necessidades do Grupo de Trabalho de desenvolvimento e implantação do Sistema Eletrônico de Recursos Humanos - SERH Nacional (Ferramenta IDE)	Estudos técnicos preliminares não concluídos
2021 e 2022	2.33	0001733-07.2019.4.90.8000	Subscrição Suse Manager	Estudos técnicos preliminares não concluídos
2021	2.34	0001733-07.2019.4.90.8000	Registro de preços de solução de segurança da informação para NUJUFE (Solução de Gerenciamento Unificado de Ameaças-UTM), contemplando fornecimento de equipamentos (appliances), licenciamento de software, serviços de instalação e configuração, suporte técnico e garantia para 36 (trinta e seis) meses conforme especificações e quantidades descritas no Termo de Referência (Módulo I do Edital)	Estudos técnicos preliminares não concluídos
2021 e 2022	2.26	0001734-80.2019.4.90.8000 / 0001500-13.2019.4.90.8000	Subscrição de SUSE LINUX	Estudos técnicos preliminares não concluídos
2021 e 2022	2.11	0001807-70.2019.4.90.8000	CONTRATAÇÃO do serviço técnico de operação de central de atendimento a usuários (service desk) no ambiente de Tecnologia da Informação (TI) do Conselho da Justiça Federal - CJF, englobando os serviços de atendimento e suporte de 1º (remoto) e 2º (presencial)	Planejamento de nova contratação.
2021 e 2023	2.3	0001989-89.2019.4.90.8000	Contratação de Serviços Gerenciados de Segurança da Informação	Estudos técnicos preliminares não concluídos
2021 e 2022	2.31	0002017- 36.2020.4.90.8000 / 0000925-61.2019.4.90.8000	Subscrição Adobe Creative Cloud	Estudos técnicos preliminares não concluídos
2023	92	0002082-34.2020.4.90.8000 (STI) e 0004191-03.2020.4.90.8000 (SAD)	Adequação do sistema de climatização da sala-cofre	Pendente - objeto em reavaliação (id. 0433819)
2021, 2022 e 2023	2.4	0002279- 11.2019.4.90.8000	Aquisição de Solução de Ativos de Rede - Suporte Técnico	Planejamento de nova contratação.

2021 e 2022	2.22	0002456-51.2019.4.90.8000	AQUISIÇÃO de solução de infraestrutura computacional hiperconvergente, com armazenamento distribuído definido por software e respectivo licenciamento de softwares de gerenciamento de nuvem privada, virtualização de servidores de rede e de segurança, com garantia de 60 (sessenta) meses com suporte on-site	Estudos técnicos preliminares não concluídos
2021	2.1	0002507-35.2019.4.90.8000	Contratação de extensão da garantia dos equipamentos servidores de rede em lâmina (blades), incluindo substituição de peças, serviço de suporte e atualização de firmware e de versão dos softwares de gerência.	Planejamento de nova contratação.
2023	2.43	0002509-40.2020.4.90.8000	fornecimento de licenças de software de virtualização de estações de trabalho (Horizon 7 Enterprise - CCU)	Estudos técnicos preliminares não concluídos
2023	78	0002787-22.2022.4.90.8000	Contratação de serviços especializados na área de Tecnologia da Informação - TI, com execução continuada de atividades de apoio técnico à gestão de TI, de forma a atender às demandas existentes no Conselho da Justiça Federal - CJF	Estudos técnicos preliminares não concluídos
2022 e 2023	2.23	0002893-56.2019.4.90.8000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de distribuição de informações de cadastro com tecnologia Blockchain, como Serviço - BcaaS, para acesso a dados do Cadastro Nacional de Pessoas Físicas, intitulada b-CPF.	Estudos técnicos preliminares não concluídos
2021 e 2022	2.10	0003125-10.2019.4.90.8000	CONTRATAÇÃO de serviços de atualização de versão e suporte técnico remoto por telefone ou e-mail para esclarecimento de dúvidas e para resolução de problemas com o funcionamento do software BR/Search (e camada de aplicação NetAnswer1) para 8 usuários simultâneos	Estudos técnicos preliminares não concluídos
2021 e 2022	2.17	0003126-09.2019.4.90.8000 / 0000406-84.2019.4.90.8000	SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO e fornecimento mensal incremental ao CJF de informações da Base de Dados da Receita Federal de Pessoas Físicas (CPF) e do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).	Planejamento de nova contratação.
2023	2.42	0003178-74.2020.4.90.8000	Fornecimento de certificados digitais A1	Estudos técnicos preliminares não concluídos
2023	67	0003461-59.2022.4.90.8000	Serviços de aconselhamento imparcial	Não concluída - SIJUS decidirá sobre retomada da contratação
2023	69	0003522-71.2020.4.90.8000	Contratação de um gerenciador de repositório de software (Gitlab Enterprise)	Planejamento de nova contratação
2021	1.26	0003602-90.2020.4.90.8000	Solução para disponibilizar os dados do DATAJUD	Cancelada - Mudança de escopo do projeto Aprimoramento da Gestão de Dados da Justiça Federal (id. 0315452)

2023	1.18	0004099-90.2020.4.90.8000	Serviço de suporte aos usuários com solução de gerenciamento de serviços de TI	Estudos técnicos preliminares não concluídos
2023	69	0004138-75.2022.4.90.8000	Contratação de serviço de desenvolvimento de sistemas de informação	Estudos técnicos preliminares não concluídos
2021, 2022 e 2023	2.29	0004374-87.2019.4.90.8000	Aquisição de microcomputador desktop tipo II (300 equipamentos), workstation (08 equipamentos) e notebooks (30 equipamentos)	Estudos técnicos preliminares não concluídos
2021 e 2023	2.29	0004374-87.2019.4.90.8000	Aquisição de microcomputador desktop tipo II (300 equipamentos), workstation (08 equipamentos) e notebooks (30 equipamentos)	Estudos técnicos preliminares não concluídos
2023	2.46	0004442-13.2020.4.90.8000	Prestação de serviços de impressão distribuída (outsourcing de impressão)	Estudos técnicos preliminares não concluídos
2023	2.2	0005871-10.2019.4.90.8000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO de Suporte – PSS para a Autoridade Certificadora da Justiça – AC-JUS, compreendendo as atividades de hospedagem, manutenção e operacionalização do ambiente seguro da AC e disponibilização de 1(um) ponto de publicação de Listas de Certificados Revogados	Estudos técnicos preliminares não concluídos
2021	2.30	CJF-ADM-2017/00318	Aquisição de notebook (15 equipamentos)	Estudos técnicos preliminares não concluídos
2021	2.27	CJF-ADM-2018/00032	Subscrição de SUSE LINUX	Estudos técnicos preliminares não concluídos
2021	2.25	CJF-ADM-2018/00194	Aquisição de equipamentos servidores em lâminia	Planejamento de nova contratação.
2022	2.25	CJF-ADM-2018/00194	Aquisição de equipamentos servidores em lâminia	Estudos técnicos preliminares não concluídos
2023	72		Serviços de atualização de versão e suporte técnico do software BRS/Search e camada de aplicação NetAnswer	Não concluída



JUSTIÇA FEDERAL

Conselho da Justiça Federal
